



MUNICIPALIDAD DE
GUASTATOYA

Expediente No. 289

☎ 5980-0535 📍 MUNICIPIALIDAD DE GUASTATOYA

📍 BARRIO EL CALVARIO, GUASTATOYA EL PROGRESO

REPORTE DE PAGO DE PROYECTOS POR CONTRATO 2024

NOG: 24626201 CONTRATO No. 35-2024

PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SECTOR CALLE 8, COLONIA
NUEVA VIDA, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO

APORTES	% DE AVANCE	ESTIMACION	AMORTIZACION	LIQUIDO A RECIBIR
Aporte MUNICIPAL	65.00%			
Q. 4,275,700.25		Q. 1,496,495.09	Q.299,299.02	Q. 1,197,196.07
32 00 001 000 013 331 21-0101-0001				
TOTALES		Q. 1,496,495.09	Q.299,299.02	Q. 1,197,196.07

Se cuenta con Informe de supervisión por parte de la empresa, informe de supervisión por el Supervisor de Obras Municipales, Punto del Concejo Municipal de aprobación de avance, Copia de bitácora.

Lic. Alexis Geovanny Marroquín Orellana
Director Municipal de Planificación

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
(Si viendo)



No. 19804549



CUENTA UNICA DEL TESORO
MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA C.U.T.
CUENTA No. 3-005-09207-3
GUATEMALA, C.A.

CHEQUE No. 78499

LUGAR Y FECHA:

GUASTATOYA, 27 de MARZO del 2025

Q. **1,197,196.07

PAGO A LA ORDEN DE:

JUÁREZ, CALDERÓN, GERZON, ALEONZO

SUMA DE:

UN MILLON CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS CON 07/100

QUETZALES.

GT86 BRRL 0101 0000 0030 0509 2073

FIRMA

NO NEGOCIABLE 31:0000000 16:300 509 20 73 000 784 99 00000065 233

DESCRIPCION DEL PAGO

PUR CONCEPTO: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 65% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLES CON PAVIMENTO SECTOR CALLE 5, COLONIA NUEVA VIDA, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO

78499

CUENTA No.	CONCEPTO	DEBE	HABER
	NUMERO DE CHEQUE: 78499		
	CON NUMERO DE EXPEDIENTE: 289		
	TRANSACCION No: 61109798		
	NIT BENEFICIARIO: 9304614		
	DELMÍ. ORELLANA 2732025		
	27 de MARZO del 2025		
HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	RECIBI CONFORME
			DIA MES AÑO

Factura

GERZON ALFONZO, JUÁREZ CALDERÓN
Nit Emisor: 9304614
CONSTRUCTORA LA UNION
KILOMETRO 72 5 RUTA AL ATLANTICO CASAS VIEJAS, Guastatoya,
EL PROGRESO
NIT Receptor: 6206107
Nombre Receptor: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1C888EA6-5CA6-418C-9369-018235295730
Serie: 1C888EA6 Número de DTE: 1554399628
Numero Acceso:
Fecha y hora de emision: 26-mar-2025 09:27:39
Fecha y hora de certificación: 26-mar-2025 09:27:39
Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripcion	Precio/Valor unitario (Q)	Descuentos (Q)	Otros Descuentos(Q)	Total (Q)	Impuestos	
1	Servicio	1	Pago 2nda. estimación del proyecto: MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SECTOR CALLE 8, COLONIA NUEVA VIDA, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, ELPROGRESO. según contrato Administrativo de Obras No.35-2024 de fecha 26 de diciembre 2024; valor Estimación Q 1,496,495.09; (-) Amortización del AnticipoQ 299,299.02; liquido a recibirQ1,197,196.07	1,496,495.09	0.00	0.00	1,496,495.09	IVA	160,338.7596 43
TOTALES:					0.00	0.00	1,496,495.09	IVA	160,338.7596 43

* Sujeto a pagos trimestrales ISR

Datos del certificador
Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949



"Contribuyendo por el país que todos queremos"

INFORME DE SUPERVISION

Guastatoya, 24 de Marzo de 2025

**SEÑOR: JOSE ELIAS HERRERA GUERRA Y CONSEJO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
EL PROGRESO**

De la manera más atenta me dirijo a usted deseándole toda clase de éxitos en sus labores diarias.

El motivo de la presente es para hacerle saber lo siguiente:

En visita de supervisión realizada al proyecto denominado **MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SECTOR CALLE 8, COLONIA NUEVA VIDA, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO**, con número de contrato **35-2024** de fecha 23 de Diciembre de 2024, ejecutado por la empresa **CONSTRUCTORA LA UNION**, financiado por la Municipalidad de Guastatoya, se tiene a la vista el oficio de Marzo de 2025 en el cual se hace la solicitud de la estimación del proyecto para un avance del **65.00%**, para lo cual se adjunta el informe de supervisión y el informe de parte de la empresa.

Agradeciendo su atención y en espera de darle seguimiento a este asunto me suscribo de ustedes.

Atentamente

José F. Alexander Aguilar Mejía
Ingeniero Civil
Colegiado No. 9,366

**ING. JOSE FULGENCIO ALEXANDER AGUILAR MEJIA
SUPERVISOR MUNICIPAL, GUASTATOYA
EL PROGRESO**

D.M.P.		SUPERVISION DE OBRAS		Dirección Municipal de Planificación			
Comunidad.		Contrato Municipal.					
Cabecera Municipal, Guastatoya, El Progreso		35-2024					
1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO							
Nombre del proyecto.		Ubicación del proyecto.					
MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SECTOR CALLE 8, COLONIA NUEVA VIDA, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO		Cabecera Municipal, Guastatoya, El Progreso					
Contratista.		Ubicación del proyecto.					
CONSTRUCTORA LA UNION		Cabecera Municipal, Guastatoya, El Progreso					
Monto Contratado.		Avance Físico.					
Q 4,275,700.25		65.00%					
Informe de Supervisión No. 2		Fecha. 24 de Marzo de 2025					
2. AVANCE DE EJECUCION DEL PROYECTO							
No.	Descripcion del Renglón	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total	Total a la Fecha	Avance Físico %
1	TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO		M	Q 10.00	Q -	Q 7,145.10	100%
2	LEVANTADO DE CARPETA EXISTENTE	1,795.69	M2	Q 16.35	Q 29,359.53	Q 64,092.00	78%
3	REACONDICIONAMIENTO DE SUB-RASANTE	1,775.00	M2	Q 78.20	Q 138,805.00	Q 303,025.00	77%
4	CAPA BASE (E=0.10 M.)	1,800.00	M2	Q 151.25	Q 272,250.00	Q 574,750.00	75%
5	PAVIMENTO DE CONCRETO E= 0.15 M	1,800.00	M2	Q 499.00	Q 898,200.00	Q 1,609,275.00	64%
6	CORTE Y SELLO DE JUNTAS	1,500.00	ML	Q 45.25	Q 67,875.00	Q 97,287.50	90%
7	BORDILLO PREFABRICADO	275.00	ML	Q 269.00	Q 73,975.00	Q 107,600.00	51%
8	SEÑALIZACION HORIZONTAL		ML	Q 71.00	Q -	Q -	0%
9	REPOSICION DE BROCALES	3.00	UNIDAD	Q 5,343.50	Q 16,030.50	Q 16,030.50	50%
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
					Q 1,496,495.03	Q 2,779,205.10	65.00%
Estos renglones de trabajo dan como resultado un avance físico del 65.00% por lo cual se aprueba realizar el pago correspondiente							
3. DESCRIPCION DEL PROYECTO.							
Este proyecto consiste en el mejoramiento la calle denominada calle 8, la cual actualmente es de adoquin, y se va a retirar para colocar pavimento de concreto, que va a mejorar la resistencia y durabilidad de la calle y el mejoramiento de circulacion de los vecinos del lugar							
4. RECOMENDACIONES.							
Chequear los trabajos realizados para garantizar la durabilidad de los mismos, y terminar los trabajos faltantes, los que no se encuentran al 100 % y los que no se han iniciado aun							
SUPERVISOR DE PROYECTOS MUNICIPALES.							
José F. Alexander Aguilar Mejía Ingeniero Civil Colegiado No. 9.366 ING. JOSE FULGENCIO ALEXANDER AGUILAR MEJIA SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES JOSE ELIAS HERRERA GUERRA ALCALDE MUNICIPAL DE GUASTATOYA							

D.M.P.

**SUPERVISION DE
OBRAS**

**Dirección Municipal de
Planificación**

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO


Nombre del proyecto.

MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SECTOR CALLE 8,
COLONIA NUEVA VIDA, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL
PROGRESO

Ubicación del proyecto.

Cabecera Municipal, Guastatoya, El Progreso

2. INFORME FOTOGRAFICO.

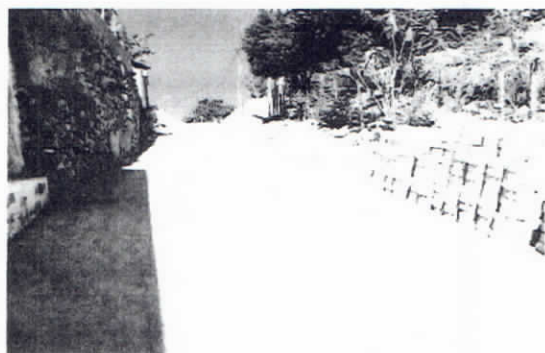

SUPERVISOR DE PROYECTOS MUNICIPALES.

José F. Alexander Aguilar Mejía
Ingeniero Civil
Colegiado No. 9,366

ING. JOSE FULGENCIO ALEXANDER AGUILAR MEJIA
SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES

ALCALDE



JOSE ELIAS HERRERA GUERRA
ALCALDE MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Reporte de Avance Físico No. 2

Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SECTOR CALLE 8, COLONIA NUEVA VIDA, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO

Municipio: GUASTATOYA

Comunidad: CABECERA MUNICIPAL

Fecha de Inicio: 05/02/2025

Fecha de Finalización: 04/08/2025

Contrato No.: 35-2024

Modificaciones:

Constructora: CONSTRUCTORA LA UNION

Representante legal: GERSON ALFONZO JUAREZ CALDERON

Departamento: EL PROGRESO

Fecha de Contrato: 23/12/2024

Fecha de Supervisión: 24/03/2025

Unidad Ejecutora: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

Valor del Proyecto: Q.4,275,700.25

Valor Original: Q.4,275,700.25

Telefono:

RESUMEN DE RENGLONES														
No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDADES DE TRABAJO				ORDEN DE CAMBIO	ORDEN DE TRABAJO SUPLEMENTARIO	ORDEN DE TRABAJO EXTRA	RENGLON MODIFICADO	CANTIDADES EJECUTADAS SEGUNDA ESTIMACION		ACUMULADO A LA FECHA		PORCENTAJE
		CANTIDAD	UNIDAD	P UNITARIO	TOTAL					CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	
1	TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO	714.51	M	Q 10.00	Q 7,145.10					Q -	714.51	Q 7,145.10	0.17%	
2	LEVANTADO DE CARPETA EXISTENTE	5,053.00	M2	Q 16.35	Q 82,616.55					Q 29,359.53	3,920.00	Q 64,092.00	1.50%	
3	REACONDICIONAMIENTO DE SUB-BASANTE	5,053.00	M2	Q 78.20	Q 395,144.60					Q 138,805.00	3,875.00	Q 303,025.00	7.09%	
4	CAPA BASE (E=0.10 M.)	5,053.00	M2	Q 151.25	Q 764,266.25					Q 272,250.00	3,800.00	Q 574,750.00	13.44%	
5	PAVIMENTO DE CONCRETO E= 0.15 M	5,053.00	M2	Q 499.00	Q 2,521,447.00					Q 898,200.00	3,225.00	Q 1,609,275.00	37.64%	
6	CORTE Y SELLO DE JUNTAS	2,399.00	ML	Q 45.25	Q 108,554.75					Q 67,875.00	2,150.00	Q 97,287.50	2.28%	
7	BORDILLO PREFABRICADO	789.00	ML	Q 269.00	Q 212,241.00					Q 73,975.00	400.00	Q 107,600.00	2.52%	
8	SEÑALIZACION HORIZONTAL	2,144.00	ML	Q 71.00	Q 152,224.00					Q -	-	-	0.00%	
9	REPOSICION DE BROCALES	6.00	UNIDAD	Q 5,343.50	Q 32,061.00					Q 16,030.50	3.00	Q 16,030.50	0.37%	
COSTO TOTAL DEL PROYECTO					Q 4,275,700.25					Q 1,496,495.03	Q 2,779,205.10	Q 2,779,205.10	65.00%	

VALOR DE ESTIMACION No. 2	Q 1,496,495.03
AMORTIZACION DEL ANTICIPO (20%)	Q 299,299.01
PENDIENTE DE AMORTIZAR	Q 299,299.03
LIQUIDO A RECIBIR	Q 1,197,196.03

Jose F. Alexander Aguilar Mejia

Ingeniero Civil

Colegiado No. 9,366

Jose Fulgencio Alexander Aguilar Mejia

Ingeniero Supervisor de Obras Municipales

Jose Elias Herrera Guerra

Alcalde Municipal Guastatoya



CONSTRUCTORA LA UNION

KM. 72.5, RUTA AL ATLANTICO ALDEA CASAS VIEJAS GUASTATOYA,
EL PROGRESO TEL 3091-9731

Guastatoya El Progreso, 20 de marzo de 2025

SEÑOR:
ALCALDE
JOSE ELIAS HERRERA GUERRA
MUNICIPALIDAD GUASTATOYA, EL PROGRESO.

Reciban un cordial saludo y éxitos en sus labores diarias.

El motivo de la presente es para solicitar se nombre a la comisión respectiva de la oficina de Planificación para evaluación física del Proyecto denominado **"MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SECTOR CALLE 8, COLONIA NUEVA VIDA, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO"**. Según contrato No. 35-2024 de fecha veintiséis de diciembre del dos mil veinticuatro. ubicado en el sector Calle 8, Colonia Nueva Vista, Barrio El Porvenir, Guastatoya El Progreso, el cual a la fecha lleva un avance físico del 65%, así mismo realizar los tramites correspondientes para el desembolso del 65%.

Se adjunta su respectiva estimación.

Sin otro particular, me despido de ustedes;

F.) 
GERZON ALFONZO JUAREZ CALDERON
CONSTRUCTORA LA UNION

CONSTRUCTORA LA UNION
KM. 72.5, RUTA AL ATLANTICO ALDEA CASAS
VIEJAS GUASTATOYA
EL PROGRESO TEL 3091-9731



CONSTRUCTORA LA UNION

KM. 72.5, RUTA AL ATLANTICO ALDEA CASAS VIEJAS GUASTATOYA,
EL PROGRESO TEL. 3091-9731

CONSTRUCTORA LA UNION
ESTIMACION DE TRABAJO NO.2

PROYECTO: "MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SECTOR CALLE 8, COLONIA NUEVA VIDA, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO"

Monto Original del Contrato: Q4,275,700.25

Renglón	RENGLONES DE TRABAJO/CANTIDADES	Unidad	cantidad Contratada	Precio	Costo total	Cantidad EJECUTADA CONTRATO ORIGINAL						%
						Actual	Anterior	Acumulado	Actual	Acumulado		
1	TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO	M	714.51	Q 10.00	Q 7,145.10		714.51	714.51	Q -	Q 7,145.10	0.17%	
2	LEVANTADO DE CARPETA EXISTENTE	M2	5,053.00	Q 16.35	Q 82,616.55	1,795.69	2,124.31	3,920.00	Q 29,359.59	Q 64,092.06	1.50%	
3	REACONDICIONAMIENTO DE SUB-RASANTE	M2	5,053.00	Q 78.20	Q 395,144.60	1,775.00	2,100.00	3,875.00	Q 138,805.00	Q 303,025.00	7.09%	
4	CAPA BASE (E=0.10 M.)	M2	5,053.00	Q 151.25	Q 764,266.25	1,800.00	2,000.00	3,800.00	Q 272,250.00	Q 574,750.00	13.44%	
5	PAVIMENTO DE CONCRETO E= 0.15 M	M2	5,053.00	Q 499.00	Q 2,521,447.00	1,800.00	1,425.00	3,225.00	Q 898,200.00	Q 1,609,275.00	37.64%	
6	CORTE Y SELLO DE JUNTAS	ML	2,399.00	Q 45.25	Q 108,554.75	1,500.00	650.00	2,150.00	Q 67,875.00	Q 97,287.50	2.28%	
7	BORDILLO PREFABRICADO	ML	789.00	Q 269.00	Q 212,241.00	275.00	125.00	400.00	Q 73,975.00	Q 107,600.00	2.52%	
8	SEÑALIZACION HORIZONTAL	ML	2,144.00	Q 71.00	Q 152,224.00			0.00	Q -	Q -	0.00%	
9	REPOSICION DE BROCALES	UNIDAD	6.00	Q 5,343.50	Q 32,061.00	3.00		3.00	Q 16,030.50	Q 16,030.50	0.37%	
	Total cantidad contratada				Q 4,275,700.25	Cantidad ejecutada			Q 1,496,495.09	Q 2,779,205.16	65.00%	

Monto bruto de esta Estimación 1	Q 1,282,710.08
Monto bruto de esta Estimación 2	Q 1,496,495.09
Amortización de Anticipos 20%	Q 299,299.02
Monto neto de esta Estimación	Q 1,197,196.07

Vo. Bo. Supervisor de obra de la Empresa
Arq. Allan Roberto Salvador Aguilar Herrera

Gerzon Alfonso Juárez Calderon
CONSTRUCTORA LA UNION

Liquidado a Recibir	Q 1,197,196.07
---------------------	----------------

CONSTRUCTORA LA UNION
KM. 72.5, RUTA AL ATLANTICO ALDEA CASAS VIEJAS GUASTATOYA
EL PROGRESO TEL. 3091-9731


Allan Roberto Salvador Aguilar Herrera
ARQUITECTO
COLEGIADO NO. 5525



CONSTRUCTORA LA UNION

KM. 72.5, RUTA AL ATLANTICO ALDEA CASAS VIEJAS GUASTATOYA,
EL PROGRESO TEL. 3091-9731

Proyecto denominado **"MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SECTOR CALLE 8,
COLONIA NUEVA VIDA, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO"**

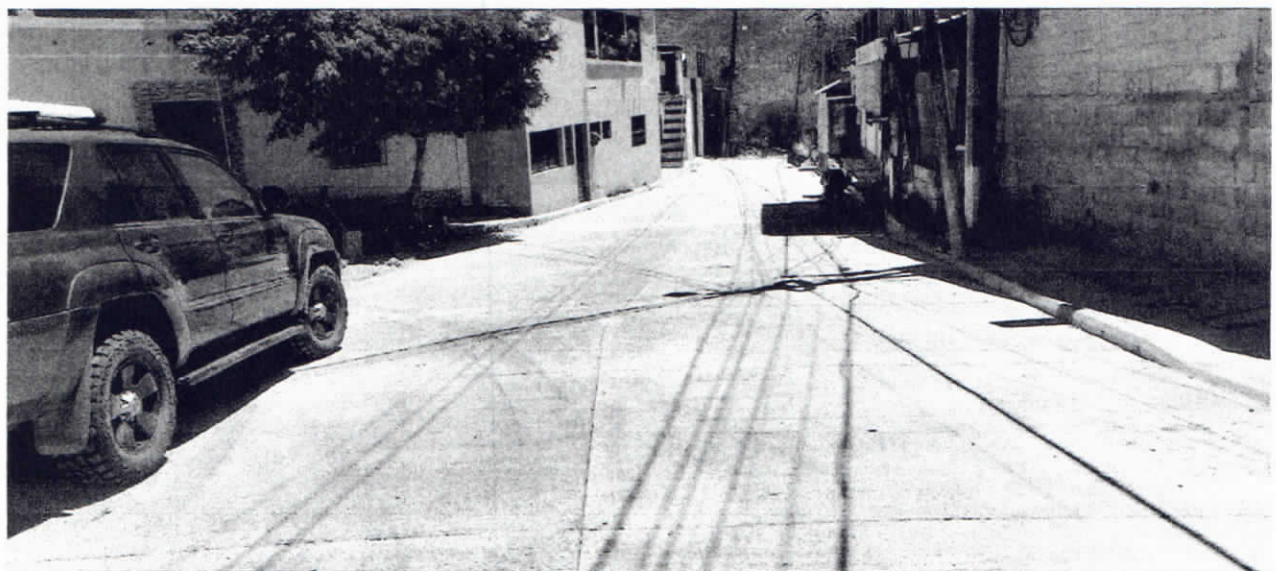


CONSTRUCTORA LA UNION
KM. 72.5, RUTA AL ATLANTICO ALDEA CASAS
VIEJAS GUASTATOYA
EL PROGRESO TEL. 3091-9731



CONSTRUCTORA LA UNION

KM. 72.5, RUTA AL ATLANTICO ALDEA CASAS VIEJAS GUASTATOYA,
EL PROGRESO TEL 3091-9731

Proyecto denominado **"MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SECTOR CALLE 8,
COLONIA NUEVA VIDA, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO"**



CONSTRUCTORA LA UNION
KM. 72.5, RUTA AL ATLANTICO ALDEA CASAS
VIEJAS GUASTATOYA
EL PROGRESO TEL 3091-9731






CONSTRUCTORA LA UNION

KM. 72.5, RUTA AL ATLANTICO ALDEA CASAS VIEJAS GUASTATOYA,
EL PROGRESO TEL 3091-9731

Proyecto denominado **"MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SECTOR CALLE 8,
COLONIA NUEVA VIDA, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO"**

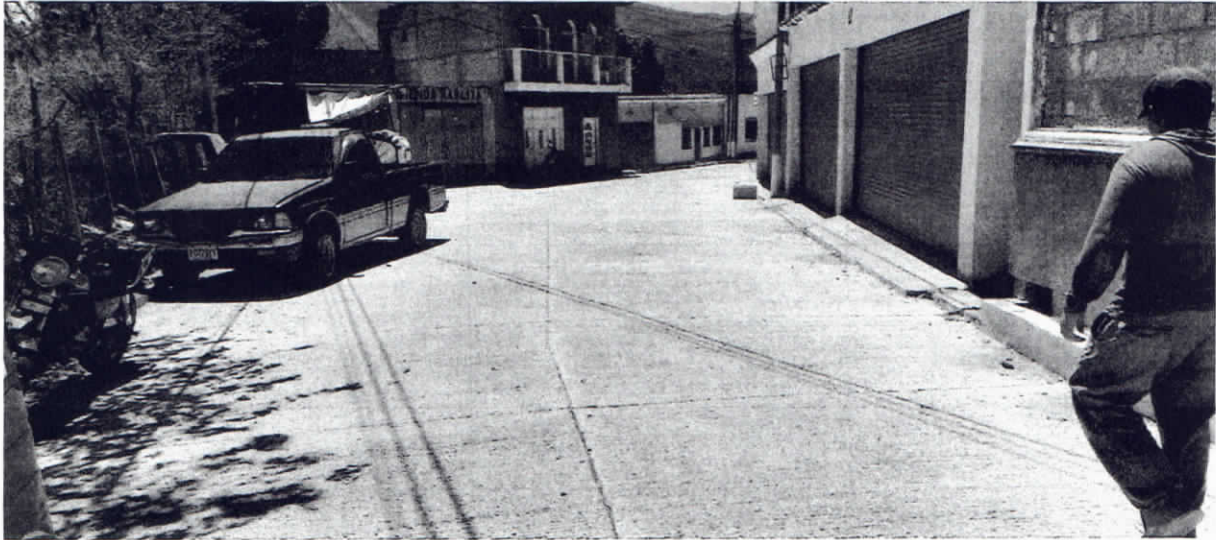



CONSTRUCTORA LA UNION
KM. 72.5, RUTA AL ATLANTICO ALDEA CASAS
VIEJAS GUASTATOYA
EL PROGRESO TEL 3091-9731



CONSTRUCTORA LA UNION

KM. 72.5, RUTA AL ATLANTICO ALDEA CASAS VIEJAS GUASTATOYA,
EL PROGRESO TEL 3091-9731

Proyecto denominado **"MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SECTOR CALLE 8,
COLONIA NUEVA VIDA, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO"**

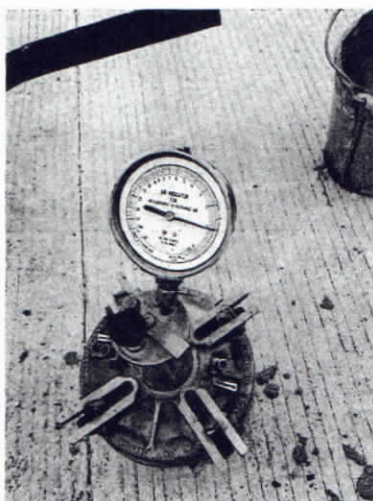

CONSTRUCTORA LA UNION
Km. 72.5, RUTA AL ATLANTICO ALDEA CASAS
VIEJAS GUASTATOYA
EL PROGRESO TEL 3091-9731



BITÁCORA ELECTRÓNICA No. 463/02/2025

CONTRATO No. 35-2024

NOMBRE: MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO
SECTOR CALLE 8, COLONIA NUEVA VIDA, BARRIO
EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA



REGISTRO No. 5

FECHA 25/03/2025

TIPO AVANCE

DESCRIPCIÓN Se observa el pavimento fundido y los bordillos prefabricados colocados,
se cuenta con personal y materiales suficientes para el avance del
proyecto

CREADO POR FULGENCIO ALEXÁNDER AGUILAR MEJÍA











LA INFRASCRITA SECRETARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO,

CERTIFICA:

Que para su cumplimiento y efectos consiguientes se transcribe la **AUTENTICIDAD** del punto **SEGUNDO** del acta **22-2025** de fecha veinticuatro de marzo de dos mil veinticinco del libro número 3,539 de sesiones ordinarias del Concejo Municipal, debidamente autorizado por la Contraloría General de Cuentas, el que copiado literalmente dice:

SEGUNDO: La Secretaria Municipal hace del conocimiento del Honorable Concejo Municipal, sobre el oficio Ref.agmo/DMP/122-2025 presentado por el Licenciado Alexis Geovanny Marroquín Orellana, Director Municipal de Planificación, en el cual informa: que el proyecto **MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SECTOR CALLE 8, COLONIA NUEVA VIDA, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO**, Contrato administrativo número **35-2024** de fecha 26 de diciembre de 2024, ejecutado por la empresa **CONSTRUCTORA LA UNION** siendo su propietario GERZON ALFONZO JUAREZ CALDERON, presentó informe del **65%** de avance físico. Por lo tanto solicito que se apruebe el pago del 65% de avance físico del proyecto antes mencionado... Consiguientemente presenta el informe de supervisión signado por el Ingeniero JOSE FULGENCIO ALEXANDER AGUILAR MEJIA, Supervisor de Obras Municipales, por medio del cual informa de la estimación, del avance físico del referido proyecto, indicando que se encuentra en un avance físico del 65.00%, anexa el detalle que contiene los renglones de trabajo para la presente estimación. **CONSIDERANDO:** Que la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, en el artículo 59 establece: "Estimaciones para pago. La entidad contratante podrá hacer pagos parciales al contratista contra estimaciones periódicas de trabajo ejecutado y aceptado, las que podrán efectuarse mensualmente de acuerdo con las estipulaciones pactadas." **CONSIDERANDO:** Que el Código Municipal y sus reformas, Decreto 12-2002 del Congreso de la República de Guatemala en el Artículo 35 literal a), establece: "son atribuciones del Concejo Municipal: a) La iniciativa, deliberación y decisión de los asuntos municipales...". **POR TANTO:** El Concejo Municipal, con fundamento en los considerandos y las facultades que le confiere el Código Municipal y sus reformas, Decreto 12-2002 del Congreso de la República de Guatemala, y por **UNANIMIDAD DE VOTOS, RESUELVE:** I) Se tiene por recibido el oficio presentado, agregándose al expediente respectivo. II) **APROBAR**, el pago equivalente al avance físico del 65%, a favor de la empresa mercantil **CONSTRUCTORA LA UNION**, propiedad del señor GERZON ALFONZO JUAREZ CALDERON, de conformidad con el monto de estimación de avance físico, anexa el detalle que contiene los renglones de trabajo para la presente estimación, presentados por el Supervisor de Obras Municipales del proyecto **MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SECTOR CALLE 8, COLONIA NUEVA VIDA, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO**, el que se ejecuta con el Contrato Administrativo de Obras 35-2024. III) Se le ordena al Director de Administración Financiera Integrada Municipal, hacer las operaciones contables correspondientes y proceder al pago de conformidad con lo aprobado en el numeral romano II) del presente punto resolutivo. IV) Notifíquese.

(Fs) Ilegibles José Elías Herrera Guerra, Alcalde Municipal, Ing. Byron Fernando Calderón Ferrera y Eduardo Ortega Loaiza, Síndicos Primero y Segundo respectivamente, Hernán Archila Morales, Erasmo Beltetón Contreras, Nery Rolando Archile Orellana, Julio Mauricio Marroquín González, Fryda Almée Estrada Ortiz, Concejales Primero, Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto, respectivamente y Licda. Evelyn Yaneth Oajaca Marroquín, Secretaria Municipal.

DADO EN EL PALACIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE GUASTATOYA, DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, A VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE MARZO DE DOS MIL VEINTICINCO.

SECRETARIA



LICDA. EVELYN YANETH OAJACA MARROQUÍN
SECRETARIA MUNICIPAL GUASTATOYA
¡Sirviendo!

