



MUNICIPALIDAD DE
GUASTATOYA

EXHIBENTE No. 264

5980-0535 MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
BARRIO EL CALVARIO, **GUASTATOYA EL PROGRESO**

REPORTE DE PAGO DE PROYECTOS POR CONTRATO 2024


NOG: 23216077 CONTRATO No. 12-2024

PROYECTO: AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR LA FEDERAL, BARRIO EL
PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO

APORTES	% DE AVANCE	ESTIMACION	AMORTIZACION	LIQUIDO A RECIBIR
Aporte CODEDE 2024 Y 2025	50.00% FINANCIERO 50.00% FISICO AÑO 2025			
Q. 10,398,500.00	Q.3,835,526.00	Q. 2,397,203.75	Q. 479,440.75	Q. 1,917,763.00
12 02 003 000 001 331 31-0101-0004				
Aporte MUNICIPALIDAD				
Q. 2,999,650.65	Q. 99.65	Q. 62.29	Q. 12.46	Q. 49.83
12 02 003 000 001 331 21-0101-0001				
Aporte COMUNIDAD				
Q. 300.00	Q. 100.00	Q. 62.50	Q. 12.50	Q. 50.00
12 02 003 000 001 331 31-0101-0002				
TOTALES		Q. 2,397,328.54	Q. 479,465.71	Q. 1,917,862.83

ENCARGADO DE
PRESUPUESTOS de cuenta con Informe de supervisión por parte de la empresa, informe de supervisión por el
Supervisor de Obras Municipales, Punto de Consejo Municipal de aprobación de avance, Copia
de bitácora.

Lic. Alexis Geovanny Marroquín Orellana
Director Municipal de Planificación



MUNICIPALIDAD DE
GUASTATOYA
Sirviendo!

19/03/2025, 12:05 PM



Modificar el listado de facturas de un concurso

Mensaje de confirmación

25.mar..2025 07:53:08

Datos del Concurso

Entidad	MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, EL PROGRESO
Unidad compradora	DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION
NOG	23216077
Descripción	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR LA FEDERAL, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO
Modalidad	Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Tipo	Público
Fecha límite para ofertar	15.jul..2024
Fecha publicación	04.jun..2024
Beneficiario Institucional	MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
Estatus actual	Adjudicado

Proveedor

1	{9303111} HERNÁNDEZ,GODOY,,FERNANDO,AUGUSTO
---	---

Listado de facturas incluidas:

#1	SERIE:1E1609B6 NO_FACTURA:1623149925 MONTO:2397328.54
----	---

Si desea imprimir este mensaje, oprima el siguiente botón

CONCURSO: Adición de anexos al concurso en la Fase de Ejecución

Mensaje de confirmación	
25.mar.,2025 07:50:58	
Documentos asociados:	
1	23216077@INFORME DE SUPERVISION 50 AVANCE FISTCO DRENAJE PLUVIAL LA FEDERAL 2025.pdf(2824 KB)
Si desea imprimir este mensaje, oprima el siguiente botón	
	

CUESTA No.		CONCEPTO	DEBE	HABER
		NUMERO DE CHEQUE: 78310		
		CON NUMERO DE EXPEDIENTE: 264		
		TRANSACCION No: 61000491		
		NIT BENEFICIARIO: 9303111		
		DELM. ORELLANA 1932025		
		19 de MARZO del 2025		
		CONSTRUFER		
		ALDEA CASAS VIEJAS, GUATATUYA, EL P. 0		
		BERNANDO AUGUSTO HERNANDEZ GODOY		
		PROPIETARIO		
HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	RECIBI CONFORME	DIA MES AÑO 19 03 25

19804360



CUENTA UNICA DEL TESORO
MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA C.U.T.
CUENTA No. 3-005-09207-3
GUATEMALA, C.A.

CHEQUE No. 78310

LUGAR Y FECHA:

GUASTATOYA, 19 de MARZO del 2025

PAGO A LA ORDEN DE:

HERNANDEZ GODOY, FERNANDO AUGUSTO

SUMA DE:

UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 45/100

QUETZALES.

No.

GT86 BRRL 0101 0000 0030 0509 2073

FIRMA

FIRMA

NO NEGOCIABLE

10000001163005092073000783100000057097

DESCRIPCION DEL PAGO
POR CONCEPTO: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 50% DE AVANCE FISICO Y 50% AVANCE FINANCIERO EJERCICIO FISCAL 2025 DEL PROYECTO AMELIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR LA FEDERAL, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO.

CUENTA No.	CONCEPTO	DEBE	HABER
	NUMERO DE CHEQUE: 78310		
	CON NUMERO DE EXPEDIENTE: 264		
	TRANSACCION No: 61000491		
	RIT BENEFICIARIO: 9303111		
	DELMÍ ORELLANA 1932025		
	19 de MARZO del 2025		
	CONSTRUFER		
	ALDEA CASAS VIEJAS, GUASTATOYA, EL PROGRESO		
	FERNANDO AUGUSTO GODOY		
	PROPIETARIO		
HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	RECIBI CONFORME
			DIA MES AÑO
			19 03 25

Factura

FERNANDO AUGUSTO, HERNÁNDEZ GODOY
Nit Emisor: 9303111
CONSTRUFER
KILOMETRO 73 RUTA AL ATLANTICO KILOMETRO 73 ALDEA CASAS
VIEJAS, Guastatoya, EL PROGRESO
NIT Receptor: 6206107
Nombre Receptor: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1E1609B6-60BF-4D65-9A4C-9D2B035CB7CA
Serie: 1E1609B6 Número de DTE: 1623149925
Numero Acceso:

Fecha y hora de emisión: 19-mar-2025 11:20:37
Fecha y hora de certificación: 19-mar-2025 11:20:37
Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripcion	Precio/Valor unitario (Q)	Descuentos (Q)	Otros Descuentos(Q)	Total (Q)	Impuestos	
1	Servicio	1	Pago del 50% de avance financiero y 50% de avance fisico año 2,025 del proyecto: AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR LA FEDERAL, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO. Según contrato administrativo No. 12-2024. Monto de estimación: Q.2,397,328.54 (-) Amortización: Q. 479,465.71 (=) Liquidado a recibir: Q.1,917,862.83	2,397,328.54	0.00	0.00	2,397,328.54	IVA	256,856.629286
TOTALES:					0.00	0.00	2,397,328.54	IVA	256,856.629286

* Sujeto a pagos trimestrales ISR

Datos del certificador
Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949



"Contribuyendo por el país que todos queremos"

RECIBO DE LA MUNICIPALIDAD
DE GUASTATOYA,
DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO



FORMA 7-B INGRESOS VARIOS

SERIE B No. 627602

DIA 13 MES 03 AÑO 2025

PORTADA: Un millón novecientos cincuenta y tres CODIGO JURISDICCIONAL: D-4 5201
NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE: Consejo Departamental de Desarrollo
DIRECCION: El Progreso

ARBITRIOS	ORNATO	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Q. _____
	VARIOS											
	LICENCIAS											
	ESTACIONAMIENTOS											
	CERTIFICACIONES											
TASAS	CEDULAS											
	MERCADOS											
	SERVICIOS VARIOS											
	SERVICIOS AGUA											
	SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA											
CONTRIBUCIONES	CONCEPTO											
MULTAS	CONCEPTO											
	VARIOS											
OTROS	CONCEPTO											

LECTURA DE CONTADOR ACTUAL ANTERIOR
OBSERVACIONES: AL CALDE 1,917,763.00
TOTAL Q. 1,917,763.00

FIRMA DEL RECEPTOR MUNICIPAL CUENTA
MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA SUB-CUENTA GUASTATOYA

VALIDO UNICAMENTE POR EL IMPORTE IMPRESO POR LA CAJA REGISTRADORA MUNICIPAL Y/O NOMBRE FIRMA Y SELLO DEL RECEPTOR MUNICIPAL

ORIGINAL-ENTERANTE



Aldea Casas Viejas, Guastatoya El Progreso, 05 de febrero del año 2025

Señor:
Alcalde
José Elías Herrera Guerra
Municipalidad de Guastatoya
Departamento de El Progreso
Presente.

Por este medio me dirijo a usted, deseándole muchos éxitos y bendiciones en tan distinguido cargo.

El motivo de la presente es para solicitar se nombre a la comisión respectiva de la oficina de planificación para evaluación física del Proyecto denominado: "AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR LA FEDERAL, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO", según contrato Administrativo Número (12-2024), de fecha 23 de julio del año 2024, ubicado en Sector La Federal, Barrio El Porvenir, Guastatoya, El Progreso.


Dicha obra tiene un **avance físico del 50.00%**, es por ello que se solicita realizar los trámites correspondientes para el desembolso del porcentaje antes mencionado.

Al oficio se adjuntan los siguientes documentos:

- ✓ Cuadro de estimación
- ✓ Registro fotográfico

Agradeciendo la atención prestada, y en espera de una respuesta positiva, me es grato el suscribirme.

Atentamente,

F. 
Fernando Augusto Hernández Godoy
Propietario
CONSTRUFER

CONSTRUFER
ALDEA CASAS VIEJAS, GUASTATOYA, EL PROGRESO
FERNANDO AUGUSTO HERNANDEZ GODOY
PROPIETARIO



CONSTRUFER
ESTIMACIÓN DE TRABAJO No. 1
PROYECTO: "AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR LA FEDERAL, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO"
MONTO DEL CONTRATO: Q. 13,398,460.65


RENGLOES DE TRABAJO/CANTIDADES															
No. RENGLO	DESCRIPCION	CANTIDAD CONTRATADA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANTIDADES EJECUTADAS (ACTUALES Y ACUMULADAS)					% EJECUTADO DEL RENGLO	% TOTAL EJECUTADO			
						ESTE PERIODO	PERIODO ANTERIOR	ACUMULADO	ESTE PERIODO	PERIODO ANTERIOR			ACUMULADO		
AÑO 2025															
1.0	ALCANTARILLADO SANITARIO														
1.1	Excavación para alcantarillado y acometidas domiciliare	235.00	m3	Q 540.60	Q 127,055.10	119.00	0.00	119.00	Q 84,338.54	Q	-	Q 84,338.54	50.64%	1.68%	
1.2	Suministro e instalación de tubería para alcantarillado (Ø= 15" ASTM F949)	139.00	m	Q 1,577.77	Q 219,310.03	86.00	0.00	86.00	Q 135,688.22	Q	-	Q 135,688.22	61.87%	3.54%	
1.3	Instalación de acometidas domiciliare	16.00	Unidad	Q 274.98	Q 4,399.68	8.00	0.00	8.00	Q 2,169.84	Q	-	Q 2,169.84	50.00%	0.06%	
1.4	Refrío de alcantarillado y acometidas domiciliare	195.00	m3	Q 359.00	Q 70,005.00	99.00	0.00	99.00	Q 35,541.00	Q	-	Q 35,541.00	50.77%	0.93%	
1.5	Pozos de visita de alcantarillado sanitario con profundidad entre 1.20 m y 1.37	1.00	Unidad	Q 7,362.75	Q 7,362.75	1.00	0.00	1.00	Q 7,362.75	Q	-	Q 7,362.75	100.00%	0.19%	
1.6	Pozos de visita de alcantarillado sanitario con profundídad entre 1.81 m y 1.97 m	2.00	Unidad	Q 15,897.35	Q 31,794.70	0.00	0.00	0.00	Q -	Q	-	Q -	0.00%	0.00%	
2.0	ALCANTARILLADO PLUVIAL														
2.1	Excavación para alcantarillado pluvial	280.00	m3	Q 485.09	Q 135,825.20	171.00	0.00	171.00	Q 82,950.39	Q	-	Q 82,950.39	61.07%	2.16%	
2.2	Suministro e instalación de tubería para alcantarillado pluvial (Ø=42")	327.00	m	Q 8,666.78	Q 2,190,037.06	226.00	0.00	226.00	Q 1,506,692.28	Q	-	Q 1,506,692.28	69.11%	39.28%	
2.3	Refrío compactado y reposición de 24 m2 de pavimento	162.00	m3	Q 507.87	Q 82,274.84	0.00	0.00	0.00	Q -	Q	-	Q -	0.00%	0.00%	
2.4	Pozos de visita de alcantarillado pluvial con profundídad 1.20 m	1.00	Unidad	Q 9,639.66	Q 9,639.66	1.00	0.00	1.00	Q 9,639.66	Q	-	Q 9,639.66	100.00%	0.25%	
2.5	Pozos de visita de alcantarillado pluvial con profundídad entre 2.04 m y 2.52 m	4.00	Unidad	Q 11,471.53	Q 45,886.12	0.00	0.00	0.00	Q -	Q	-	Q -	0.00%	0.00%	
2.6	Tringantes con rejilla metálica	5.00	Unidad	Q 10,303.80	Q 51,519.00	0.00	0.00	0.00	Q -	Q	-	Q -	0.00%	0.00%	
3.0	PAVIMENTO														
3.1	Retiro de carpeta de adoquín existente	895.00	m2	Q 84.95	Q 73,481.75	864.63	0.00	864.63	Q 73,450.14	Q	-	Q 73,450.14	99.96%	1.91%	
3.2	Corte de cuneta (t=0.25 m)	216.00	m3	Q 230.21	Q 49,725.36	0.00	0.00	0.00	Q -	Q	-	Q -	0.00%	0.00%	
3.3	Reacondicionamiento de subrasante	865.00	m2	Q 134.13	Q 116,022.45	0.00	0.00	0.00	Q -	Q	-	Q -	0.00%	0.00%	
3.4	Base de material granular (t=0.10 m)	86.00	m3	Q 503.87	Q 43,315.62	0.00	0.00	0.00	Q -	Q	-	Q -	0.00%	0.00%	
3.5	Pavimento de concreto hidráulico (t = 0.15 m)	859.00	m2	Q 635.53	Q 545,920.27	0.00	0.00	0.00	Q -	Q	-	Q -	0.00%	0.00%	
3.6	Bordillo de concreto prefabricado	54.00	m	Q 246.13	Q 13,281.02	0.00	0.00	0.00	Q -	Q	-	Q -	0.00%	0.00%	
3.7	Señalización horizontal y vertical	138.00	m	Q 209.13	Q 28,859.64	0.00	0.00	0.00	Q -	Q	-	Q -	0.00%	0.00%	
Total cantidad contratada AÑO 2025					Q 3,635,725.65	Cantidad ejecutada					Q 1,917,862.82	Q	1,917,862.82	TOTAL %	50.00%

JOEL AMADO ORELLANA
INGENIERO CIVIL
CON ENFASIS EN CONSTRUCCIONES RURALES
Colegiado 1835
SUPERVISOR DE LA EMPRESA

PROPIETARIO
FERNANDO AUGUSTO HERNÁNDEZ GODOY
CONSTRUFER
ALDEA CASAS VIEJAS, GUASTATOYA, EL PROGRESO
FERNANDO AUGUSTO HERNÁNDEZ GODOY

REGISTRO FOTOGRAFICO


PROYECTO: "AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR LA
FEDERAL, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO"
Contrato Administrativo No.12-2024

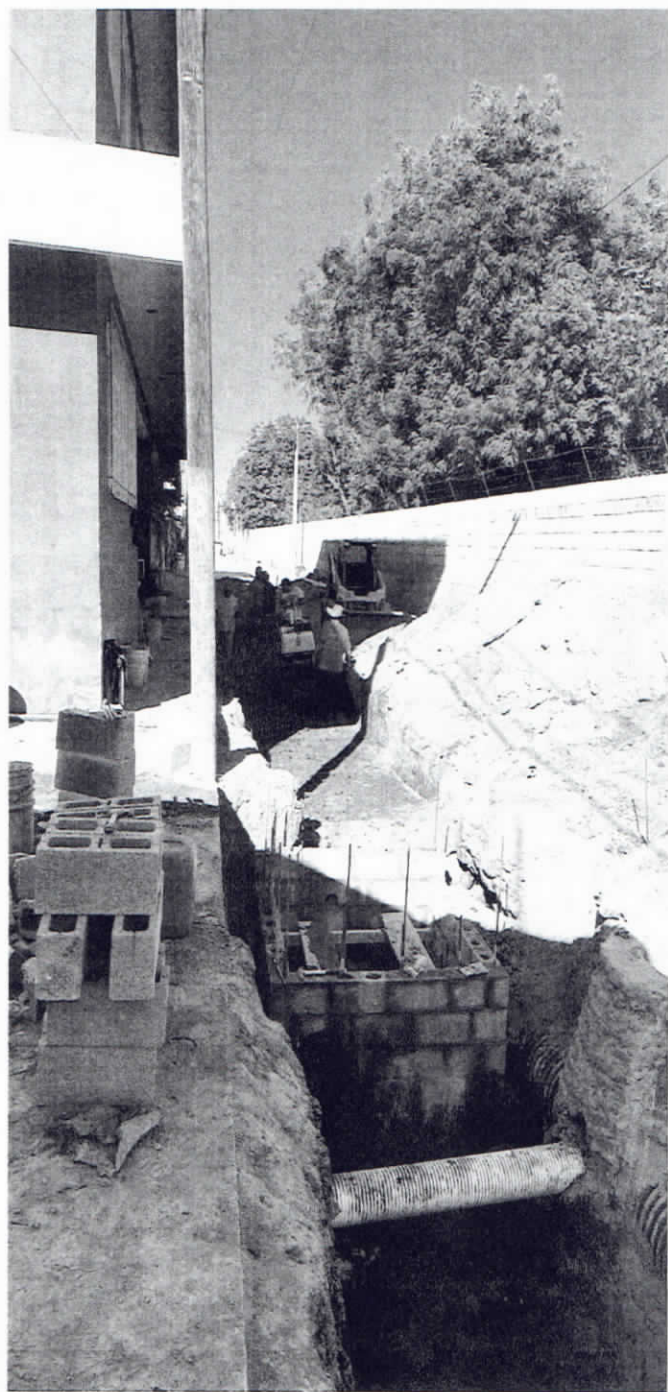


CONSTRUFER
ALDEA CASAS VIEJAS, GUASTATOYA, EL PROGRESO
FERNANDO AUGUSTO HERNÁNDEZ GODOY
PROPIETARIO

REGISTRO FOTOGRAFICO


PROYECTO: "AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR LA
FEDERAL, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO"
Contrato Administrativo No.12-2024

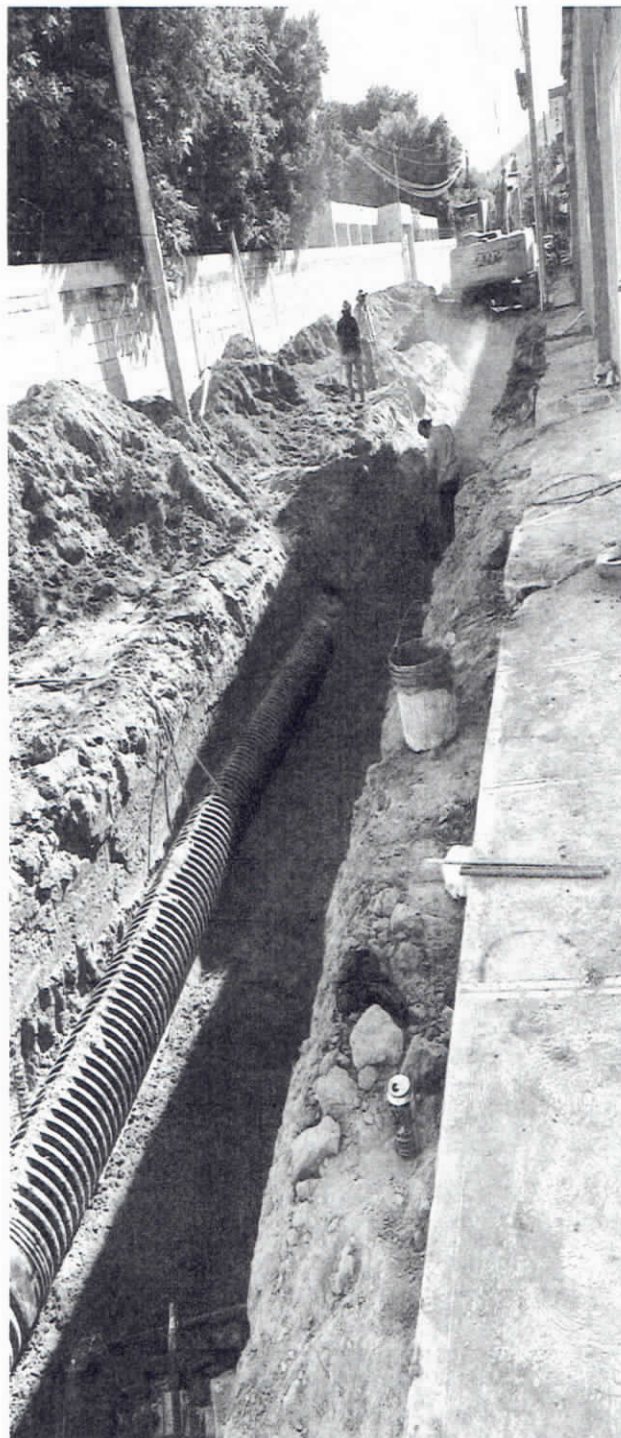


CONSTRUFER
ALDEA CASAS VIEJAS, GUASTATOYA, EL PROGRESO
FERNANDO AUGUSTO HERNÁNDEZ GODOY
PROPIETARIO

REGISTRO FOTOGRAFICO

PROYECTO: "AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR LA
FEDERAL, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO"
Contrato Administrativo No.12-2024

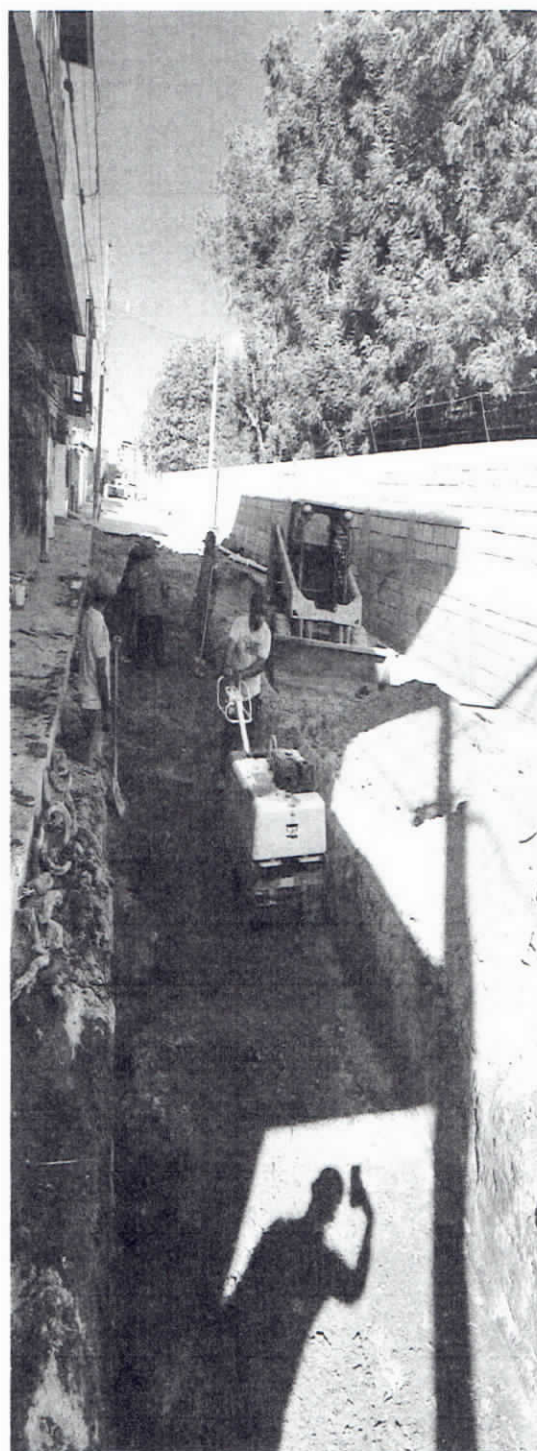



CONSTRUER
ALDEA CASAS VIEJAS, GUASTATOYA, EL PROGRESO
FERNANDO AUGUSTO HERNÁNDEZ G.O.D.
PROPIETARIO



REGISTRO FOTOGRAFICO

PROYECTO: "AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR LA
FEDERAL, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO"
Contrato Administrativo No.12-2024



F. 
Fernando Augusto Hernández Godoy
Propietario
CONSTRUFER

CONSTRUFER
ALDEA CASAS VIEJAS, GUASTATOYA, EL PROGRESO
FERNANDO AUGUSTO HERNANDEZ GODOY

BITÁCORA ELECTRÓNICA No. 1500/07/2024

CONTRATO No. 12-2024

NOMBRE: AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO
PLUVIAL SECTOR LA FEDERAL, BARRIO EL
PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA



REGISTRO No. 10

FECHA 11/02/2025

TIPO AVANCE

DESCRIPCIÓN El día de hoy se observa el pavimento fundido en un tramo y se continua con la preparacion de base y con la colocación de tubería pluvial, se cuenta con personal y materiales suficientes para el avance del proyecto

CREADO POR FULGENCIO ALEXÁNDER AGUILAR MEJÍA



INFORME DE SUPERVISION

Guastatoya, 11 de Febrero de 2025

**SEÑOR: JOSE ELIAS HERRERA GUERRA Y CONSEJO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
EL PROGRESO**

De la manera más atenta me dirijo a usted deseándole toda clase de éxitos en sus labores diarias.

El motivo de la presente es para hacerle saber lo siguiente:

En visita de supervisión realizada al proyecto denominado **AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR LA FEDERAL, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO**, con número de contrato **12-2024** de fecha 23 de Julio de 2024, ejecutado por la empresa **CONSTRUFER**, financiado por la Municipalidad de Guastatoya, se tiene a la vista el oficio de Febrero de 2025 en el cual se hace la solicitud de la estimación del proyecto para un avance del **50.00 %**, para lo cual se adjunta el informe de supervisión y el informe de parte de la empresa.

Agradeciendo su atención y en espera de darle seguimiento a este asunto me suscribo de ustedes.

Atentamente


José F. Alexander Aguilar Mejía
Ingeniero Civil
Colegiado No. 9,866





**ING. JOSE FULGENCIO ALEXANDER AGUILAR MEJIA
SUPERVISOR MUNICIPAL, GUASTATOYA
EL PROGRESO**

Contrato Municipal.

12-2024

Fecha.	11 de Febrero de 2025
--------	-----------------------



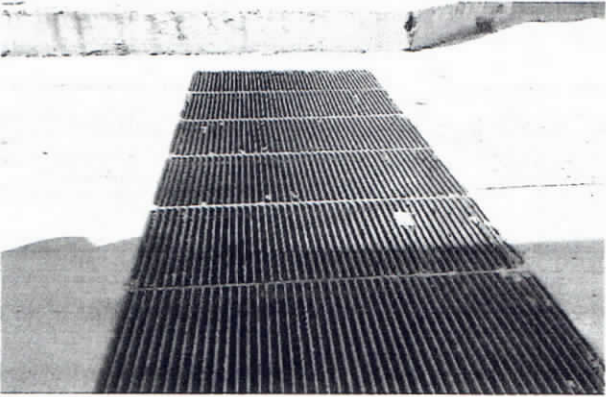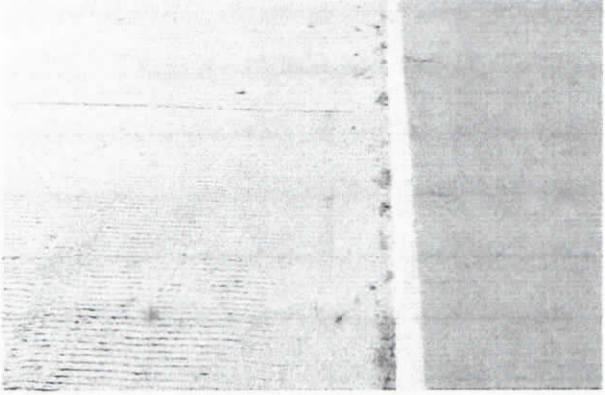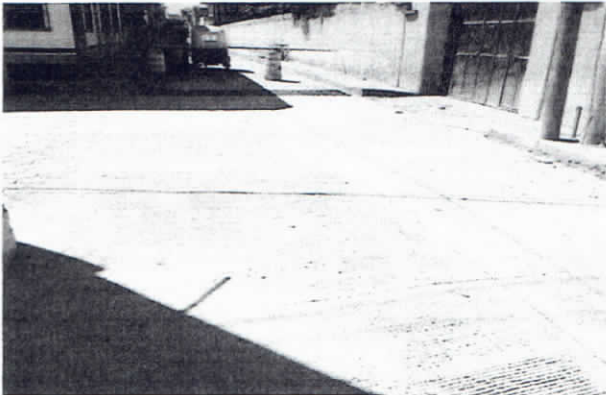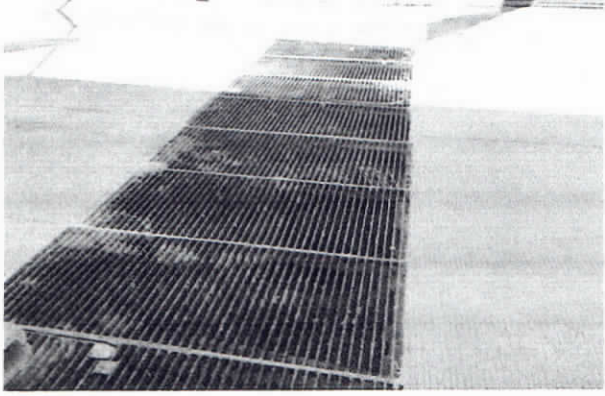D.M.P.	SUPERVISION DE OBRAS	Dirección Municipal de Planificación
1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO		
Nombre del proyecto. AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR LA FEDERAL, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Ubicación del proyecto. Cabecera Municipal, Guastatoya, El Progreso	
2. INFORME FOTOGRAFICO.		
		
SUPERVISOR DE PROYECTOS MUNICIPALES. <i>Jose F. Alexander Aguilar Mejia</i> Ingeniero Civil Colegiado No. 9,366 ING. JOSE FULGENCIO ALEXANDER AGUILAR MEJIA SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES ALCALDE  MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA Sirviendo. <i>Jose Elias Herrera Guerra</i> JOSE ELIAS HERRERA GUERRA ALCALDE MUNICIPAL DE GUASTATOYA		

REPORTE DE AVANCE FISICO No. 1

Nombre del Proyecto: AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR LA FEDERAL, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO

Municipio: GUASTATOYA

Comunidad: CABECERA MUNICIPAL

Fecha de Inicio: 31/07/2024

Fecha de Finalización: 30/06/2025

Contrato No.: 12-2024

Modificaciones:

Constructora: CONSTRUFER

Representante legal: FERNANDO AUGUSTO HERNANDEZ GODOY

Departamento: EL PROGRESO

Fecha de Contrato: 23/07/2024

Fecha de Supervisión: 11/02/2025

Unidad Ejecutora: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

Valor del Proyecto: Q.9,562,725.00


Valor Original: Q.9,562,725.00

Telefono:

RESUMEN DE RENGLONES

No.	DESCRIPCION	CANTIDADES DE TRABAJO			ORDEN DE CAMBIO	ORDEN DE TRABAJO SUPLEMENTARIO		ORDEN DE TRABAJO EXTRA	RENGLON MODIFICADO	CANTIDADES EJECUTADAS PRIMERA ESTIMACION		ACUMULADO A LA FECHA		PORCENTAJE
		CANTIDAD	UNIDAD	P UNITARIO	TOTAL	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	TOTAL
1	ALCANTARILLADO SANITARIO													
1.1	Excavación para alcantarillado y acometidas domiciliars	235.00	m³	Q	540.66	Q				119.00	Q	64,338.54	Q	1.68%
1.2	Suministro e instalación de tubería para alcantarillado (Ø=15" ASTM F949)	139.00	m	Q	1,577.77	Q				86.00	Q	135,688.22	Q	3.54%
1.3	Instalación de acometidas domiciliars	16.00	Unidad	Q	274.98	Q				8.00	Q	2,199.84	Q	0.06%
1.4	Rebello de alcantarillado y acometidas domiciliars	195.00	m³	Q	359.00	Q				99.00	Q	35,541.00	Q	0.93%
1.5	Pisos de visita de alcantarillado sanitario con profundidad entre 1.20 m y 1.37 m	1.00	Unidad	Q	7,362.75	Q				1.00	Q	7,362.75	Q	0.19%
1.6	Pisos de visita de alcantarillado sanitario con profundidad entre 1.81 m y 1.97 m	2.00	Unidad	Q	15,897.35	Q				-	Q	-	Q	0.00%
2	ALCANTARILLADO PLUVIAL													
2.1	Excavación para alcantarillado pluvial	280.00	m³	Q	485.09	Q				171.00	Q	82,950.19	Q	2.16%
2.2	Suministro e instalación de tubería para alcantarillado pluvial (Ø=42")	327.00	m	Q	6,666.78	Q				226.00	Q	1,506,692.28	Q	39.86%
2.3	Rebello compactado y reposición de 24 m² de pavimento	162.00	m³	Q	507.87	Q				-	Q	-	Q	0.00%
2.4	Pisos de visita de alcantarillado pluvial con profundidad 1.20 m	1.00	Unidad	Q	9,639.66	Q				1.00	Q	9,639.66	Q	0.25%
2.5	Pisos de visita de alcantarillado pluvial con profundidad entre 2.04 m y 2.52 m	4.00	Unidad	Q	11,471.53	Q				-	Q	-	Q	0.00%
2.6	Tragantes con rejilla metálica	5.00	Unidad	Q	10,303.80	Q				-	Q	-	Q	0.00%
3	PAVIMENTO													
3.1	Rebello de carpeta de adoquín existente	865.00	m²	Q	84.95	Q				864.63	Q	73,450.32	Q	1.91%
3.2	Corte de cajuela (t=0.25 m)	216.00	m³	Q	230.21	Q				-	Q	-	Q	0.00%
3.3	Rescondicionamiento de subrasante	865.00	m²	Q	134.13	Q				-	Q	-	Q	0.00%
3.4	Base de material granular (t=0.10 m)	86.00	m³	Q	503.67	Q				-	Q	-	Q	0.00%
3.5	Pavimento de concreto hidráulico (t = 0.15 m)	859.00	m²	Q	635.53	Q				-	Q	-	Q	0.00%
3.6	Bordillo de concreto prefabricado	54.00	m	Q	246.13	Q				-	Q	-	Q	0.00%
3.7	Señalización horizontal y vertical	138.00	m	Q	209.13	Q				-	Q	-	Q	0.00%
COSTO TOTAL DEL PROYECTO														Q 3,835,725.65
VALOR DE ESTIMACION No. 1														Q 1,917,863.00
AMORTIZACION DEL ANTICIPO (20%)														Q 383,572.60
PENDIENTE DE AMORTIZAR														Q 383,572.53
LIQUIDO A RECIBIR														Q 1,534,290.40

ALCALDE




MUNICIPALIDAD DE
GUASTATOYA
¡Sirviendo!


José F. Alexander Aguilar Mejía
Ingeniero Civil
Colegiado No. 81366


JOSÉ FULGENCIO ALEXANDER AGUILAR MEJÍA
INGENIERO SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES

JOSÉ ELIUS HERRERA GUERRA
ALCALDE MUNICIPAL GUASTATOYA

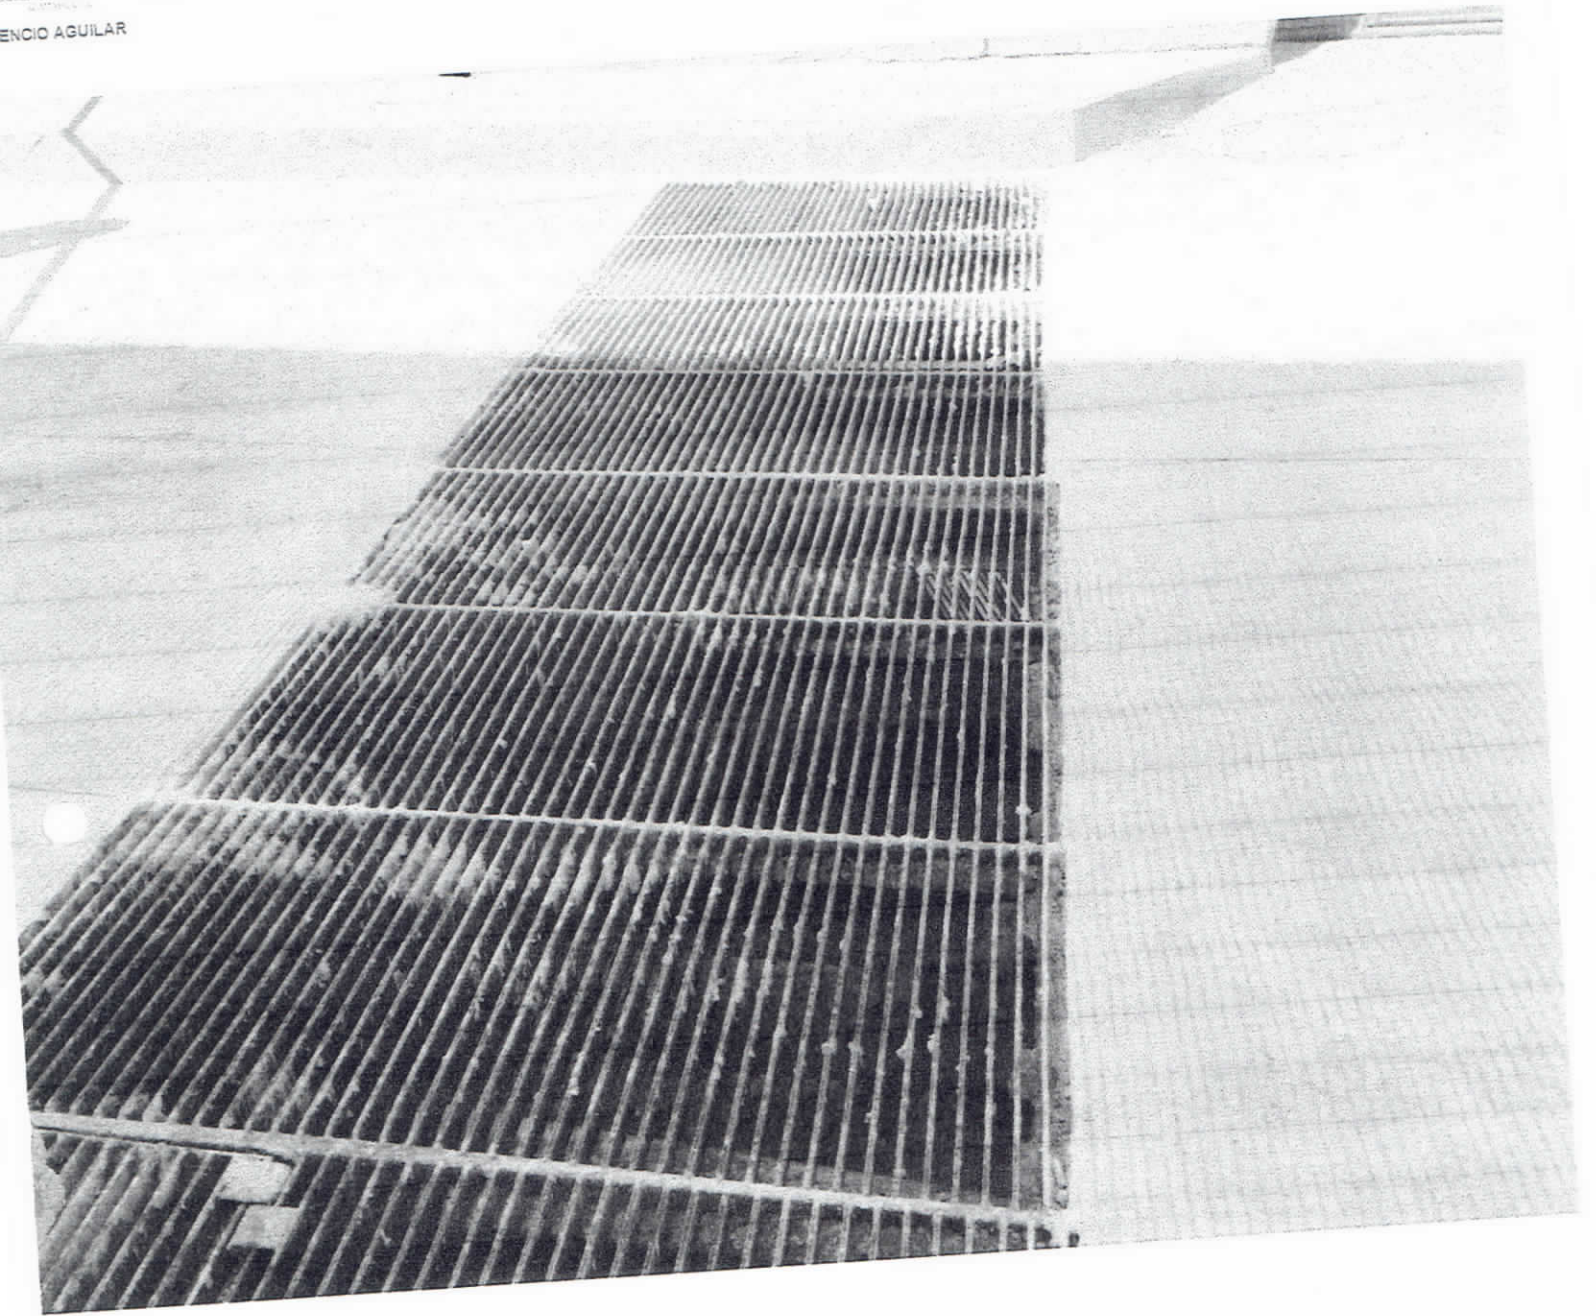



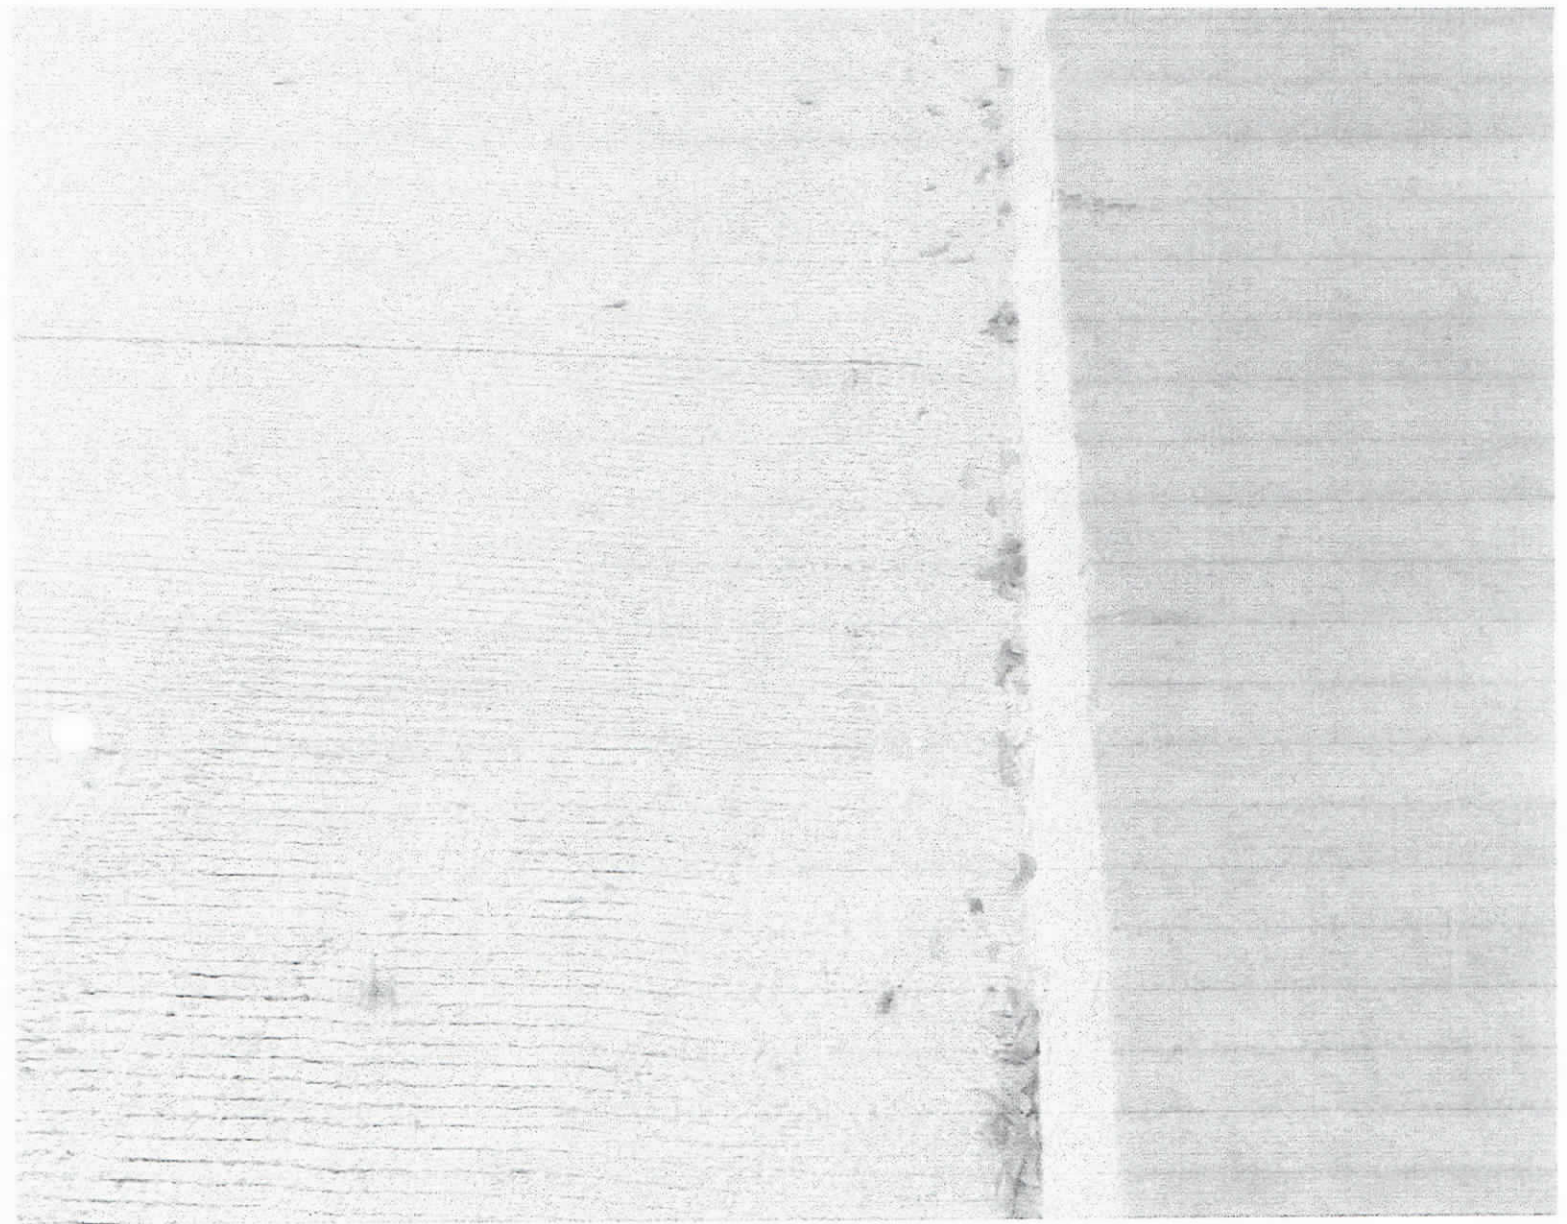

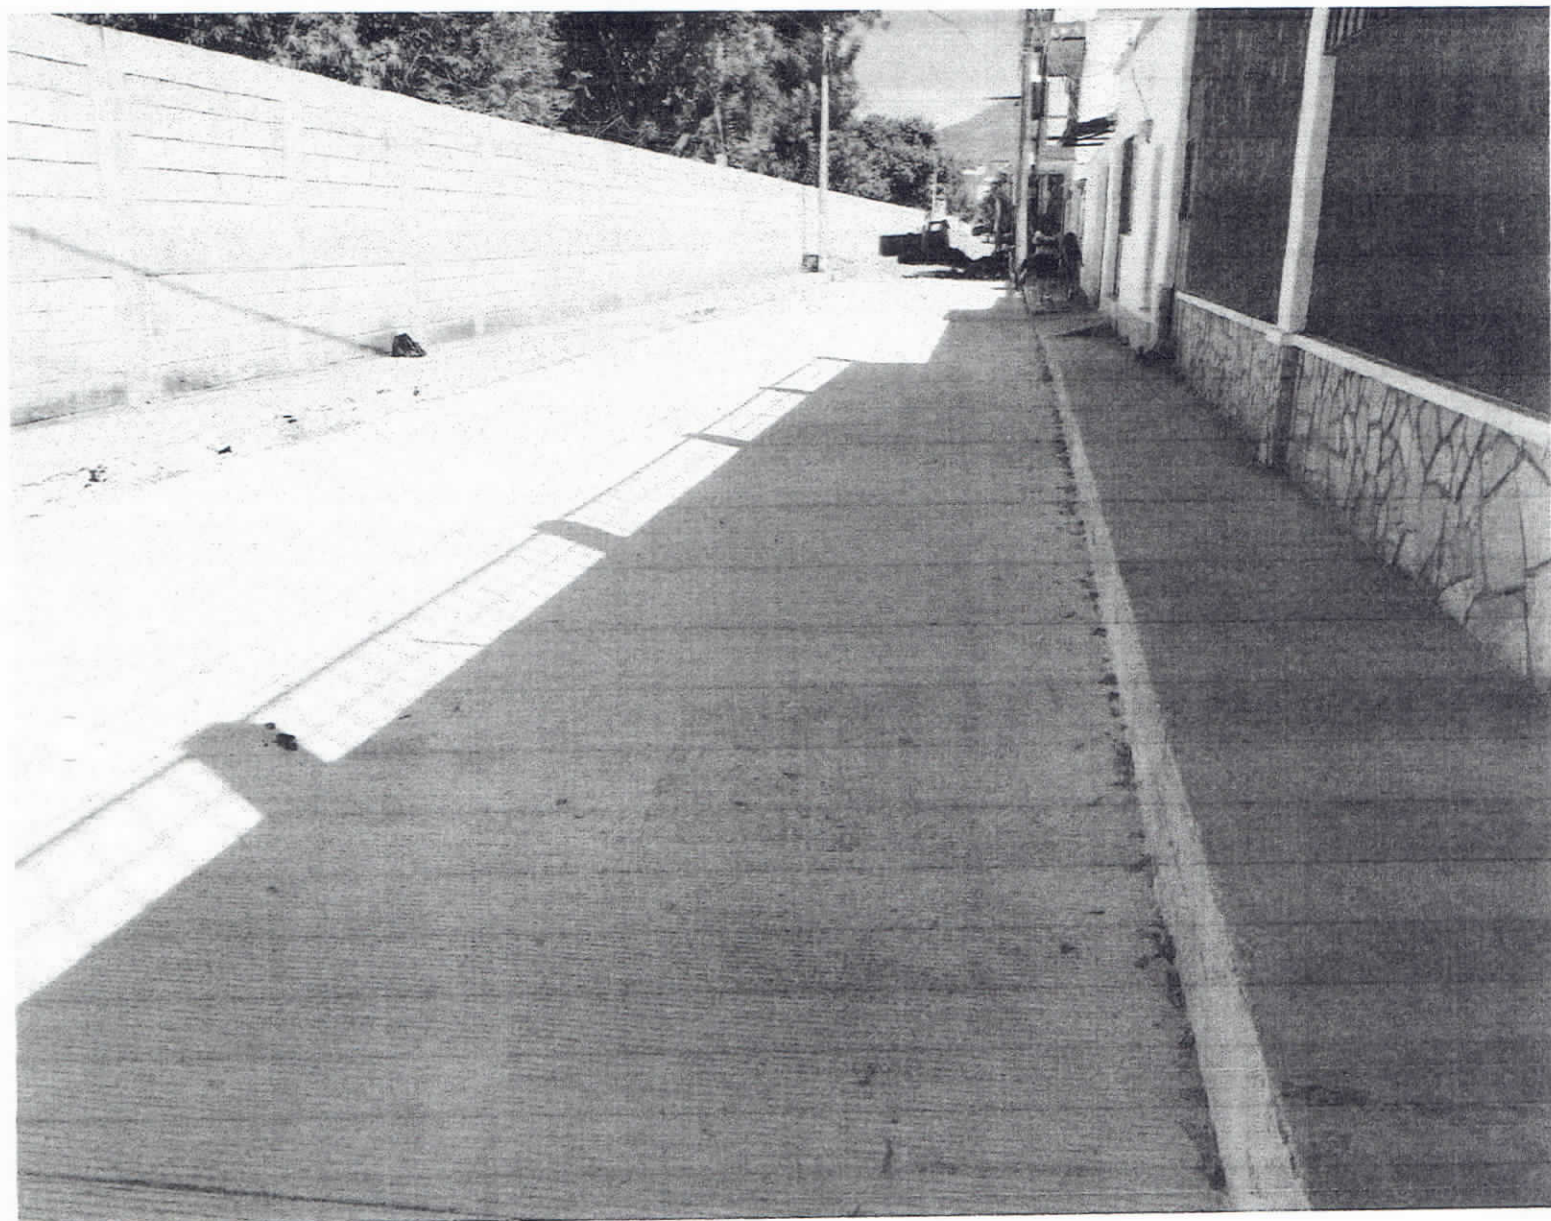

LA INFRASCRITA SECRETARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO,

CERTIFICA:

Que para su cumplimiento y efectos consiguientes se transcribe la **AUTENTICIDAD** del punto **CUARTO** del acta **14-2025** de fecha diecisiete de febrero de dos mil veinticinco del libro número 3,444 de sesiones ordinarias del Concejo Municipal, debidamente autorizado por la Contraloría General de Cuentas, el que copiado literalmente dice:

CUARTO: La Secretaria Municipal, hace del conocimiento del Honorable Concejo Municipal, sobre el oficio Ref.agmo/DMP/081-2025 presentado por el Licenciado Alexis Geovanny Marroquín Orellana, Director Municipal de Planificación, en el cual informa: que el proyecto **AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR LA FEDERAL, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO**, Contrato administrativo número **12-2024** de fecha 23 de julio de 2024, ejecutado por la empresa **CONSTRUFER** siendo su propietario **FERNANDO AUGUSTO HERNANDEZ GODOY**, presentó informe del **50%** de avance físico. Por lo tanto solicito que se apruebe el pago del 50% de avance físico del proyecto antes mencionado a la empresa **CONSTRUFER**. Consiguientemente y en cumplimiento al numeral 2) de la Cláusula Cuarta del contrato en referencia, presenta el informe de supervisión signado por el Ingeniero **JOSE FULGENCIO ALEXANDER AGUILAR MEJIA**, Supervisor de Obras Municipales, por medio del cual informa de la estimación, del avance físico del referido proyecto, indicando que se encuentra en un avance físico del 50.00%, anexa el detalle que contiene los renglones de trabajo para la presente estimación.

CONSIDERANDO: Que el artículo 59 del Decreto número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado, establece: "Estimaciones para pago. La entidad contratante podrá hacer pagos parciales al contratista contra estimaciones periódicas de trabajo ejecutado y aceptado, las que podrán efectuarse mensualmente de acuerdo con las estipulaciones pactadas." **CONSIDERANDO:** Que el Artículo 35 literal a), del Decreto 12-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Código Municipal y sus reformas establece: Atribuciones Generales del Concejo Municipal "son atribuciones del Concejo Municipal: a) La iniciativa, deliberación y decisión de los asuntos municipales...".

POR TANTO: El Concejo Municipal, con fundamento en los considerandos y las facultades que le confiere el Decreto 12-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Código Municipal y sus reformas, y por **UNANIMIDAD DE VOTOS. RESUELVE:** I) Se tiene por recibido el oficio presentado, agregándose al expediente respectivo. II) **APROBAR**, el pago equivalente al avance físico del 50%, a favor de la empresa mercantil **CONSTRUFER**, propiedad del señor Fernando Augusto Hernandez Godoy, de conformidad con el monto de estimación de avance físico, anexa el detalle que contiene los renglones de trabajo para la presente estimación, presentados por el Supervisor de Obras Municipales del proyecto **AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR LA FEDERAL, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO**, el que se ejecuta con el





MUNICIPALIDAD DE
GUASTATOYA
¡Sirviendo!

☎ 5980-0535


📍 MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

📍 BARRIO EL CALVARIO, GUASTATOYA EL PROGRESO

Contrato Administrativo de Obras 12-2024. III) Se le ordena al Director de Administración Financiera Integrada Municipal, hacer las operaciones contables correspondientes y proceder al pago de conformidad con lo aprobado en el numeral romano II) del presente punto resolutivo. IV) Notifíquese.

(Fs) Ilegibles José Elías Herrera Guerra, Alcalde Municipal, Ing. Byron Fernando Calderón Ferrera y Eduardo Ortega Loaiza, Síndicos Primero y Segundo respectivamente, Hernán Archila Morales, Erasmo Beltrán Contreras, Nery Rolando Archila Orellana, Julio Mauricio Marroquín González, Fryda Almée Estrada Ortiz, Concejales Primero, Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto, respectivamente y Licda. Evelyn Yaneth Oajaca Marroquín, Secretaria Municipal.

DADO EN EL PALACIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE GUASTATOYA, DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, A DIECIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTICINCO.


SECRETARIA

LICDA. EVELYN YANETH OAJACA MARROQUIN
SECRETARIA MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE
GUASTATOYA
¡Sirviendo!

