



MUNICIPALIDAD DE
GUASTATOYA
¡Sirviendo!

➤ LISTADO DE OBRAS QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCION DEL AÑO 2025, FONDOS PROVENIENTES DE LA MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, EL PROGRESO Y CONCEJOS DE DESARROLLO.

ENTIDAD	Municipalidad de Guastatoya, El Progreso.
DIRECCIÓN	Barrio El Clavario, Guastatoya, El Progreso.
HORARIO DE ATENCIÓN	Lunes a viernes de 8:00 am a 16:30 pm.
TELÉFONO	79451594.
DIRECTOR	Alexis Geovanny Marroquín Orellana.
ENCARGADO DE LA ACTUALIZACIÓN	Beverly Mishell Cruz Orellana.
FECHA DE ACTUALIZACIÓN	05 de diciembre del año 2025.
CORRESPONDE AL MES DE	NOVIEMBRE del año 2025.






MUNICIPALIDAD DE
GUASTATOYA
¡Sirviendo!

☎ 5980-0535 📍 MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
📍 BARRIO EL CALVARIO, GUASTATOYA EL PROGRESO

➤ LISTADO DE OBRAS QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCION DEL AÑO 2025, CON FONDOS PROVENIENTES DE LA MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, EL PROGRESO.

NO.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTADA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO
01.	336295	CONSTRUCCION CENTRO RECREATIVO Y VACIONAL MUNICIPAL PARQUE ACUATICO, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO. (Mismo avance mes de agosto)	EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION CENTRO RECREATIVO Y VACIONAL MUNICIPAL PARQUE ACUATICO, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO	BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Q. 6.532.874.00	01-0101-0001	12 MESES CALENDARIO	2000	CONSTRUFER	FERNANDO AUGUSTO HERNANDEZ GODOY	34-2024	60%	Q. 4.537.534.31





MUNICIPALIDAD DE
GUASTATOYA
¡Sirviendo!

☎ 5980-0535 📍 MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
📍 BARRIO EL CALVARIO, GUASTATOYA EL PROGRESO

NO.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCION	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTADA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO
02.	354583	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CERO DEL PINAL, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO (Líquidado)	El proyecto consiste en el MEJORAMIENT O CALLE CON ADOQUIN CERO DEL PINAL, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO	BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Q. 437,950.00	21-0101-0001	04 MESES CALENDARIO	800	CONSTRUCTORA LA UNION	GERZON ALONZO JUAREZ CALDERON	04-2025	100%	Q. 437,950.00





MUNICIPALIDAD DE
GUASTATOYA
¡Sirviendo!

-  5980-0535
-  MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
-  BARRIO EL CALVARIO, GUASTATOYA EL PROGRESO

NO.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTADA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO
03.	336296	CONTRUCCION CENTRO RECREATIVO PARQUE ACUATICO, RESTAURANTE MUNICIPAL BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO (Mismo avance)	El proyecto consiste en LA CONTRUCCION CENTRO RECREATIVO PARQUE ACUATICO, RESTAURANTE MUNICIPAL BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO	BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Q. 1,299,500.00	42-0161-0002	06 MESES CALENDARIO	1200	MULTISERVICIOS PL	EDDIE ERLY DANNIER Y PORTILLO LINDA	05-2025	37.50%	Q. 487,481.25





MUNICIPALIDAD DE
GUASTATOYA
[Logo]

5980-0535
MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
BARRIO EL CALVARIO, GUASTATOYA EL PROGRESO

NO.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE ELECUCIÓN	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTADA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO
04.	335053	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SECTOR DOBLE VIA. BARRIO EL GOLFO. GUASTATOYA, EL PROGRESO	El proyecto consiste en MEJORAMIENTO O CALLE CON PAVIMENTO SECTOR DOBLE VIA. BARRIO EL GOLFO, GUASTATOYA, EL PROGRESO	SECTOR DOBLE VIA, BARRIO EL GOLFO, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Q. 5,399,800.00	42-0161-0003	06 MESES CALENDARIO	800	NYD CONSTRUCCIONES	NORMAN ESTUARDO ORELLANA RAMIREZ	20-2025	80%	Q. 5,399,800.00





MUNICIPALIDAD DE
GUASTATOYA
¡Sirviendo!

☎ 5980-0535 📍 MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
📍 BARRIO EL CALVARIO, GUASTATOYA EL PROGRESO

NO.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTADA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
05.	344803	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO INICIA A UN COSTADO DE EDIFICIO MUNICIPAL, HACIA DOBLE VIA, BARRIO EL GOLFO, GUASTATOYA, EL PROGRESO	El proyecto consiste en MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO INICIA A UN COSTADO DE EDIFICIO MUNICIPAL, HACIA DOBLE VIA, BARRIO EL GOLFO, GUASTATOYA, EL PROGRESO	BARRIO EL GOLFO, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Q. 3,598,745.00	21-0101-0001	06 MESES CALENDARIO	1200	CONSTRUFER	fernando AUGUSTO HERNANDEZ GODOY	17-2025	80%	Q. 2,699,058.75

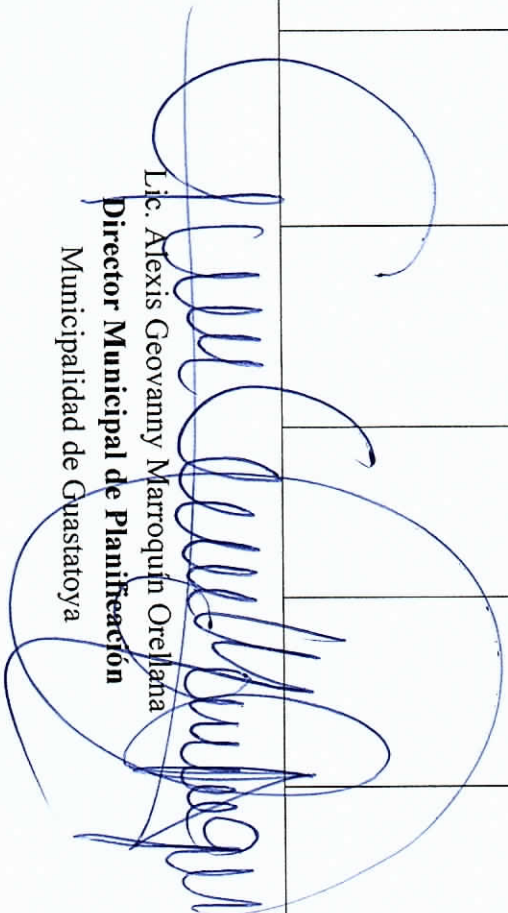




MUNICIPALIDAD DE
GUASTATOYA
¡Sirviendo!

☎ 5980-0535 📍 MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
📍 BARRIO EL CALVARIO, GUASTATOYA EL PROGRESO

NO.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTADA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
06.	360696	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO LOTIFICACION VISTA HERMOSA, CABECERA MUNICIPAL, GUASTATOYA, EL PROGRESO.	EL PROYECTO CONSISTE EN EL MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO LOTIFICACION VISTA HERMOSA, CABECERA MUNICIPAL, GUASTATOYA, EL PROGRESO. 2701 M2 DE LIMPIEZA TRAZO Y CHAPEO. 2701 M2 DE CORTE Y NIVELACIÓN DE CAJUELA, 2575 M2 DE BASE DE MATERIAL. GRANULAR, 820 DE BORDILLO, 2575 DE PAVIMENTACIÓN, 1 UNIDAD DE SEÑALIZACIÓN.	LOTIFICACION VISTA HERMOSA, CABECERA MUNICIPAL, GUASTATOYA, EL PROGRESO.	Q. 2,000,000.00	42-0161-0003	06 MESES CALENDARIO	1200	CONSTRUFIRME	KATHERINE JOHANA CACAO ALAVARADO	21-2025	20%	Q. 399,960.00


Lc. Alexis Geovanny Matroquín Orellana
Director Municipal de Planificación
Municipalidad de Guastatoya



➤ LISTADO DE OBRAS QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCION DEL AÑO 2025, FONDOS PROVENIENTES CONSEJOS DE DESARROLLO.

ENTIDAD	Concejos de Desarrollo y Municipalidad de Guastatoya, El Progreso.
DIRECCIÓN	Barrio El Clavario, Guastatoya, El Progreso.
HORARIO DE ATENCIÓN	Lunes a viernes de 8:00 am a 16:30 pm.
TELÉFONO	79451594.
DIRECTOR	Alexis Geovanny Marroquín Orellana.
ENCARGADO DE LA ACTUALIZACIÓN	Beverly Mishell Cruz Orellana.
FECHA DE ACTUALIZACIÓN	05 de diciembre del año 2025.
CORRESPONDE AL MES DE	NOVIEMBRE del año 2025.



LISTADO DE OBRAS QUE SE ENCUENTRAN EJECUTADAS O EN EJECUCION DEL AÑO 2025, FONDOS PROVENIENTES POR CONSEJOS DE DESARROLLO.

No.	SINIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCION	BENEFICIA RIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
1.	352326	MEJORAMIENTO CALLE URBANA SECTOR MERCADO VIEJO, BARRIO EL GOLFO GUASTATOYA, EL PROGRESO (Mismo avance)	El Proyecto consiste en el MEJORAMIENTO CALLE URBANA MERCADO VIEJO, BARRIO EL GOLFO, GUASTATOYA, EL PROGRESO. Demolición de estructura de (adoquinado y banquetas) retiro y acarreo; preliminares, reacondicionamiento de subrasante, colocación más compactación de préstamo granular de espesor de 0.10 mts al 95% del sector modificado, fundición de pavimento de 0.15 mts de espesor resistencia a la compresión de 210 kg 10/cm2. unidades de r	BARRIO EL GOLFO, GUATATOYA, EL PROGRESO	Q. 1,999,896.00	31-0101-0004	06 MESES CALENDARIO	750	CONSTRUCTORA MYA	CARLOS ALBERTO AMADO ORELLANA	19-2025	20%	Q. 399,979.20



No.	SINIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCION	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACION ES DEL CONTRATO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
2.	336923	MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA ANSHAGUA, GUASTATOYA, EL PROGRESO (liquidado)	El Proyecto Consiste en el MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA ANSHAGUA, GUASTATOYA, EL PROGRESO, tomando en consideración la pavimentación del mismo, para ellos es necesario la ejecución de los siguientes reglones de trabajo: trazo y replanteo fotográfico, reacondicionamiento de subrasante, capa, base pavimento de concreto, corte y sellado de junta, bordillo de concreto	ALDEA ANSHAGUA, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Q. 1,000,000.00	22-0101-0001	5 MESES CALENDARIO	800	FERRCONS BALCARCEL	NEFTALI BARCALCEL ORELLANA	07-2025	100%	Q. 999,929.62



No.	SINIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE ELECUCION	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
3.	336927	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL BRASILAR HACIA LA ALDEA LAS MORALES, GUASTATOYA, EL PROGRESO (Mismo Avance)	El Proyecto Consiste en el MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL BRASILAR CAMINO HACIA ALDEA LAS MORALES, GUASTATOYA, EL PROGRESO, tomando en consideración la pavimentación del mismo, para ello es necesario la ejecución de los siguientes regiones de trabajo: replanteo fotográfico, corte de cajuelas, nivelación y estabilización de rasante, colocación de base granular, pavimento de concreto, corte y sellado de junta transversal. Bordillo prefabricado, rampas de remate de calle, con ello se tendrá un pavimento que satisfaga las necesidades de la población en aspectos de movilidad tanto personal como vehicular	RURAL CASERIO EL BRASILAR HACIA ALDEA LAS MORALES, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Q. 1,700,500.00	22 0101 0001	06 MESES CALENDARIO	850	NYD	NORMAN ESTUARDO ORELLANA RAMIREZ	08-2025	90%	Q. 1,487,937.50





MUNICIPALIDAD DE
GUASTATOYA
(Sigüiendo)

5980-0535 MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
BARRIO EL CALVARIO, GUASTATOYA EL PROGRESO

No.	SINIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE ELECUCION	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EIECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
4.	334365	MEJORAMIENTO CALE RURAL SECTOR LOS BORDOS, ALDEA TIERRA BLANCA GUASTATOYA, EL PROGRESO (Mismo avance)	EL proyecto consiste en el MEJORAMIENTO CALE RURAL SECTOR LOS BORDOS, ANDEA TIERRA BLANCA, GUASTATOYA, EL PROGRESO 1531 m2 de trabajos preliminares 1531 m2 de corte de nivelación del terreno a nivel de rasante existente, 1531 m2 de colocación +compactación de base granular de espesor de 0.10 mts, 1399 m2 de colocación de adoquin tráfico pesado 280 kg/cm2, 633 ml de llaves de confinamiento longitudinales 450 de bordillo fundido de ingreso, 1 unidad de pintura para tráfico pesado línea central	SECTOR LOS BORDOS, ALDEA TIERRA BLANCA, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Q. 1,000,000.00	22-0101-001	04 MESES CALENDARIO	950	CONSTRUCT ORA Y ELECTRICOS M.Y WALLRUD	TOMAS REYES PICON	09-2025	80%	Q. 650,520.00





No.	SINIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCION	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
5.	340101	MEJORAMIENTO CALLE URBANA A UN COSTADO DEL PARQUE MINERVA, ABRRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO (Mismo avance)	El Proyecto Consiste en el MEJORAMIENTO CALLE URBANA A UN COSTADO DEL PARQUE MINERVA, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL, PROGRESO de retiro de adoquinado existente, corte y nivelación de cajuelas, base de material granular, bordillo, fundición de pavimento, señalización	BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Q. 399,844.00	31 3101 0004	05 MESES CALENDARIO	800	CONSTRUCTORA MA	CARLOS ALBERTO AMADO ORELLANA	10-2025	20%	Q. 79,968.80





No.	SINIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCION	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
6.	353146	MEJORAMIENTO CALLE URBANA 3ERA LOTIFICACION MINERVA, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO (liquidado)	El Proyecto consiste en el MEJORAMIENTO CALLE URBANA 3ERA CALLE LOTIFICACION MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO: limpieza del pavimento existente, bote de pintura, corte de cajuela, mano de obra, transporte, carpeta de rodadura, pavimentación.	LOTIFICACION MINERVA, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Q. 699,600.00	31 0101 004	06 MESES CALENDARIO	1200	CONSTRUCORA VARGAS	VINICIO ALEXANDER VARGAS ARRIAZA	11-2025	100%	Q. 139,920.00





No.	SINIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE ELECUCION	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EIECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
7.	353144	MEJORAMIENTO CALLE URBANA 2DA CALLE LOTIFICACION MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO (Mismo Avance)	El Proyecto consiste en el MEJORAMIENTO CALLE URBANA 2DA CALLE LOTIFICACION MINERVA, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO, retiro de adoquin existente, corte y nivelación de cajuelas, base de material granular, bordillo, función de pavimento, señalización	LOTIFICACIÓN MINERVA, BARRIO MINERVA GUASTATOYA, EL PORGRESO	Q. 899,800.00	31 01 0004	05 MESES CALENDARIO	1200	BYR CONSTRUCTOR ES	ELIO EVERALDO BARRERA RAMIREZ	12-2025	20%	Q. 179,9560.00





MUNICIPALIDAD DE
GUASTATOYA
¡Siguiendo!

☎ 5980-0535

📍 MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

📍 BARRIO EL CALVARIO, GUASTATOYA EL PROGRESO

No.	SINIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCION	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
8.	352329	MEJORAMIENTO CALLE URBANA INICIA A UN COSTADO DE BANRURAL HACIA PRECIDIOS, BARRIO EL GOLFO, GUASTATOYA, EL PROGRESO (Mismo Avance)	El Proyecto consiste en el MEJORAMIENTO CALLE URBANA INICIA A UN COSTADO DE BANRURAL HACIA PRECIDIOS, BARRIO EL GOLFO, GUASTATOYA, EL PROGRESO, consiste en 392 m de trazo de replanteo fotográfico 2095 m2 de levantamiento de carpeta existente y corte de cajuela, 2095 m2 de reacondicionamiento de sub-rasante, 2095 m2 de capa de base 2095 m2 de concreto, 1090 m de corte y sello de juntas, 980 m señalización horizontal.	BARRIO EL GOLFO, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Q.1,999,671.00	31 0101 0004	06 MESES CALENDARIO	550	CONSTRUCTORA VARGAS	VINICIO ALEXANDER VARGAS ARRIAZA	14-2025	20%	Q. 399,934.20





MUNICIPALIDAD DE
GUASTATOYA
¡Siguiendo!

5980-0535

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

BARRIO EL CALVARIO, GUASTATOYA EL PROGRESO

No.	SINIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE ELECUCION	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD ELECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
9.	352318	MEJORAMIENTO CALLE URBANA BARRIO LA DEMOCRACIA, GUASTATOYA (Mismo Avance)	El Proyecto consiste en el MEJORAMIENTO CALLE URBANA BARRIO LA DEMOCRACIA, GUASTATOYA, EL PROGRESO, retiro de adoquinado existente, corte y nivelación de cajuelas, base de material granular, bordillo, fundición de pavimento, señalización	BARRIO LA DEMOCRACIA, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Q. 1,999,550.00	31 0101 0004	06 MESES CALENDARIO	1200	CONSTRUCTORA DE UNION	GERZON ALFONZO JUAREZ CALDERON	18-2025	80%	Q. 1,200,000.00





No.	SINIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCION	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
10.	352317	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR EL TIERRA BLANCA HACIA CA -9 ALDEA EL SUBINAL GUASTATOYA, EL PROGRESO	El Proyecto consiste en el MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE SECTOR EL TIERRA BLANCA HACIA CA-9 ALDEA SUBINAL, GUASTATOYA, EL PROGRESO, 833 m de trazo y replanteo fotográfico, 5057m2 de reacondicionamiento de sub-Rasante, 5057 m2 de capa base E=0.10M, 4224 M2 de pavimento de concreto e=0.15 m, 2241 ml de corte y sello de juntas, 1666ml de cuneta tipo I, 2083 ml de señalización horizontal, 3 unidades construcción de transversales de agua pluvial de 30PLG, 57 M3, muro de contención	ALDEA EL SUBINAL, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Q. 3.999,741.00	31-0101-004	06 MESES CALENDARIO	540	FERRCONS BALCARCEL	NETALI BALCARCEL ORELLANA	15-2025	50%	Q. 2,000,000.00





MUNICIPALIDAD DE
GUASTATOYA
Sirviendo!

5980-0535

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

BARRIO EL CALVARIO, GUASTATOYA EL PROGRESO

No.	SINIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EECUCION	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
11.	353145	MEJORAMIENTO CALLE URBANA LOTIFICACION EL CARMEN, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO	El Proyecto consiste en el MEJORAMIENTO CALLE URBANA LOTIFICACION EL CARMEN, BARRIO MINERVA, EL PROGRESO, retiro de adoquinado existente, corte y nivelación de cajuela, base de material granular, bordillo, función de pavimento, señalización	LOTIFICACION EL CARMEN, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Q. 499,500.00	31-0101-004	04MESES CALENDARIO	800	CONSTRUCTORA MYA	CARLOS ALBERTO AMADO ORELLANA	13-2025	80%	Q. 375,000.00






No.	SINIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE ELECUCION	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
12.	331065	MEJORAMIENTO HOSPITAL DE EL PROGRESO AREA DE EMERGENCIA, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO (liquidado)	El Proyecto Consiste en el MEJORAMIENTO HOSPITAL DE EL PROGRESO AREA DE EMERGENCIA, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO el proyecto consiste en la construcción en el mejoramiento del área de emergencia del hospital de El Progreso lo que contribuirá con la mejora atención a los habitantes del departamento que asistan al hospital por alguna emergencia en cuanto su salud.	BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Q. 249,950.00	31-0101-0004	05 MESE CALENDARIO	1200	MULTISERVICIOS PL	EDDIE ERLY DANNIERY PORTILLO LIMA	03-2025	100%	Q. 289,949,00





No.	SINIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCION	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
13.	336936	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA COLONIA NUEVA VIDA, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO	el proyecto consiste en REPOSICIÓN ESCUELA PRIMARIA COLONIA NUEVA VIDA, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO	COLONIA NUEVA VIDA, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Q.4,452,600.00	21-0101-0001	10 MESES CALENDARIO	600	NYD CONSTRUCCIONES	NORMAN ESTUARDO ORELLANA RAMIREZ	16-2025	20%	Q. 890,520.00


Lic. Alexis Geovanny Marroquín Orellana
Dirección Municipal de Planificación
Municipalidad de Guastatoya

