REPORTE DE PAGO DE PROYECTOS POR CONTRATO 2024

EXPEDIENTE No. **276** NOG: **24619787** CONTRATO No. **22-2024**

PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL LOTIFICACION LO DE RODAS, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO

APORTES	% DE AVANCE	ESTIMACION	AMORTIZACION	LIQUIDO A RECIBIR
Aporte Municipal	**90.00%**			
Q. 366,700.00		Q. 330,030.00	Q. 66,006.00	Q. 264,024.00
12 02 003 000 005 331 29-0101-0002				
12 02 003 000 005 331 21-0101-0001				
12 02 003 000 005 331 29-0101-0003				
TOTALES		Q. 330,030.00	Q. 66,006.00	Q. 264,024.00

Se cuenta con Informe de supervisión por parte de la empresa, informe de supervisión por el Supervisor de Obras Municipales, Acuerdo de Alcaldía de aprobación de avance, Copia de bitácora.

Lic. Alexis Geovanny Marroquín Orellana
Director Municipal de Planificación

DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN
MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA ¡Sirviendo!

BANRURAL
El amigo que te ayuda a crecer

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

CUENTA UNICA DEL TESORO
MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA C.U.T.
CUENTA No. 3-005-09207-3
GUATEMALA, C.A.

CHEQUE No. 76118

No. 19802168

LUGAR Y FECHA: GUASTATOYA, Capital de la amistad 17 DICIEMBRE del 2024

PAGO A LA ORDEN DE: ***JUAREZ CALDERON, CESAR ALFONSO***

SUMA DE: ***DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL VEINTICUATRO***

Q. **264,024.00**

QUETZALES.

GT86 BRRL 0101 0000 0030 0509 2073

FIRMA FIRMA

NO NEGOCIABLE

FORMULARIOS STANDARD S. A. PBX 2423-8000

DESCRIPCION DEL PAGO: POR CONCEPTO: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 90% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL LOTIFICACION LO DE RODAS, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO 76118

CUENTA No.	C O N C E P T O	DEBE	HABER
	NUMERO DE CHEQUE: 76118 CON NUMERO DE EXPEDIENTE: 276 TRANSACCION No: 60006480 NIT BENEFICIARIO: 9304614 DELMI.ORELLANA17122024 17 de DICIEMBRE del 2024		

HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	RECIBI CONFORME	DIA	MES	AÑO
				18	12	24

4037407 T0340 3048407 87

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
¡Sirviendo!

EXPEDIEN
PR
LOTIF

A						T
Aporte M	Q. 366,70	12 02	12 02	12 02		

Se cuent
Supervis
bitácora.
Lic. Alex
Director

Factura

GERZON ALFONZO, JUÁREZ CALDERÓN
Nit Emisor: 9304614
CONSTRUCTORA LA UNION
KILOMETRO 72 5 RUTA AL ATLANTICO CASAS VIEJAS, Guastatoya, EL PROGRESO
NIT Receptor: 6206107
Nombre Receptor: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
35E87EB4-7AB2-42FA-9A92-232E845D7ABA
Serie: 35E87EB4 Número de DTE: 2058502906
Numero Acceso:

Fecha y hora de emision: 17-dic-2024 14:44:19
Fecha y hora de certificación: 17-dic-2024 14:44:19
Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripcion	Precio/Valor unitario (Q)	Descuentos (Q)	Otros Descuentos(Q)	Total (Q)	Impuestos	
1	Servicio	1	Pago 1cra. estimación del proyecto: MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL LOTIFICACION LO DE RODAS, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO, según contrato Administrativo de Obras No. 22-2024 de fecha 27 de noviembre 2024; valor Estimación Q 330,030.00; (-) Amortización del Anticipo Q 66,006.00; liquido a recibir Q 264,024.00	330,030.00	0.00	0.00	330,030.00	IVA	35,360.357143
			TOTALES:		0.00	0.00	330,030.00	IVA	35,360.357143

* Sujeto a pagos trimestrales ISR

Datos del certificador
Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949

"Contribuyendo por el país que todos queremos"

MUNICIPALIDAD DE
GUASTATOYA
¡Sirviendo!

5980-0535 MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
BARRIO EL CALVARIO, **GUASTATOYA EL PROGRESO**

PINFORME DE SUPERVISION

Guastatoya, 16 de Diciembre de 2024

SEÑOR: JOSE ELIAS HERRERA GUERRA Y CONSEJO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
EL PROGRESO

De la manera más atenta me dirijo a usted deseándole toda clase de éxitos en sus labores diarias.

El motivo de la presente es para hacerle saber lo siguiente:

En visita de supervisión realizada al proyecto denominado **MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL LOTIFICACION LO DE RODAS, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO,** con número de contrato **22-2024** de fecha 27 de Noviembre de 2024, ejecutado por la empresa **CONSTRUCTORA LA UNION**, financiado por la Municipalidad de Guastatoya, se tiene a la vista el oficio de Diciembre de 2024 en el cual se hace la solicitud de la estimación del proyecto para un avance del **90.00%**, para lo cual se adjunta el informe de supervisión y el informe de parte de la empresa.

Agradeciendo su atención y en espera de darle seguimiento a este asunto me suscribo de ustedes.

Atentamente

José F. Alexander Aguilar Mejia
Ingeniero Civil
Colegiado No. 9,366

ING. JOSE FULGENCIO ALEXANDER AGUILAR MEJIA
SUPERVISOR MUNICIPAL, GUASTATOYA
EL PROGRESO

D.M.P.

SUPERVISION DE OBRAS

Dirección Municipal de Planificación

Comunidad.	**Contrato Municipal.**
Cabecera Municipal, Guastatoya, El Progreso	22-2024

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

Nombre del proyecto.	**Ubicación del proyecto.**
MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL LOTIFICACION LO DE RODAS, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Cabecera Municipal, Guastatoya, El Progreso
Contratista. CONSTRUCTORA LA UNION **Monto Contratado.** Q 366,700.00	**Ubicación del proyecto.** Cabecera Municipal, Guastatoya, El Progreso **Avance Físico.** 90.00%
Informe de Supervisión No. 1	**Fecha.** 16 de Diciembre de 2024

2. AVANCE DE EJECUCION DEL PROYECTO

No.	Descripcion del Renglón	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total	Total a la Fecha	Avance Físico %
1	TRABAJOS PRELIMINARES						
1.01	REPLANTEO TOPOGRAFICO	31.50	ML	Q 90.50	Q 2,850.75	Q 2,850.75	100%
1.02	EXCAVACIONES	100.00	M3	Q 299.75	Q 29,975.00	Q 29,975.00	100%
1.03	RETIRO DE ESTRUCTURAS EXISTENTES	3.00	UNIDAD	Q 1,875.00	Q 5,625.00	Q 5,625.00	100%
2	CAMBIO TUBERIA DE DRENAJE PLUVIAL						
2.01	INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA DE 36"	31.50	ML	Q 5,184.00	Q 163,296.00	Q 163,296.00	100%
2.02	CONSTRUCCION CAJA RECEPTORA Y CAJA TIPO BUZON	2.00	UNIDAD	Q 13,584.00	Q 27,168.00	Q 27,168.00	100%
3	RELLENO						
3.01	CONFORMACION DE RELLENO CONTROLADO CON MATERIAL CLASIFICADO (maximo capas t=0.10)	90.00	M3	Q 449.75	Q 40,477.50	Q 40,477.50	100%
4	REPOSICION DE CARPETA DE RODADURA EXISTENTE (ADOQUIN)						
4.01	REPOSICION DE ADOQUIN	30.00	M2	Q 377.00	Q 11,310.00	Q 11,310.00	100%
5	ADOQUINADO CARPETA NUEVA						
5.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE ADOQUIN TIPO CRUZ (incluye bordillo)	109.56	M2	Q 450.25	Q 49,327.75	Q 49,327.75	57%
					Q 330,030.00	**Q 330,030.00**	**90.00%**

Estos renglones de trabajo dan como resultado un avance físico del **90.00%** **por lo cual se aprueba realizar el pago correspondiente**

3. DESCRIPCION DEL PROYECTO.

Este proyecto consiste en el mejoramiento del sistema de alcantarillado pluvial de la colonia lo de rodas, en el barrio minerva, el cual vendra a mejorar el desfogue de las aguas pluviales que afectan en el tiempo de invierno

4. RECOMENDACIONES.

Chequear los trabajos realizados para garantizar la durabilidad de los mismos, y terminar los trabajos faltantes, los que no se encuentran al 100 % y los que no se han iniciado aun

SUPERVISOR DE PROYECTOS MUNICIPALES.

José F. Alexander Aguilar Mejia
Ingeniero Civil
Colegiado No. 9,366

ING. JOSE FULGENCIO ALEXANDER AGUILAR MEJIA
SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES

ALCALDE
MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
¡Sirviendo!

JOSE ELIAS HERRERA GUERRA
ALCALDE MUNICIPAL DE GUASTATOYA

D.M.P.	SUPERVISION DE OBRAS	Dirección Municipal de Planificación

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

Nombre del proyecto.	**Ubicación del proyecto.**
MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL LOTIFICACION LO DE RODAS, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Cabecera Municipal, Guastatoya, El Progreso

2. INFORME FOTOGRAFICO.







SUPERVISOR DE PROYECTOS MUNICIPALES.

José F. Alexander Aguilar Mejia
Ingeniero Civil
Colegiado No. 9,366

ING. JOSE FULGENCIO ALEXANDER AGUILAR MEJIA
SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES

ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

JOSE ELIAS HERRERA GUERRA
ALCALDE MUNICIPAL DE GUASTATOYA

REPORTE DE AVANCE FISICO No. 1

Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL LOTIFICACION LO DE RODAS, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO	
Municipio: GUASTATOYA	**Departamento: EL PROGRESO**
Comunidad: CABECERA MUNICIPAL	**Fecha de Contrato: 27/11/2024**
Fecha de Inicio: 06/12/2024	**Fecha de Supervision: 16/12/2024**
Fecha de Finalizacion: 05/05/2025	**Unidad Ejecutora: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA**
Contrato No.: 22-2024	**Valor del Proyecto: Q.366,700.00**
Modificaciones:	**Valor Original: Q.366,700.00**
Constructora: CONSTRUCTORA LA UNION	**Telefono:**
Representante legal: GERSON ALFONZO JUAREZ CALDERON	

RESUMEN DE RENGLONES

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDADES DE TRABAJO				ORDEN DE CAMBIO	ORDEN DE TRABAJO SUPLEMENTARIO	ORDEN DE TRABAJO EXTRA	RENGLON MODIFICADO	CANTIDADES EJECUTADAS PRIMERA ESTIMACION		ACUMULADO A LA FECHA		PORCENTAJE
		CANTIDAD	UNIDAD	P UNITARIO	TOTAL	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	TOTAL
1	TRABAJOS PRELIMINARES													
1.01	REPLANTEO TOPOGRAFICO	31.50	ML	Q 90.50	Q 2,850.75					31.50	Q 2,850.75	31.50	Q 2,850.75	0.78%
1.02	EXCAVACIONES	100.00	M3	Q 299.75	Q 29,975.00					100.00	Q 29,975.00	100.00	Q 29,975.00	8.17%
1.03	RETIRO DE ESTRUCTURAS EXISTENTES	3.00	UNIDAD	Q 1,875.00	Q 5,625.00					3.00	Q 5,625.00	3.00	Q 5,625.00	1.53%
2	CAMBIO TUBERIA DE DRENAJE PLUVIAL													
2.01	INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA DE 36"	31.50	ML	Q 5,184.00	Q 163,296.00					31.50	Q 163,296.00	31.50	Q 163,296.00	44.53%
2.02	CONSTRUCCION CAJA RECEPTORA Y CAJA TIPO BUZON	2.00	UNIDAD	Q 13,584.00	Q 27,168.00					2.00	Q 27,168.00	2.00	Q 27,168.00	7.41%
3	RELLENO													
3.01	CONFORMACION DE RELLENO CONTROLADO CON MATERIAL CLASIFICADO (maximo capas t=0.10)	90.00	M3	Q 449.75	Q 40,477.50					90.00	Q 40,477.50	90.00	Q 40,477.50	11.04%
4	REPOSICION DE CARPETA DE RODADURA EXISTENTE (ADOQUIN)													
4.01	REPOSICION DE ADOQUIN	30.00	M2	Q 377.00	Q 11,310.00					30.00	Q 11,310.00	30.00	Q 11,310.00	3.08%
5	ADOQUINADO CARPETA NUEVA													
5.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE ADOQUIN TIPO CRUZ (Incluye bordillo)	191.00	M2	Q 450.25	Q 85,997.75					109.56	Q 49,327.75	109.56	Q 49,327.75	13.45%
	COSTO TOTAL DEL PROYECTO				**Q 366,700.00**						**Q 330,030.00**		**Q 330,030.00**	**90.00%**

VALOR DE ESTIMACION No. 1	Q	330,030.00
AMORTIZACION DEL ANTICIPO (20%)	Q	66,006.00
PENDIENTE DE AMORTIZAR	Q	7,334,00
LIQUIDO A RECIBIR	**Q**	**264,024.00**

José F. Alexander Aguilar Mejia
Ingeniero Civil
Colegiado No. 9,366

JOSE FULGENCIO ALEXANDER AGUILAR MEJIA
INGENIERO SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES

ALCALDE

MUNICIPALIDAD E
GUASTATOYA
¡Servicio!

JOSE ELIAS HERRERA GUERRA
ALCALDE MUNICIPAL GUASTATOYA

CONSTRUCTORA LA UNION
KM. 72.5, RUTA AL ATLANTICO ALDEA CASAS VIEJAS GUASTATOYA,
EL PROGRESO TEL. 3091-9731

Guastatoya, 13 de diciembre de 2024

Señor:
José Elías Herrera Guerra
Alcalde Municipal
Municipio de Guastatoya, El Progreso
Su Despacho

Estimado Señor Alcalde, Reciba un atento saludo de mi parte esperando que sus actividades al frente de la administración municipal se desarrollen con éxito, el motivo de la presente es para SOLICITAR se realice el proceso de pago de la ESTIMACION No. 1 del proyecto "MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL LOTIFICACION LO DE RODAS, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA EL PROGRESO" que se ejecuta bajo el contrato número 22/2024 de 27 noviembre 2024, presentado a la fecha un avance físico del 90.00 %, y acumulado del 90.00 % por lo que agradeceré gire instrucciones a donde corresponda para que se efectúen las diligencias necesarias para que se haga efectivo el proceso de pago solicitado, esperando se dé el apoyo y la atención necesaria a mi solicitud y sin otro en particular, me suscribo de usted, atentamente,

GERZON ALFONZO JUAREZ CALDERON
PROPIETARIO
CONSTRUCTORA LA UNION

CONSTRUCTORA LA UNION
TEL. 3091-9731
KM. 72.5 RUTA AL ATLANTICO
ALDEA CASAS VIEJAS
GUASTATOYA, EL PROGRESO

CONSTRUCOTRA LA UNION

ESTIMACION No. 1

27 NOVIEMBRE 2024 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2024

PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL LOTIFICACION LO DE RODAS, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA EL PROGRESO			
		EMPRESA O ENTIDAD : CONSTRUCTORA LA UNION	
LOCALIZACIÓN: BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO	SUPERVISOR MUNICIPIAL: ING. JOSE FULGENCIO ALEXANDER AGUILAR MEJIA	MONTO CONTRACTUAL: Q. 366,700.00	

ESTIMACION No. 1

RENGLONES DE TRABAJO		VALORES CONTRATADOS				ESTE PERÍODO			ACUMULADOS A LA FECHA			PENDIENTE DE EJECUTAR		
No.	NOMBRE DEL RENGLON	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	CANTIDAD	MONTO	% AVANCE	CANTIDAD	MONTO	% AVANCE	CANTIDAD	MONTO	% AVANCE
1.00	**TRABAJOS PRELIMINARES**													
1.01	REPLANTEO TOPOGRAFICO	ML	31.50	Q90.50	Q2,850.75	31.50	Q2,850.75	0.777%	31.50	Q2,850.75	0.777%	0.00	Q0.00	0.00%
1.02	EXCAVACIONES	M3	100.00	Q299.75	Q29,975.00	100.00	Q29,975.00	8.174%	100.00	Q29,975.00	8.174%	0.00	Q0.00	0.00%
1.03	RETIRO DE ESTRUCTURAS EXISTENTES	UNIDAD	3.00	Q1,875.00	Q5,625.00	3.00	Q5,625.00	1.534%	3.00	Q5,625.00	1.534%	0.00	Q0.00	0.00%
2.00	**CAMBIO TUBERIA DE DRENAJE PLUVIAL**													
2.01	INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA DE 36"	ML	31.50	Q5,184.00	Q163,296.00	31.5	Q163,296.00	44.531%	31.5	Q163,296.00	44.531%	0.00	Q0.00	0.00%
2.02	CONSTRUCCION CAJA RECEPTORA Y CAJA TIPO BUZON	UNIDAD	2.00	Q13,584.00	Q27,168.00	2.0	Q27,168.00	7.409%	2.0	Q27,168.00	7.409%	0.00	Q0.00	0.00%
3.00	**RELLENO**													
3.01	CONFORMACION DE RELLENO CONTROLADO CON MATERIAL CLASIFICADO (maximo capas t=0.10)	M3	90.00	Q449.75	Q40,477.50	90.00	Q40,477.50	11.038%	90.00	Q40,477.50	11.038%	0.00	Q0.00	0.00%
4.00	**REPOSICION CARPETA DE RODADURA EXISTENTE (ADOQUIN)**													
4.01	REPOSICION DE ADOQUIN	M2	30.00	Q377.00	Q11,310.00	30.00	Q11,310.00	3.084%	30.00	Q11,310.00	3.084%	0.00	Q0.00	0.00%
5.00	**ADOQUINADO CARPETA NUEVA**													
5.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE ADOQUIN TIPO CRUZ (inlcuye bordillo)	M2	191.00	Q450.25	Q85,997.75	109.56	Q49,327.75	13.452%	109.56	Q49,327.75	13.452%	81.44	Q36,670.00	10.00%
TOTALES					**Q366,700.00**		**Q330,030.00**	**90.00%**		**Q330,030.00**	**90.000%**		**Q36,670.00**	**10.00%**

MONTO TOTAL ESTA ESTIMACION	**Q 330,030.00**	**90.00%**
AMORTIZACION DEL ANTICIPO EN ESTA ESTIMACION	**Q 59,405.40**	**90.00%**
MONTO LIQUIDO ESTA ESTIMACION	**Q 270,624.60**	
MONTO DEL ANTICIPO OTORGADO	**Q 66,006.00**	
MONTO DEL ANTICIPO AMORTIZADO	**Q 59,405.40**	
MONTO DE ANTICIPO POR AMORTIZAR	**Q 6,600.60**	

AVANCE AL PERÍODO	PORCENTAJE
Avance de esta estimacion	90%
Avance de estimacion anterior	0.00%
Total acumulado de la estimación	90.00%

GERSON ALFONSO JUAREZ CALDERON
PROPIETARIO
CONSTRUCTORA LA UNION

CONSTRUCTORA LA UNION
TEL. 3091-9731
KM. 72.5 RUTA AL ATLANTICO
ALDEA CASAS VIEJAS
GUASTATOYA, EL PROGRESO

ALAN ROBERTO SALVADOR AGUILAR HERRERA
SUPERVISOR
CONSTRUCTORA LA UNION

Allan Roberto Salvador Aguilar Herrera
ARQUITECTO
COLEGIADO No. 5525

CONSTRUCTORA LA UNION
KM. 72.5, RUTA AL ATLANTICO ALDEA CASAS VIEJAS GUASTATOYA,
EL PROGRESO TEL. 3091-9731

CONSTRUCTORA LA UNION

KM. 72.5, RUTA AL ATLANTICO ALDEA CASAS VIEJAS GUASTATOYA,
EL PROGRESO TEL. 3091-9731

INFORME FOTOGRAFICO DE ESTIMACION No. 1
27 NOVIEMBRE 2024 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2024
"MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL LOTIFICACION LO DE RODAS, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA EL PROGRESO"

SUMINISTRO E INSTALACION DE ADOQUIN TIPO CRUZ (incluye bordillo)







EXCAVACIONES PARA INSTALACION DE TUBERIA, DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES Y CONSTRUCCION DE CAJAS TIPO BUZON








CONSTRUCTORA LA UNION
TEL. 3091-9731
KM. 72.5 RUTA AL ATLANTICO
ALDEA CASAS VIEJAS
GUASTATOYA, EL PROGRESO

Allan Roberto Salvador Aguilar Herrera
ARQUITECTO
COLEGIADO No. 5525


CONSTRUCTORA LA UNION


KM. 72.5, RUTA AL ATLANTICO ALDEA CASAS VIEJAS GUASTATOYA,
EL PROGRESO TEL. 3091-9731

SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 36" PARA DRENAJE PLUVIAL

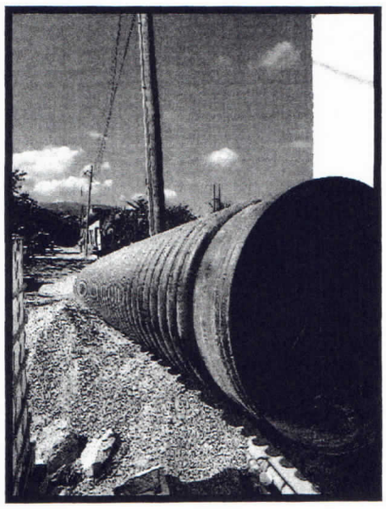

CONSTRUCCION DE CAJAS TIPO BUZON

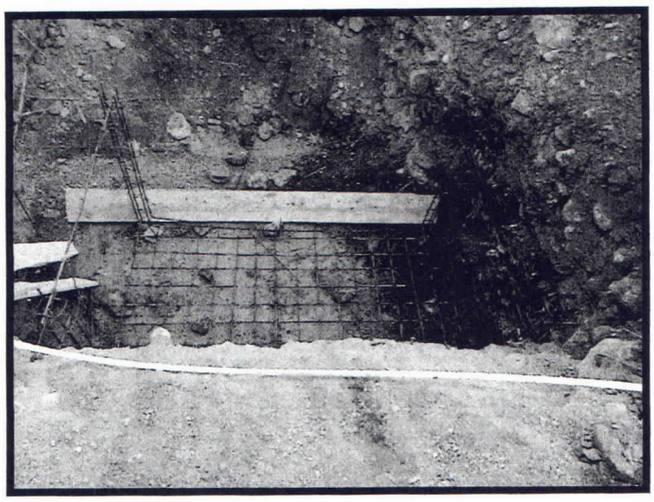

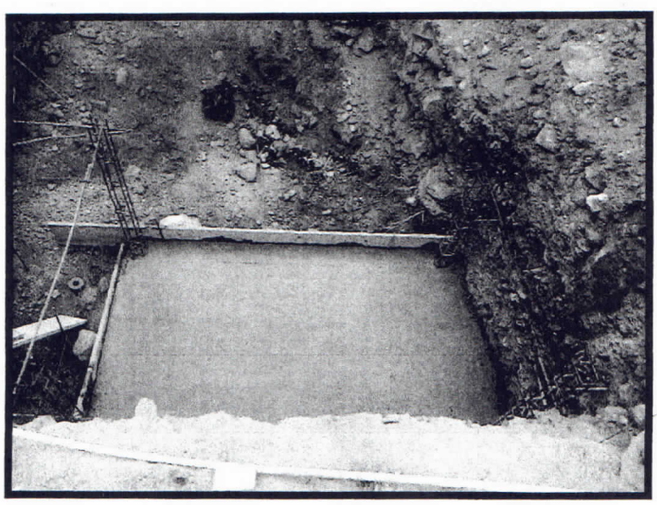

CONSTRUCTORA LA UNION
TEL. 3091-9731
KM. 72.5 RUTA AL ATLANTICO
ALDEA CASAS VIEJAS
GUASTATOYA, EL PROGRESO

Allan Roberto Salvador Aguilar Herrera
ARQUITECTO
COLEGIADO No. 5525

CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA Y GESTIÓN AMBIENTAL

UNIDAD DE BITÁCORAS – DATOS DE LA BITÁCORA ELECTRÓNICA –

BITÁCORA ELECTRÓNICA No. 4348/12/2024

No. CONTRATO	22-2024
FECHA CONTRATO	27/11/2024
MONTO CONTRACTUAL	366,700.00
NOG	24619787
NOMBRE DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL LOTIFICACION LO DE RODAS, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO
UBICACIÒN DEL PROYECTO	Guastatoya, EL PROGRESO
ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
NOMBRE DEL SUPERVISOR	ALLAN ROBERTO SALVADOR AGUILAR HERRERA
EMPRESA EJECUTORA	GERZON ALFONZO JUÁREZ CALDERÒN
REPRESENTANTE LEGAL O CONTRATISTA	GERZON ALFONZO JUAREZ CALDERON
NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL PROYECTO	JOSE FULGENCIO ALEXANDER AGUILAR MEJIA
SUPERVISOR EMPRESA SUPERVISORA	

FECHA DE AUTORIZACIÒN 04/12/2024


BITÁCORA ELECTRÓNICA No. 4348/12/2024

CONTRATO No. 22-2024

NOMBRE: MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL LOTIFICACION LO DE RODAS, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO


ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

REGISTRO No.	1
FECHA	16/12/2024
TIPO	AVANCE
DESCRIPCIÓN	Se realiza visita de campo para ver el avance del proyecto en lotificación lo de rodas, viendo que ya se encuentra instalada la tuberia y parte del adoquin, ademas de las cajas pluviales
CREADO POR	JOSE FULGENCIO ALEXANDER AGUILAR MEJIA

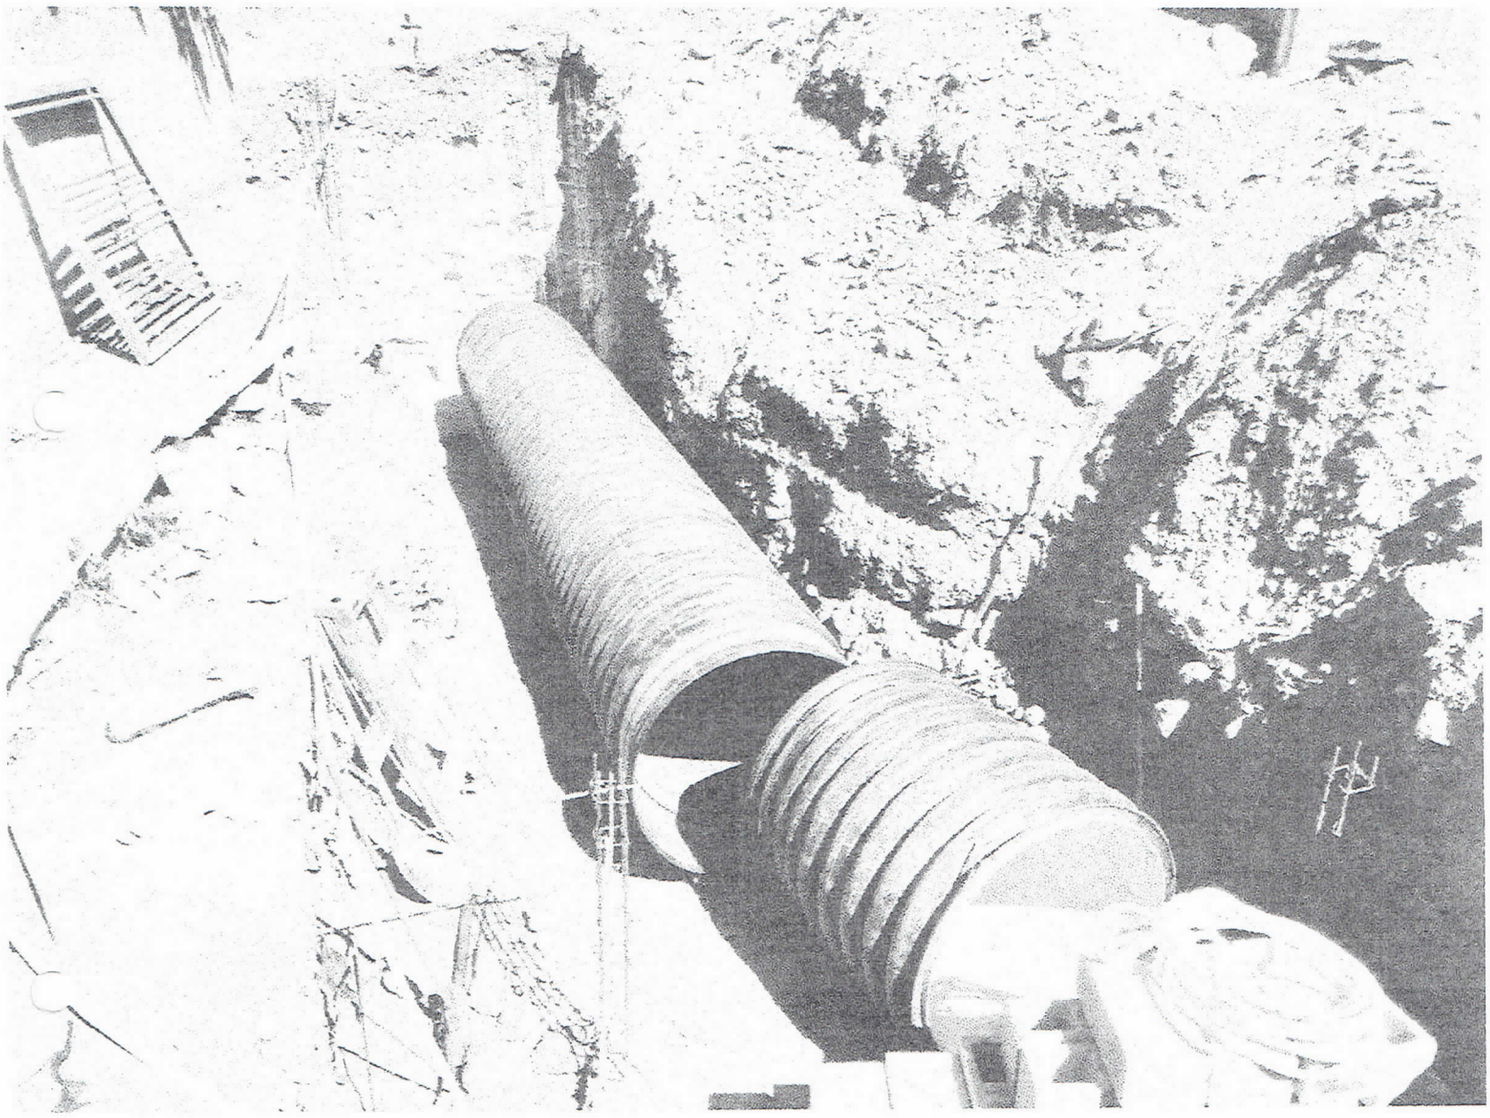







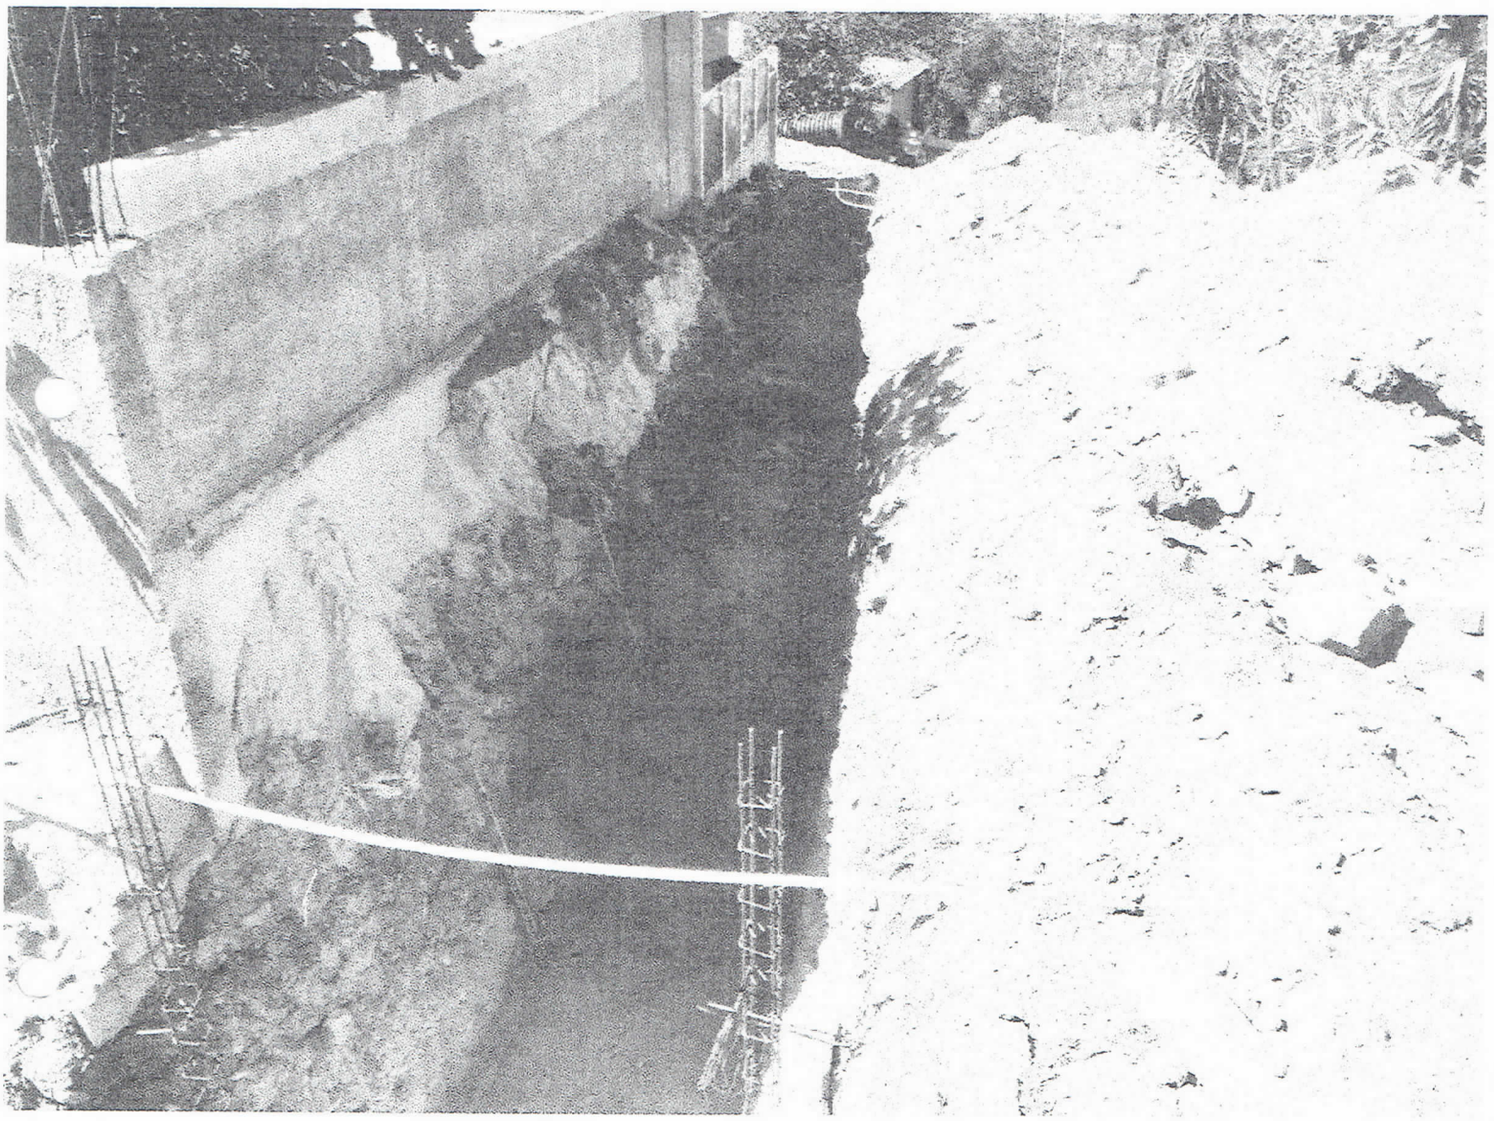



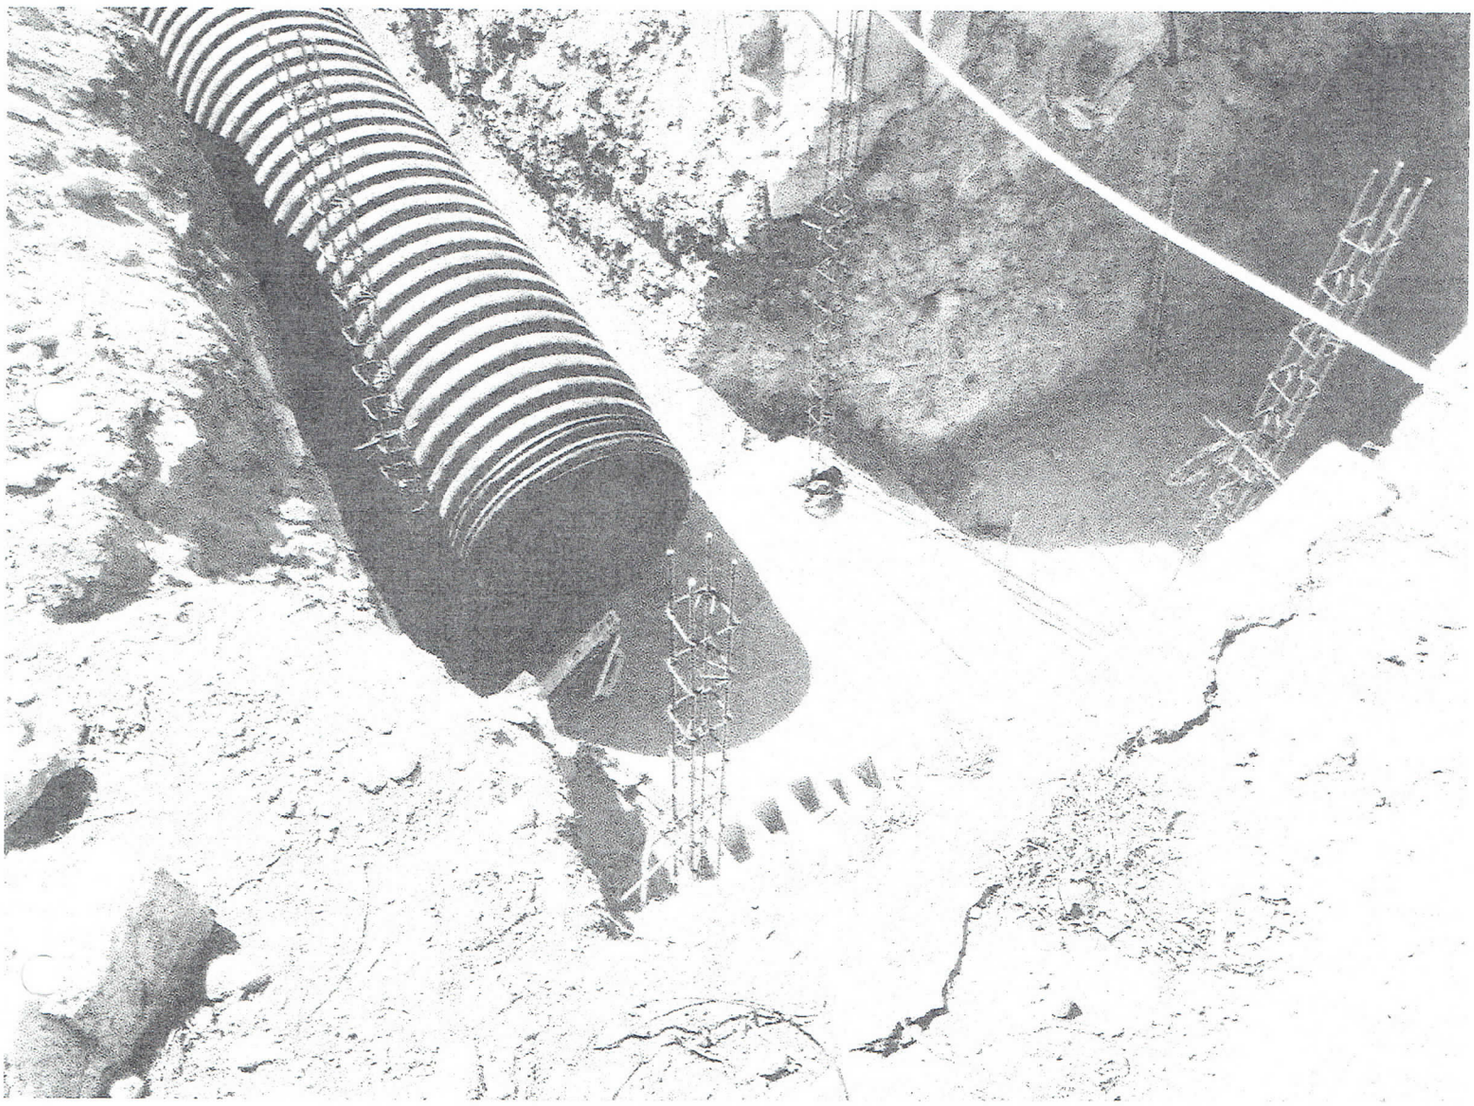

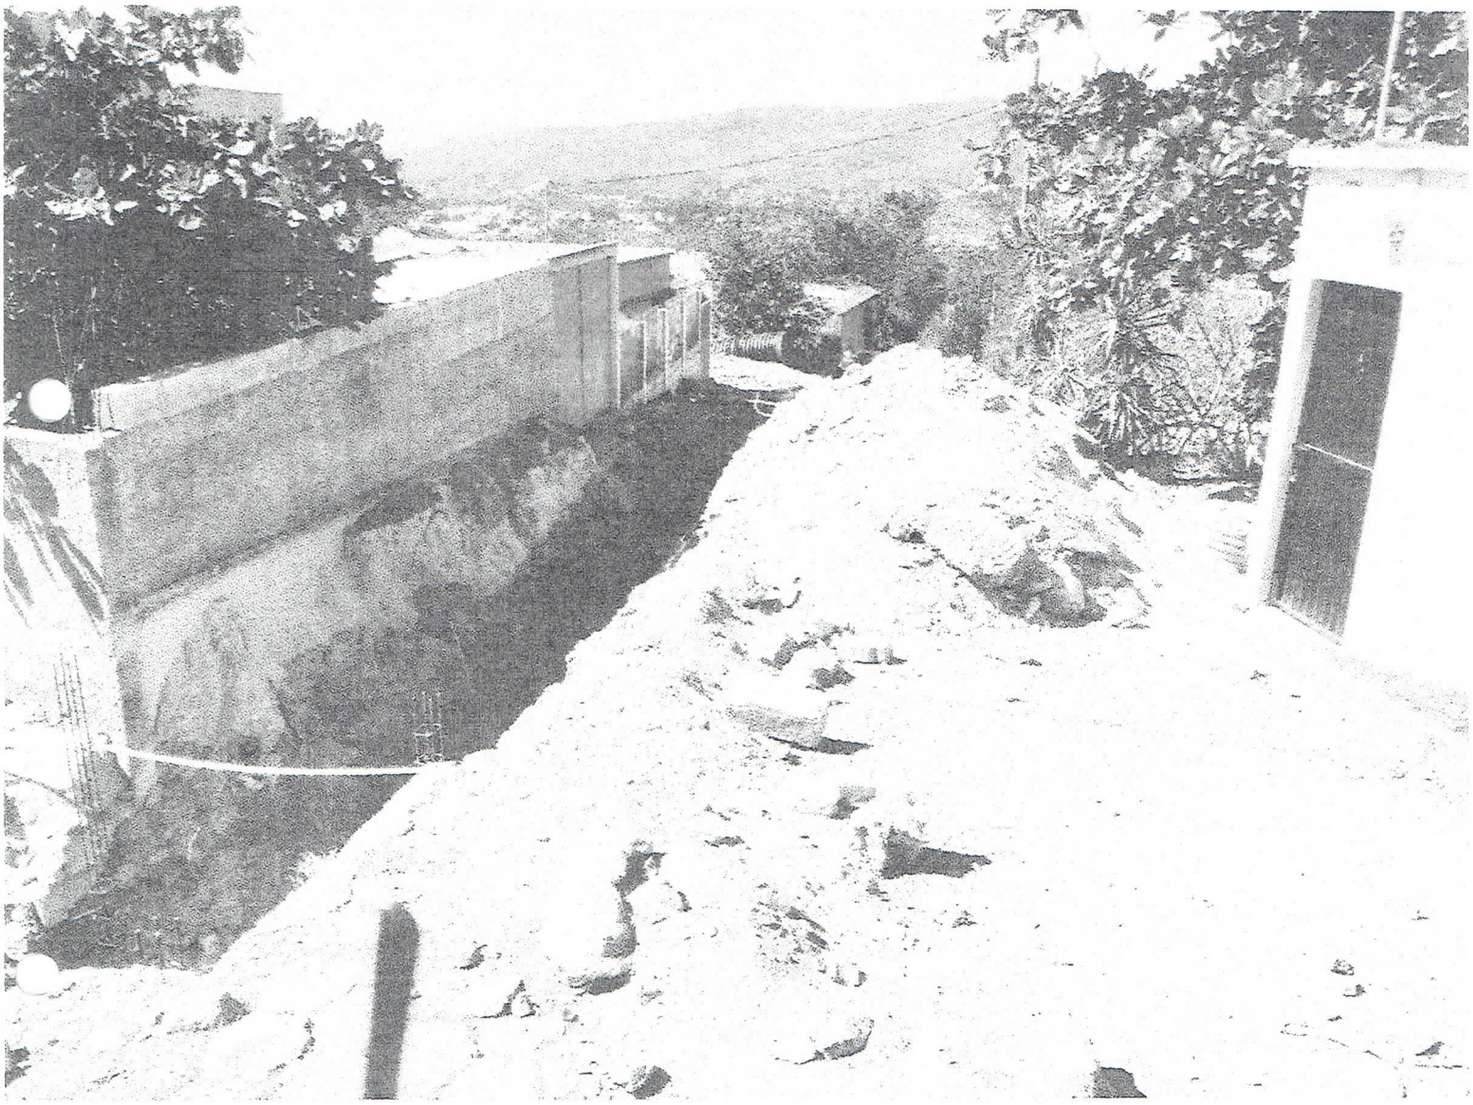



MUNICIPALIDAD DE
GUASTATOYA
¡Sirviendo!

5980-0535 MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
BARRIO EL CALVARIO, **GUASTATOYA EL PROGRESO**

LA INFRASCRITA SECRETARIA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO

CERTIFICA

Que para su cumplimiento y efectos consiguientes se transcribe EL ACUERDO MUNICIPAL No. 138-2024 de fecha diecisiete de diciembre de dos mil veinticuatro del libro número 3,211 de la Alcaldía Municipal, Libro de Acuerdos, debidamente autorizado por la Contraloría General de Cuentas, el que copiado literalmente dice:

ACUERDO MUNICIPAL 138-2024

Guastatoya, 17 de Diciembre de 2,024

DESPACHO DEL ALCALDE MUNICIPAL

La Autoridad Administrativa Superior

Se tiene a la vista la solicitud presentada por Gerzon Alfonzo Juarez Calderon propietario de la empresa **CONSTRUCTORA LA UNION**, en la cual manifiesta que el proyecto denominado **"MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL LOTIFICACION LO DE RODAS, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO"**, el que se ejecuta por Contrato Administrativo de Obra número 22-2024, de fecha veintisiete de noviembre de dos mil veinticuatro; y que el proyecto en referencia se encuentra en un avance físico del 90.00%, en consecuencia solicitan el pago de conformidad con la cláusula cuarta numeral 2) del contrato administrativo de obras.

Consecuentemente se encuentra el informe del Ingeniero Jose Fulgencio Alexander Aguilar Mejía, Supervisor de Obras Municipales, en el cual hace constar la confirmación del avance del proyecto en referencia, por un total de 90.00% de avance físico, adjunta para el efecto la estimación.

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con el artículo 59 de la Ley de Contrataciones del Estado, establece: Estimaciones para pago. *"La entidad contratante podrá hacer pagos parciales al contratista contra estimaciones periódicas de trabajo ejecutado y aceptado, las que podrán efectuarse mensualmente de acuerdo con las estipulaciones pactadas."*.

POR TANTO:

Con fundamento en los antecedentes y lo considerado, este Despacho Municipal.

RESUELVE:

I) **APROBAR**, el pago por la cantidad de 90.00%, del proyecto **"MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL LOTIFICACION LO DE RODAS, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO"**, el que se ejecuta por Contrato Administrativo de Obra número 22-2024, de fecha veintisiete de noviembre de dos mil veinticuatro; suscrito por el Alcalde Municipal y Gerzon Alfonzo Juarez Calderon propietario de **CONSTRUCTORA LA UNION.**

II) **SE ORDENA**, al Director de la Administración Financiera Municipal, hacer el pago correspondiente al 90.00% del monto total del proyecto.

III) Cúmplase. -

DADO EN EL PALACIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE GUASTATOYA, DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, A DIECISIETE DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO.

SECRETARIA

LICDA. EVELYN YANETH OAJACA MARROQUIN
SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA ¡Sirviendo!

Municipalidad de Guastatoya, Departamento de El Progreso

CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DELEGACION DEPARTAMENTAL GUASTATOYA EL PROGRESO GUATEMALA, C. A.

DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION

LIBRO DE ACTAS DE INICIO DE OBRAS Nº 0169

ACTA DE INICIO NO. 19-2024

PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL LOTIFICACION LO DE RODAS, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO. IDENTIFICADO CON NOG. 24619787, EN GUATECOMPRAS. ----------

En el Municipio de Guastatoya, Departamento El Progreso, siendo las ocho horas en punto del día viernes seis de diciembre de dos mil veinticuatro, reunidos en el área donde se va a ejecutar el Proyecto, **MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL LOTIFICACION LO DE RODAS, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO.** Los señores: José Elías Herrera Guerra, Alcalde Municipal; Ing. José Fulgencio Alexander Aguilar Mejía, Supervisor de Obras Municipales; Gerzon Alfonzo Juárez Calderón, Representante Legal de la Empresa Constructora; Arq. Allan Roberto Salvador Aguilar Herrera, Supervisor Residente del Proyecto; Lic. Alexis Geovanny Marroquín Orellana, Director de la Dirección Municipal de Planificación; con el objeto de dejar constancia de lo siguiente. **PRIMERO:** Se facciona la presente acta para dejar constancia de Inicio del Proyecto: **MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL LOTIFICACION LO DE RODAS, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO.** El cual será ejecutado con fondos municipales para la inversión del ejercicio fiscal 2,024; por un Valor de Trescientos Sesenta y Seis Mil Setecientos Quetzales Exactos (Q. 366,700.00), con un plazo de cinco meses calendario el cual, por adjudicación en los procesos y requisitos de GUATECOMPRAS, lo ejecutará la empresa **CONSTRUCTORA LA UNION,** Habiendo sido publicado en el Sistema de Guatecompras la adjudicación bajo el NOG- 24619787, Según Contrato Administrativo No. 22-2024 de fecha veintisiete de noviembre del dos mil veinticuatro. **SEGUNDO:** Los señores anteriormente mencionados declaran iniciados los trabajos, los cuales se realizarán con base a planos y especificaciones elaboradas para el presente proyecto y de acuerdo al contrato respectivo. **TERCERO:** El Señor Alcalde Municipal recomienda al representante de la empresa constructora, al supervisor residente de la empresa y supervisor de obras municipales que los trabajos sean ejecutados en base al diseño y especificaciones propias de este proyecto y presentar los avances del mismo para el pago respectivo con la documentación de soporte. **CUARTO:** No habiendo más que agregar se da por terminada la presente en el mismo lugar y fecha media hora después de su inicio. Leída se acepta, ratifica y firma por los que en ella intervenimos Damos fe. ------

ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA ¡Sirviendo!

José Elías Herrera Guerra
Alcalde Municipal

DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA ¡Sirviendo!

Lic Alexis Geovanny Marroquín Orellana
Director
Dirección Municipal de Planificación

Gerzon Alfonzo Juárez Calderón
Representante de la empresa

CONSTRUCTORA LA UNION
TEL. 3091-9731
KM. 72.5 RUTA AL ATLANTICO
ALDEA CASAS VIEJAS
GUASTATOYA, EL PROGRESO

Arq. Allan Roberto Salvador Aguilar Herrera
Supervisor Residente

José F. Alexander Aguilar Mejia
Ingeniero Civil
Colegiado No. 9,366

Allan Roberto Salvador Aguilar Herrera
ARQUITECTO
COLEGIADO No. 5525

Ing. José Fulgencio Alexander Aguilar Mejía
Supervisor de Obras Municipales

MUNICIPALIDAD DE
GUASTATOYA
¡Sirviendo!

5980-0535 MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
BARRIO EL CALVARIO, **GUASTATOYA EL PROGRESO**

REPORTE DE PAGO DE PROYECTOS POR CONTRATO 2024

EXPEDIENTE No. **276** NOG: **24619787** CONTRATO No. **22-2024**

PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL LOTIFICACION LO DE RODAS, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO

APORTES	% DE AVANCE	ESTIMACION	AMORTIZACION	LIQUIDO A RECIBIR
Aporte Municipal	**20.00%**			
Q. 366,700.00				**Q. 73,340.00**
14 02 001 000 001 332 21-0101-001				
TOTALES				**Q. 73,340.00**

Se cuenta con contrato administrativo de obras, fianza de cumplimiento de contrato, fianza de anticipo, solicitud de pago de anticipo, cronograma de inversión del anticipo, aprobación de contrato, aprobación de pago de anticipo y autorización de bitácora electrónica.

ENCARGADO DE PRESUPUESTO
MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA ¡Sirviendo!

DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN
MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA ¡Sirviend

Lic. Alexis Geovanny Marroquín Orellana
Director Municipal de Planificación

BANRURAL
El amigo que te ayuda a crecer

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
Capital de la amistad

CUENTA UNICA DEL TESORO
MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA C.U.T.
CUENTA No. 3-005-09207-3
GUATEMALA, C.A.

CHEQUE No. 75895

No. 1934244

LUGAR Y FECHA: 5 DE DICIEMBRE del 2024

PAGO A LA ORDEN DE: **JUAREZ CALDERON, GERSON ALFONSO**

SUMA DE: **CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA**

Q. **41,940.00**

QUETZALES.

GT86 BRRL 0101 0000 0030 0509 2073

FIRMA

FIRMA

NO NEGOCIABLE

F. STANDARD, S.A. - PBX: 2423-8800 - FAX: 2423-8819.

DESCRIPCION DEL PAGO: POR CONCEPTO: PAGO DEL 20% DE ANTICIPO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL LOTIFICACION LO DE EDDAE, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO

75895

CUENTA No.	CONCEPTO	DEBE	HABER
	NUMERO DE CHEQUE: 75895 CON NUMERO DE EXPEDIENTE: 276 TRANSACCION No: 59831719 NIT BENEFICIARIO: 9304614 DELMI.ORELLANA05122024 5 de DICIEMBRE del 2024		

HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	RECIBI CONFORME	DIA	MES	AÑO
				06	12	24

3048407 T0340... 3042002 87

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
¡Sirviendo!

EXPEDIE

P

LOTI

	Aporte
	Q. 366,7
	14 0

Se cuent
anticipo
contrato

Lic. Ale
Director

CONSTRUCTORA LA UNION
KM. 72.5, RUTA AL ATLANTICO ALDEA CASAS VIEJAS GUASTATOYA,
EL PROGRESO TEL. 3091-9731

Guastatoya El Progreso, 19 de noviembre 2,024

SEÑORES:
JUNTA DE COTIZACION
MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO.

La presente es para solicitarles el anticipo del 20% del proyecto denominado: **MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL LOTIFICACION LO DE RODAS, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO,** el monto del anticipo asciende a la cantidad de SETENTA Y TRES MIL TRSCIENTOS CUARENTA QUETZALES EXACTOS (Q 73,340.00) evento publicado en el portal de Guatecompras según NOG: 24619787.

Atentamente,

F.) _____
Gerzon Alfonzo Juárez Calderón
CONSTRUCTORA LA UNION

CONSTRUCTORA LA UNION
TEL. 3091-9731
KM. 72.5 RUTA AL ATLANTICO
ALDEA CASAS VIEJAS
GUASTATOYA, EL PROGRESO

PLAN DE IVERSION DEL ANTICIPO 20%

Nombre del Proyecto: "MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL LOTIFICACION LO DE RODAS, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO"

PERIODO DE EJECUCION

				MES 1		MES 2		% Renglon Ejecutado	% Ejecutado	TOTAL
1.00	TRABAJOS PRELIMINARES									
1.01	REPLANTEO TOPOGRAFICO	ML	31.50	Q2,850.75				100.00%	0.78%	Q2,850.75
1.02	EXCAVACIONES	M3	100.00	Q29,975.00				100.00%	8.17%	Q29,975.00
1.03	RETIRO DE ESTRUCTURAS EXISTENTES	UNIDAD	3.00			Q5,625.00		100.00%	1.53%	Q5,625.00
2.00	CAMBIO TUBERIA DE DRENAJE PLUVIAL									
2.01	INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA DE 36"	ML	31.50			Q34,889.25		21.37%	9.51%	Q34,889.25
2.02	CONSTRUCCION CAJA RECEPTORA Y CAJA TIPO BUZON	UNIDAD	2.00					0.00%	0.00%	Q0.00
3.00	RELLENO									
3.02	CONFORMACION DE RELLENO CONTROLADO CON MATERIAL CLASIFICADO (maximo capas t=0.10)	M3	90.00					0.00%	0.00%	Q0.00
4.00	REPOSICION CARPETA DE RODADURA EXISTENTE (ADOQUIN)									
4.01	REPOSICION DE ADOQUIN	M2	30.00					0.00%	0.00%	Q0.00
5.00	ADOQUINADO CARPETA NUEVA									
5.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE ADOQUIN TIPO CRUZ (inlcuye bordillo)	M2	191.00					0.00%	0.00%	Q0.00
									20.00%	Q73,340.00

ACTUAL Q	Q32,825.75	Q40,514.25
ACTUAL %	8.95%	11.05%
ACUMULADO Q	Q32,825.75	Q73,340.00
ACUMULADO %	8.95%	20.00%

F._____
GERZON ALFONZO JUAREZ CALDERON
CONSTRUCTORA LA UNION

CONSTRUCTORA LA UNION
TEL. 3091-9731
KM. 72.5, RUTA AL ATLANTICO
ALDEA CASAS VIEJAS
GUASTATOYA, EL PROGRESO

CONSTRUCTORA LA UNION
KM. 72.5, RUTA AL ATLANTICO ALDEA CASAS VIEJAS GUASTATOYA,
EL PROGRESO TEL 3091-9731

GUASTATOYA
¡Sirviendo!

LA INFRASCRITA SECRETARIA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO

CERTIFICA

Que para su cumplimiento y efectos consiguientes se transcribe EL ACUERDO MUNICIPAL No. 127-2024 de fecha cinco de diciembre de dos mil veinticuatro del libro número 3,211 de la Alcaldía Municipal, Libro de Acuerdos, debidamente autorizado por la Contraloría General de Cuentas, el que copiado literalmente dice:

ACUERDO MUNICIPAL 127-2024

Guastatoya, 05 de Diciembre de 2,024

DESPACHO DEL ALCALDE MUNICIPAL

La Autoridad Administrativa Superior

Se tiene a la vista la solicitud presentada por el Director Municipal de Planificación Lic. Alexis Geovanny Marroquín Orellana, en la cual manifiesta que el proyecto denominado **"MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL LOTIFICACION LO DE RODAS, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO"** según contrato administrativo de obras número 22-2024 de fecha veintisiete de noviembre del dos mil veinticuatro por un monto de TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q. 366,700.00); y que para iniciar la ejecución del proyecto en referencia es necesario aprobar el pago del 20% de anticipo por el monto de SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA QUETZALES EXACTOS (Q. 73,340.00) y así poder cumplir con la cláusula cuarta inciso b) numeral uno del contrato referido.

CONSIDERANDO:

Que con fundamento en el artículo 58 de la Ley de Contrataciones del Estado y sus Reformas, establece "En construcción de obras puede otorgarse un anticipo supervisado hasta del veinte por ciento (20%) del valor del contrato. El porcentaje anterior se calculará sobre el valor original del contrato sin tomar en cuenta el valor del equipo que se adquiera mediante cartas de crédito abiertas por la entidad contratante."

POR TANTO:

Con fundamento en los antecedentes y lo considerado, este Despacho Municipal.

RESUELVE:

I) **I) APROBAR,** el pago del 20% del anticipo por un monto de SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA QUETZALES EXACTOS (Q. 73,340.00) al señor **GERZON ALFONZO JUAREZ CALDERON** propietario de la Empresa Mercantil denominada: **CONSTRUCTORA LA UNION.**

II) Remitir el presente punto resolutivo a la Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal para hacer las erogaciones correspondientes de conformidad con el contrato suscrito.

III) Notifíquese.

DADO EN EL PALACIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE GUASTATOYA, DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, A CINCO DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO.

GUASTATOYA ¡Sirviendo! MUNICIPALIDAD DE

LICDA. EVELYN YANETH OAJACA MARROQUIN
SECRETARIA MUNICIPAL

SECRETARIA

MUNICIPALIDAD DE
GUASTATOYA
¡Sirviendo!

5980-0535 MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
BARRIO EL CALVARIO, **GUASTATOYA EL PROGRESO**

LA INFRASCRITA SECRETARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO,

CERTIFICA:

Que para su cumplimiento y efectos consiguientes se transcribe la **AUTENTICIDAD** del punto **SÉPTIMO** del acta **83-2024** de fecha veintinueve de noviembre de dos mil veinticuatro del libro número 3,444 de sesiones ordinarias del Concejo Municipal, debidamente autorizado por la Contraloría General de Cuentas, el que copiado literalmente dice:

SÉPTIMO: El Señor Alcalde Municipal, hace del conocimiento del Concejo Municipal, que de conformidad con el Acuerdo 117-2024, de fecha 22 de noviembre de 2,024, del libro 3,211 de acuerdos municipales, por medio del cual se aprueba suscribir el contrato para la ejecución del proyecto denominado **MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL LOTIFICACION LO DE RODAS, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO**, manifestando el señor Alcalde Municipal, que se suscribió el **CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRAS NUMERO VEINTIDÓS GUION DOS MIL VEINTICUATRO (22-2024),** del proyecto referido, dicho contrato fue celebrado por el Señor Alcalde Municipal en representación de la Municipalidad de Guastatoya, y el señor GERZON ALFONZO JUÁREZ CALDERÓN Propietario de la Empresa denominada CONSTRUCTORA LA UNION; consecuentemente manifiesta que para los efectos legales consiguientes, este contrato debe de ser aprobado por la Autoridad Superior que en este caso es el Concejo Municipal. **CONSIDERANDO:** Que, el artículo 48 de la Ley de Contrataciones del Estado y sus reformas, establece "El contrato a que se refiere el artículo anterior, será aprobado por la misma autoridad que determina el artículo 9 de esta Ley, según sea el caso...". **CONSIDERANDO:** Que, el artículo 9 en los numerales 5, 5.1 y 5.2. de la Ley de Contrataciones del Estado y sus reformas, establece: "Autoridades competentes" 5. "Para las municipalidades y sus empresas ubicadas en las cabeceras departamentales: 5.1 Al Alcalde o al Gerente, según sea el caso, cuando el monto no exceda de novecientos mil Quetzales (Q.900,000.00). 5.2 A la corporación municipal o a la autoridad máxima de la empresa, cuando el valor total exceda de novecientos mil Quetzales (Q.900,000.00)". **POR TANTO:** Con fundamento en lo considerado, y las facultades que les confiere el artículo 35, literales, a), i) y u), del Decreto 12-2002, del Congreso de la República de Guatemala, Código Municipal y sus reformas, por Mayoría Absoluta de Votos. **ACUERDAN: I). APROBAR,** el **CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRAS NUMERO VEINTIDÓS GUION DOS MIL VEINTICUATRO (22-2024),** de fecha veintisiete de noviembre de dos mil veinticuatro, para el proyecto denominado **MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL LOTIFICACION LO DE RODAS, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO,** por la cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q. 366,700.00), con cada una de sus cláusulas dicho contrato fue celebrado por el Señor Alcalde Municipal en representación de la Municipalidad de Guastatoya, y el señor GERZON ALFONZO JUÁREZ CALDERÓN Propietario de la Empresa denominada CONSTRUCTORA LA UNION. **II).** Se ordena remitir el presente punto a la Dirección Municipal de Planificación, para el registro del contrato en la Contraloría General de Cuentas y efectuar el trámite de la bitácora electrónica. **III).** Realizar la publicación del presente punto en el portal electrónico del sistema de contrataciones y adquisiciones del Estado GUATECOMPRAS **IV).** El presente acuerdo entra en vigencia inmediatamente. **V).** Notifíquese.

(Fs) Ilegibles José Elias Herrera Guerra, Alcalde Municipal, Ing. Byron Fernando Calderon Ferrera y Eduardo Ortega Loaiza, Síndicos Primero y Segundo respectivamente, Hernan Archila Morales, Erasmo Belteton Contreras, Nery Rolando Archila Orellana, Julio Mauricio Marroquín González, Fryda Aimée Estrada Ortiz, Concejales primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, Licda. Evelyn Yaneth Oajaca Marroquín, Secretaria Municipal.

DADO EN EL PALACIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE GUASTATOYA, DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, A DOS DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO.

SECRETARIA

LICDA. EVELYN YANETH OAJACA MARROQUÍN
SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE
GUASTATOYA
¡Sirviendo!

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRAS NUMERO VEINTIDOS GUION DOS MIL VEINTICUATRO (22-2024), CELEBRADO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, EL PROGRESO Y LA EMPRESA DENOMINADA "CONSTRUCTORA LA UNION", PARA LA EJECUCION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL LOTIFICACION LO DE RODAS, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO".

En el Municipio de Guastatoya departamento de El Progreso, el veintisiete de noviembre de dos mil veinticuatro (27/11/2024), **NOSOTROS:** Por una parte, el Señor **JOSÉ ELÍAS HERRERA GUERRA**, de cincuenta y un (51) años de edad, casado, guatemalteco, comerciante, de este domicilio, me identifico con el Documento Personal de Identificación (DPI) con el código único de identificación (CUI) numero dos mil doscientos veinticinco, cincuenta y seis mil ochocientos cuarenta y seis, cero doscientos uno (2225 56846 0201) emitido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala, Centroamérica, actúo en calidad de **ALCALDE MUNICIPAL** de la **MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA**, calidad que acredita con la siguiente documentación a) certificación de Acta de Toma de Posesión número cuatro guion dos mil veinticuatro (4-2024) de fecha quince de enero de dos mil veinticuatro, del libro sesiones públicas ordinarias Registro número tres mil trescientos cincuenta y tres (3,353) debidamente autorizado por la Contraloría General de Cuentas, certificada por la Secretaría Municipal de Guastatoya, b) Acuerdo número 003-2023 extendido por la Junta Electoral departamental de El Progreso, con fecha trece de agosto de dos mil veintitrés, c) número de **CUENTADANCIA dos mil veintidós guion doscientos guion doscientos uno guion veintidós guion cero cero uno (2022-200-201-22-001)**; a mi representada en el curso del presente instrumento se le denominará **"LA MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA ó LA MUNICIPALIDAD"**; y por la otra parte, el señor **GERZON ALFONZO JUÁREZ CALDERÓN** de cuarenta y cuatro (44) años de edad, soltero, guatemalteco, Constructor, con dirección comercial en Kilometro 72.5 Ruta al Atlántico, Aldea Casas Viejas, Guastatoya, El Progreso, quien se identifica con Documento Personal de Identificación -DPI- con Código Único de Identificación dos mil quinientos cuarenta y cinco espacio cuarenta y cuatro mil setecientos cuarenta y seis espacio cero ciento uno (2545 44746 0101), extendido por el Registro Nacional de las personas de la República de Guatemala, Centroamérica, actúa en su calidad de Propietario y Representante Legal de la empresa denominada **"CONSTRUCTORA LA UNION",** que acredita con la Patente de Comercio de Empresa Mercantil, inscrita en el Registro Mercantil de la República de Guatemala, bajo el número de registro setecientos

CONSTRUCTORA LA UNION
TEL. 3091-9731
KM. 72.5 RUTA AL ATLANTICO
ALDEA CASAS VIEJAS
GUASTATOYA, EL PROGRESO

veinticuatro mil quinientos cuarenta y dos (724542), folio setecientos setenta y cuatro (774) del libro seiscientos ochenta y seis (686), de empresas mercantiles, con número de expediente cuarenta mil doscientos sesenta guion dos mil dieciséis (40260-2016), de Categoría Única. Señalo como lugar para recibir notificaciones y emplazamientos en Kilometro 72.5 Ruta al Atlántico, Aldea Casas Viejas, Guastatoya, El Progreso; **EL CONTRATISTA**: es la Empresa Mercantil Denominada "**CONSTRUCTORA LA UNION**", quién ejecutara la obra física objeto del presente contrato; **EL SUPERVISOR**, es la persona asignada por **LA MUNICIPALIDAD** para verificar los aspectos técnicos de la ejecución del proyecto; la institución que expida las fianzas o garantías será **LA AFIANZADORA**. Por lo tanto, en las calidades con que actuamos, celebramos **"CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA"**, para la ejecución del proyecto denominado "**MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL LOTIFICACION LO DE RODAS, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO**", de conformidad con las siguientes cláusulas. **PRIMERA:** El presente contrato se suscribe con fundamento en la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Número cincuenta y siete guion noventa y dos (57-92) del Congreso de la República, y sus reformas Decreto Número nueve guion dos mil quince (9-2015), Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Acuerdo Gubernativo número ciento veintidós guion dos mil dieciséis (122-2016); Artículo cincuenta y tres (53) inciso l), Decreto doce guión dos mil dos (12- 2002) Código Municipal, y demás leyes aplicables. **SEGUNDA: DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DEL CONTRATO:** Forman parte del presente contrato, los siguientes documentos: 1) Bases de Cotización, 2) Especificaciones Generales, 3) Especificaciones Técnicas, 4) Disposiciones Especiales, 5) Planos; 6) El detalle del concurso identificado con el Número de Operación GUATECOMPRAS (NOG) **VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE (24619787)** publicado en el Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado GUATECOMPRAS, mediante el cual **LA MUNICIPALIDAD**, invitó a las Entidades interesadas en ofertar la Ejecución del Proyecto objeto del presente contrato; 7) Oferta económica presentada por **EL CONTRATISTA**; 8) Acta número dieciocho guion dos mil veinticuatro (18-2024) del libro número de Registro tres mil noventa (3090) de Actas de Adjudicación de la Municipalidad de Guastatoya, El Progreso, que contiene la Calificación y Adjudicación de oferta del proyecto en referencia; documentos que regirán supletoriamente en todo lo que no esté previsto específicamente en este instrumento, pero en caso de discrepancia entre los documentos relacionados y el contrato, prevalecerá este último. **TERCERA: OBJETO DEL CONTRATO:** Manifiesta el señor

CONSTRUCTORA LA UNION
TEL. 3091-9731
KM. 72.5 RUTA AL ATLANTICO
ALDEA CASAS VIEJAS
GUASTATOYA, EL PROGRESO

GERZON ALFONZO JUÁREZ CALDERÓN que por este instrumento acepta la obligación de que la empresa que representa, cumpla con los renglones de trabajo, de la forma siguiente:

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1.00	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
1.01	REPLANTEO TOPOGRAFICO	31.50	ML	Q 90.50	Q 2,850.75
1.02	EXCAVACIONES	100.00	M3	Q 299.75	Q 29,975.00
1.03	RETIRO DE ESTRUCTURAS EXISTENTES	3.00	UNIDAD	Q 1,875.00	Q 5,625.00
2.00	**CAMBIO TUBERIA DE DRENAJE PLUVIAL**				
2.01	INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA DE 36"	31.50	ML	Q 5,184.00	Q 163,296.00
2.02	CONSTRUCCION CAJA RECEPTORA Y CAJA TIPO BUZON	2.00	UNIDAD	Q 13,584.00	Q 27,168.00
3.00	**RELLENO**				
3.01	CONFORMACION DE RELLENO CONTROLADO CON MATERIAL CLASIFICADO (MAXIMO CAPAS T=0.10)	90.00	M3	Q 449.75	Q 40,477.50
4.00	**REPOSICION CARPETA DE RODADURA EXISTENTE (ADOQUIN)**				
4.01	REPOSICION DE ADOQUIN	30.00	UNIDAD	Q 377.00	Q 11,310.00
5.00	**ADOQUINADO CARPETA NUEVA**				
5.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE ADOQUIN TIPO CRUZ (INCLUE BORDILLO)	191.00	M2	Q 450.25	Q 85,997.75
	TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS QUETZALES EXACTOS				**Q 366,700.00**

CONSTRUCTORA LA UNION
TEL. 3091-9731
KM. 72.5 RUTA AL ATLANTICO
ALDEA CASAS VIEJAS
GUASTATOYA, EL PROGRESO

CUARTA: VALOR DEL CONTRATO, FORMA DE PAGO Y FONDOS A LOS CUALES SE IMPUTARÁ EL GASTO. A) VALOR DEL CONTRATO: El valor por el cual **EL CONTRATISTA** ejecutará la obra objeto del presente contrato, es de **TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q. 366,700.00)**, según adjudicación otorgada a la Empresa Mercantil Denominada **"CONSTRUCTORA LA UNION". B) FORMA DE PAGO:** El precio del referido contrato

será pagado a **EL CONTRATISTA** de la siguiente forma: 1) un primer desembolso, en concepto de anticipo equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, cuando **EL CONTRATISTA** entregue a entera satisfacción de **LA MUNICIPALIDAD** los siguientes documentos: **a)** Pólizas de la fianza de anticipo y cumplimiento que más adelante se indica. **b)** Cronograma de inversión de anticipo autorizado por **LA MUNICIPALIDAD, c)** Solicitud de anticipo firmado por el Representante de la Empresa. **2)** Los demás pagos serán cancelados previo informe de **EL SUPERVISOR**, mediante el cual haga constar que es procedente de conformidad con el avance físico (estimaciones) de la ejecución del proyecto, dichos informes servirán de base para estos pagos, y **3)** Un pago final cuando **LA MUNICIPALIDAD** reciba la copia del acta de recepción de la ejecución del proyecto objeto del presente contrato e informe favorable de **EL SUPERVISOR**, con la aprobación de su jefe inmediato superior, en la que especifique que **EL CONTRATISTA** cumplió con todas sus obligaciones contractuales. Así mismo para efectuar cada uno de los referidos pagos, será necesario que **EL CONTRATISTA** entregue la factura contable respectiva, que incluya el Impuesto al Valor Agregado –IVA-. Los pagos los efectuará **LA MUNICIPALIDAD** en su oficina cuya dirección declara conocer **EL CONTRATISTA** en quetzales, moneda de curso legal en Guatemala. **C) DEL FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO:** El costo de la obra cofinanciado de la siguiente forma de conformidad al Acuerdo de Aporte Definitivos contenido en el **ACUERDO 117-2024** de fecha veintidós de noviembre de dos mil veinticuatro del libro número 3211 de la Alcaldía Municipal, aprobado por la Autoridad Administrativa Superior: **1) LA MUNICIPALIDAD** con un monto de **TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q. 366,700.00)**, de conformidad con la estructura presupuestaria **12 02 003 000 005**, RENGLON **331**, FUENTE DE FINANCIAMIENTO **21 0101 0001**, estructura presupuestaria **12 02 003 000 005**, RENGLON **331**, FUENTE DE FINANCIAMIENTO **29 0101 0002,** estructura presupuestaria **12 02 003 000 005**, RENGLON **331**, FUENTE DE FINANCIAMIENTO **29 0101 0003,** corresponde al valor del cien por ciento (100%) de la obra **QUINTA: PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: a) EL CONTRATISTA** se obliga a ejecutar el objeto del presente contrato a entera satisfacción de **LA MUNICIPALIDAD**, dentro de un plazo de **CINCO (05) MESES CALENDARIO**, contados a partir de la suscripción del acta de inicio de obras que deberá suscribir la Dirección Municipal de Planificación de **LA MUNICIPALIDAD**, quedando entendido que en el plazo al que se alude en esta cláusula incluye días inhábiles. El plazo contractual entra en vigencia cuando **LA MUNICIPALIDAD** suscriba el acta de inicio con **EL CONTRATISTA** y deberá concluir el proyecto dentro del plazo estipulado, quedando expresamente establecido que **LA MUNICIPALIDAD** no reconocerá ninguna prórroga

CONSTRUCTORA LA UNION
TEL. 3091-9731
KM. 72.5 RUTA AL ATLANTICO
ALDEA CASAS VIEJAS
GUASTATOYA, EL PROGRESO

del plazo para entrega y terminación del objeto del presente instrumento, salvo que este plazo se ampliara por caso fortuito, fuerza mayor o por causas imputables a **LA MUNICIPALIDAD**. **SEXTA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: a)** Ejecutar el proyecto a entera satisfacción de **LA MUNICIPALIDAD**, ajustándose estrictamente a este contrato y a los documentos que forman parte del mismo. A este respecto **EL CONTRATISTA** declara que ha estudiado cuidadosamente dichos documentos y se compromete a señalar cualquier error, omisión, contradicción, o incongruencia que a su juicio pudiesen presentar, debiendo en tal caso efectuar consultas y hacer las observaciones pertinentes antes de efectuar el trabajo que pudiese resultar afectado; **b)** Aceptar la supervisión del proyecto convenido por personal designado por **LA MUNICIPALIDAD**, quien tendrá carácter de autoridad ante **EL CONTRATISTA; c)** Acatar instrucciones, indicaciones y recomendaciones que le formule por escrito **EL SUPERVISOR**, quien tiene la obligación de rechazar los trabajos que no se ajusten a las especificaciones convenidas y ordenar la paralización del proyecto cuando existan causas que justifiquen esta medida; **d)** A ejecutar el proyecto en **LOTIFICACION LO DE RODAS, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO**, el cual ya es conocido por **EL CONTRATISTA** en su localización; **e)** A contratar la mano de obra necesaria y suficiente para la realización del proyecto, cuyo personal depende directamente de ella; **f)** No subcontratar total o parcialmente el proyecto sin autorización expresa y por escrito de **LA MUNICIPALIDAD**; **g)** A comprar los materiales que sean necesarios por su cuenta y ponerlos en el lugar en donde se ejecutan los trabajos; **h)** Aportar todo el equipo, maquinaria, herramientas, materiales, mano de obra y personal técnico, aunque no estén previstos en las bases y especificaciones técnicas, que sean necesarios, los que incluyen cualquier equipo de seguridad vial. Así como toda obra temporal que se necesite, siendo a su cargo todos los gastos en que incurra, eximiendo a **LA MUNICIPALIDAD**, de cualquier responsabilidad, ya sea civil, penal o laboral; **i)** Presentar ante **LA MUNICIPALIDAD** el libro de bitácora para el referido proyecto, en aras de que **LA MUNICIPALIDAD** gestione su autorización, en dicho libro **EL SUPERVISOR**, como una de sus funciones, anotará las observaciones referentes proceso de ejecución del proyecto. El libro de bitácora electrónica servirá de base para resolver controversias que pudiesen surgir en el proceso de ejecución de la misma; **j)** El contratista queda obligado a que, al momento de gestionar el pago de alguna estimación, presentará juego de fotografías impresas que comprueben el avance físico del proyecto. **k)** A mantener permanentemente un delegado responsable de la dirección técnica del proyecto, quien deberá permanecer en horas laborales en el lugar en donde se ejecutarán los trabajos; **l)** Toda unidad de producto defectuosa, ya sea por la calidad del material empleado o la mano de obra, según lo establezcan las especificaciones técnicas de

CONSTRUCTORA LA UNION
TEL. 3091-9731
KM. 72.5 RUTA AL ATLANTICO
ALDEA CASAS VIEJAS
GUASTATOYA, EL PROGRESO

este contrato, deberá ser corregido, reemplazado o construido de nuevo por **EL CONTRATISTA**, sin compensación alguna y a su costo, dentro del plazo contractual. Así mismo los materiales defectuosos o rechazados por **LA MUNICIPALIDAD** deberán ser retirados del lugar de ejecución del proyecto por cuenta y cargo de **EL CONTRATISTA** inmediatamente y sin necesidad de requerimiento alguno; **m)** Los salarios que **EL CONTRATISTA** debe pagar a sus trabajadores no serán inferiores a los fijados por las leyes laborales vigentes en la República de Guatemala y empleara el número de trabajadores guatemaltecos y extranjeros, en los porcentajes que establece el Código de Trabajo; **n)** Los profesionales técnicos, especialistas o cualquier otro recurso humano nacional o extranjero que empleare **EL CONTRATISTA** en la realización de los trabajos lo hará bajo su estricta responsabilidad, por lo que **LA MUNICIPALIDAD** no tendrá con dichos profesionales, técnicos, especialistas y personal, ninguna relación laboral, civil, ni de cualquier otra naturaleza; y en consecuencia **EL CONTRATISTA** por su cuenta y bajo su responsabilidad pagará honorarios, sueldos y salarios, planillas de mano de obra y cuotas de seguridad social y demás erogaciones que le impongan las leyes vigentes en materia laboral y asumirá la calidad de patrono, eximiendo en forma expresa a **LA MUNICIPALIDAD** de cualquier responsabilidad por tal concepto**; ñ)** Promover o concurrir a las reuniones de trabajo que fuere citado y cumplir con las instrucciones y recomendaciones formuladas por la supervisión de **LA MUNICIPALIDAD**; **o)** Participar en la recepción de los trabajos del proyecto y en la liquidación del contrato, debiendo cumplir con las recomendaciones emitidas por la Comisión Receptora y Liquidadora, **p) EL CONTRATISTA** es el responsable y el obligado a resarcir los daños o molestias que haya causado a los bienes o servicios tanto de los vecinos donde se ejecuta la obra como a la Municipalidad a efecto de evitar inconformidades entre los miembros de la comunidad, para ello **LA MUNICIPALIDAD** no realizara ninguna erogación de presupuesto o responsabilidad para la reparación de los daños ocasionados. **SÉPTIMA: GARANTÍAS:** Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el presente contrato **EL CONTRATISTA** deberá otorgar a favor y entera satisfacción de **LA MUNICIPALIDAD** en una institución Afianzadora, debidamente autorizada para operar en Guatemala y de reconocida capacidad y solvencia financiera, las siguientes fianzas: **A) FIANZA DE ANTICIPO: EL CONTRATISTA** a su costa deberá constituir a favor de **LA MUNICIPALIDAD**, previo a recibir el anticipo, una fianza por el cien por ciento (100%), del monto total del valor del anticipo a que se ha hecho referencia en la cláusula cuarta de este contrato, que garantice su adecuada y oportuna inversión en la ejecución de la obra y estará vigente hasta su total amortización, lo cual debe darse antes de la finalización de la obra. **Si EL CONTRATISTA** no inicia la obra a partir del décimo día

CONSTRUCTORA LA UNION
TEL. 3091-9731
KM. 72.5 RUTA AL ATLANTICO
ALDEA CASAS VIEJAS
GUASTATOYA, EL PROGRESO

siguiente a la fecha en que reciba el primer desembolso o no lo invierte de acuerdo con el cronograma de inversión, deberá reintegrarlo inmediatamente a **LA MUNICIPALIDAD**, quien ejecutará la fianza respectiva, sin perjuicio de otras acciones; **B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO: EL CONTRATISTA:** deberá constituir a favor de **LA MUNICIPALIDAD** una fianza que garantice el cumplimiento de todas las obligaciones que adquiere por este instrumento, la cual deberá cubrir el diez por ciento (10%) del monto total del contrato, indicado en la cláusula cuarta, cuya póliza deberá entregar a **LA MUNICIPALIDAD** previo a efectuarse el primer desembolso, la que deberá permanecer vigente hasta que **LA MUNICIPALIDAD** compruebe que todas las obligaciones contractuales han sido cumplidas. Esta garantía cubrirá el cumplimiento del contrato de acuerdo con los documentos contractuales, así como la ejecución del proyecto en el tiempo y calidad estipulada. **LA MUNICIPALIDAD** ejecutará la fianza de cumplimiento en cualesquiera de los casos siguientes: **1)** En caso de evidente negligencia de **EL CONTRATISTA** en la ejecución del presente contrato, debido a la insuficiencia de maquinaria, insolvencia económica o cualquier otra causa debidamente comprobada e imputable a **EL CONTRATISTA**, que le impida cumplir con el objeto del presente contrato, la negligencia se comprobará con los dictámenes o informes de **EL SUPERVISOR** de **LA MUNICIPALIDAD**; **2)** Si cometiese actos dolosos o culposos en perjuicio de la ejecución del objeto contratado, a juicio y calificación de **LA MUNICIPALIDAD**; **3)** Si deja **EL CONTRATISTA** de cumplir con cualesquiera de las obligaciones que le impone el presente contrato; **4)** Si no efectúa a **LA MUNICIPALIDAD** el pago de la sanciones que conforme a este contrato le fueren impuestas; **C) FIANZA DE CONSERVACIÓN DE LA OBRA:** De conformidad con el artículo sesenta y siete (67) de la Ley de Contrataciones del Estado ésta cubrirá el quince por ciento (15%) del valor original del contrato y deberá ser constituida mediante fianza cuya póliza será entregada a **LA MUNICIPALIDAD** como requisito previo para la recepción de la obra. Estará vigente durante el período de dieciocho (18) meses contados a partir de la fecha de recepción de la obra y cubrirá el valor de las reparaciones de las faltas o desperfectos que le sean imputables a **EL CONTRATISTA; LA MUNICIPALIDAD** al verificar las faltas y/o desperfectos que resultasen en el proyecto por causas imputables a **EL CONTRATISTA**, lo hará de su conocimiento fijando un plazo para iniciar y terminar los trabajos de reparación que fueren necesarios y si **EL CONTRATISTA** no diese inicio a los trabajos dentro del plazo que se le fije, **LA MUNICIPALIDAD** sin más trámite ordenará su ejecución, ya sea con su personal, el de **EL CONTRATISTA**, o de terceros, cargando los gastos a la fianza de conservación de obra. **D) FIANZA DE SALDOS DEUDORES**: Esta fianza garantizará el pago de cualquier saldo que pudiere resultar a favor de **LA MUNICIPALIDAD** o de terceros, por el cinco por ciento (5%)

CONSTRUCTORA LA UNION
TEL. 3091-9731
KM. 72.5 RUTA AL ATLANTICO
ALDEA CASAS VIEJAS
GUASTATOYA, EL PROGRESO

del valor original del presente contrato. Esta garantía deberá otorgarse simultáneamente con la conservación de la obra, como requisito previo para la recepción de la obra. Aprobada la liquidación, si no hubiere saldos deudores, se cancelará esta garantía. **E) EJECUCIÓN DE LAS FIANZAS: LA MUNICIPALIDAD** ejecutará las fianzas a que se refiere la presente cláusula con base en el informe que rinda **EL SUPERVISOR**, documento que **EL CONTRATISTA** acepta como suficiente para que la afianzadora haga efectiva la fianza que corresponda. De dicho informe **LA MUNICIPALIDAD** dará audiencia a **LA AFIANZADORA** y a **AL CONTRATISTA** por el plazo de diez (10) días, para que acompañando las pruebas y documentación necesaria expresen lo que estimen pertinente, **LA MUNICIPALIDAD** si fuere procedente, ordenará sin más trámite el requerimiento y **LA AFIANZADORA** deberá efectuar el pago dentro del plazo de diez (10) días contados a partir de la fecha en que se ordenó el requerimiento. **LA AFIANZADORA** deberá hacer constar en la póliza que emita, que acepta las condiciones de esta cláusula. **OCTAVA: SUPERVISIÓN DEL PROYECTO, RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN y FINIQUITO DEL CONTRATO: A) SUPERVISIÓN: EL CONTRATISTA** deberá permitir en cualquier momento que las personas autorizadas por **LA MUNICIPALIDAD** inspeccionen las actividades y trabajos que se relacionen en el proyecto, e instruirá a su personal para que atienda a dichas personas proporcionándoles la información que requieran. **B) RECEPCIÓN**: Cuando el proyecto esté terminado, **EL CONTRATISTA** deberá presentarla garantía de conservación de la obra y de saldos deudores y deberá dar aviso por escrito a **EL SUPERVISOR** que designe **LA MUNICIPALIDAD**, de la conclusión de los trabajos y con esta diligencia se interrumpirá el plazo de ejecución garantía de conservación de obra y deberá dar aviso por escrito a **EL SUPERVISOR** que designe **LA MUNICIPALIDAD**, de la terminación de la ejecución del presente contrato y con esta diligencia se interrumpirá el plazo de ejecución del mismo. **EL SUPERVISOR** que designe **LA MUNICIPALIDAD** hará la inspección final dentro de los quince (15) días hábiles siguientes de haber recibido el aviso de **EL CONTRATISTA**, plazo dentro del cual, si la obra está de acuerdo a las especificaciones, manifestará por escrito sus observaciones a **EL CONTRATISTA**, para que proceda a corregir las deficiencias y si todo estuviere correctamente concluidos, **EL SUPERVISOR** rendirá un informe pormenorizado a **LA MUNICIPALIDAD**, quien dentro de los cinco (5) días siguientes, nombrará a **LA COMISIÓN RECEPTORA y LIQUIDADORA** de la obra, integrada por tres (3) miembros. **LA COMISIÓN RECEPTORA y LIQUIDADORA** deberá elaborar el acta de recepción definitiva dentro de los treinta y cinco (35) días siguientes a la fecha de notificación del nombramiento. Si, **LA COMISIÓN RECEPTORA y LIQUIDADORA** comprueba que el objeto de este contrato está ejecutado satisfactoriamente suscribirá el acta de recepción respectiva, en caso contrario se

CONSTRUCTORA LA UNION
TEL. 3091-9731
KM. 72.5 RUTA AL ATLANTICO
ALDEA CASAS VIEJAS
GUASTATOYA, EL PROGRESO

hará constar en acta: **a)** El tiempo a emplearse; **b)** Si el tiempo necesario para ejecutar satisfactoriamente los requerimientos indicados, forma parte del plazo contractual o si procede conceder tiempo adicional para su realización. Al recibirse aviso por escrito de **EL CONTRATISTA**, de encontrarse satisfechos los requerimientos de **LA COMISIÓN RECEPTORA y LIQUIDADORA**, ésta dentro del plazo de cinco (5) días, procederá a efectuar una nueva inspección suscribiendo el acta correspondiente. La fecha de la recepción definitiva de la obra será la de cierre de la última acta. **C) LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO:** Después que la obra objeto del presente contrato haya sido recibida **LA COMISIÓN RECEPTORA y LIQUIDADORA**, en un plazo de noventa (90) días procederá a efectuar la liquidación del contrato y a establecer el importe de los pagos o cobros que deban hacerse a **EL CONTRATISTA**. Igual procedimiento se observará en caso de rescisión del contrato. **NOVENA: FLUCTUACIONES DE PRECIOS. LA MUNICIPALIDAD** no pagará, ni reconocerá o deducirá a **EL CONTRATISTA**, el monto de fluctuaciones de precios sobre los que figuren el presupuesto o renglones presentados por el proveedor incorporando al presente contrato, basado en los artículos 7 y 61 de la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala. **DÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA: YO EL CONTRATISTA,** declaro bajo juramento y enterado de las penas relativas al delito de perjurio, reguladas en la Ley específica de la materia, que personalmente no me encuentro comprendido entre las prohibiciones contenidas en el artículo ochenta (80) de la Ley de Contrataciones del Estado, ni tampoco de la empresa mercantil que represento. **DÉCIMA PRIMERA: SANCIONES**: En caso de que **EL CONTRATISTA** por causas que le sean imputables, no cumpla con entregar los trabajos contratados dentro del plazo estipulado, será sancionada por **LA MUNICIPALIDAD** con el pago de una multa del uno por ciento (1%) al cinco por ciento (5%) por millar del valor total del contrato, que no se haya ejecutado oportunamente, calculado a partir de las fechas pactadas de la entrega parcial o total con respecto a la ejecución convenida con la entidad contratante; dicha multa solamente se tomara de la parte proporcional del atraso, sin afectar el cumplimiento parcial, considerando lo establecido en el artículo 62 BIS, (según reformas emitidas mediante el Acuerdo Gubernativo NO. 172-2017. Presidente de la Republica Artículo 29. Se adiciona el artículo 62 BIS en relación al Artículo 85 de la Ley) del Acuerdo Gubernativo Numero 122-2016, Presidente de la República, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Si **EL CONTRATISTA** contraviene total o parcialmente las especificaciones del contrato en perjuicio de **LA MUNICIPALIDAD**, variando la calidad, cantidad, omitiendo bienes, materiales o mezclas de éstos, será sancionada con una multa del cien por ciento (100%) del valor que represente la parte afectada de la negociación. **DECIMA SEGUNDA: CASO**

CONSTRUCTORA LA UNION
TEL. 3091-9731
KM. 72.5 RUTA AL ATLANTICO
ALDEA CASAS VIEJAS
GUASTATOYA, EL PROGRESO

FORTUITO O DE FUERZA MAYOR: Únicamente se autorizará prorroga de plazo y suspensión de la obra por causa de caso fortuito o de fuerza mayor o por cualquier otra causa no imputable a **EL CONTRATISTA**. Cuando por caso fortuito o de fuerza mayor o por cualquier otra causa no imputable a **EL CONTRATISTA** se solicitare prórroga del plazo, **EL CONTRATISTA** dentro del plazo de quince (15) días de ocurrido el hecho, notificará a **EL SUPERVISOR**, indicando las implicaciones en la ejecución de los trabajos para una vez verificados los hechos, informando a su Jefe inmediato y éste a su vez solicitará a la Autoridad Administrativa Superior aprobará la suspensión o prórroga. Desaparecidas las causas que motivaron a **EL CONTRATISTA** a solicitar la suspensión, esta lo hará del conocimiento por escrito a **EL SUPERVISOR**, para que lo informe a su jefe inmediato superior y éste a su vez solicitar la autorización ante la Autoridad Administrativa Superior, para la finalización de la suspensión y/o la prórroga a que tiene derecho **EL CONTRATISTA**. Los hechos que ocurran considerados como causa de caso fortuito o de fuerza mayor, que impidan el cumplimiento del contrato, relevan a las partes de responsabilidad, debiendo producirse la inmediata comunicación por escrito en que se pruebe el hecho ocurrido, el cual será verificado por **EL SUPERVISOR**, dejando constancia en acta. **LA MUNICIPALIDAD** no cubrirá indemnizaciones que provengan de casos fortuitos o de fuerza mayor. Si por causa de caso fortuito o de fuerza mayor se paraliza la ejecución de los trabajos por más de un (1) mes **LA MUNICIPALIDAD** podrá dar por terminado el contrato unilateralmente sin responsabilidad de su parte, quedando facultado para terminar la contratación de los trabajos con otra empresa.

CONSTRUCTORA LA UNION
TEL. 3091-9731
KM. 72.5 RUTA AL ATLANTICO
ALDEA CASAS VIEJAS
GUASTATOYA, EL PROGRESO

DECIMA TERCERA: DE LA RESCISIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO: LA MUNICIPALIDAD puede dar por terminado el presente contrato, así como dar por terminado el derecho de **EL CONTRATISTA** para iniciar o proseguir la ejecución del proyecto contratado, en forma unilateral sin necesidad de declaración judicial alguna y sin ninguna responsabilidad de su parte, cuando ocurran cualesquiera de las circunstancias siguientes: **a)** Por decisión de las partes; **b)** Por causa de fuerza mayor o caso fortuito, quedando entendido que son eventos fuera del control de la voluntad de las partes, tales como incendios, fenómenos telúricos, epidemias y otros análogo; **c)** Por decisión unilateral de **LA MUNICIPALIDAD** sin responsabilidad de su parte, por los motivos siguientes: **1)** Si, **EL CONTRATISTA** no presenta la fianza de cumplimiento; **2)** Si, **EL CONTRATISTA** cometiere actos dolosos o culposos en contra de **LA MUNICIPALIDAD; 3)** Si, **EL CONTRATISTA** dejare de cumplir o proseguir con cualquiera de su obligaciones del presente contrato; **d)** Por convenir a los intereses de **LA MUNICIPALIDAD**. En todo caso **LA MUNICIPALIDAD** podrá desde el momento de la declaratoria de terminación o rescisión de este contrato, contratar a otra empresa para que concluya la entrega

que quedó inconclusa, independientemente de que el presente contrato quede parcialmente vigente para su liquidación y/ o cobro de fianzas. **DECIMA CUARTA: PROHIBICIONES:** Le queda prohibido a **EL CONTRATISTA** ceder, transferir, enajenar o negociar total o parcialmente, en cualquier forma los derechos y obligaciones objeto de este contrato, sin la previa autorización por escrito de **LA MUNICIPALIDAD**, así como proporcionar información a terceros sobre los asuntos que son de su conocimiento, como consecuencia del proyecto que ejecuta. **DÉCIMA QUINTA: CONTROVERSIAS: a)** Los otorgantes convienen expresamente en que cualesquiera diferencias o reclamos que surgieren entre las partes derivadas de este contrato, serán resueltas directamente por **LA MUNICIPALIDAD** y **EL CONTRATISTA** con carácter conciliatorio, pero si no fuere posible llegar a un acuerdo, la cuestión o cuestiones a dilucidarse se resolverán conforme a la Ley de lo Contencioso Administrativo; **b)** Los comparecientes expresamos que nos sometemos a las leyes de la República de Guatemala y para ese efecto **EL CONTRATISTA** renuncia al fuero de su domicilio y se somete a los Tribunales que **LA MUNICIPALIDAD** elija y señala como lugar para recibir notificaciones la dirección indicada en la introducción del presente documento, en donde se tendrán por bien hechas, mientras no sea señalado otro por escrito y haya sido notificado a **LA MUNICIPALIDAD**; **c)** En caso de reintegros de saldos o devolución de dinero que deba hacer **EL CONTRATISTA** a **LA MUNICIPALIDAD**, podrá recurrir a la **CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS DE LA NACIÓN**, para plantear la obligación de devolución del recurso, debiendo para el efecto, formar el expediente respectivo; todo lo anterior, sin perjuicio de las otras acciones que por su naturaleza así lo ameriten, aceptando expresamente las partes que el presente contrato adquiere la calidad de título ejecutivo. **DÉCIMA SEXTA: DECLARACIÓN RELATIVA AL COHECHO: YO EL CONTRATISTA**, manifiesto que conozco las penas relativas al delito de cohecho así como las disposiciones contenidas en el Capítulo III del Título XIII del Decreto 17-73 del Congreso de la República, Código Penal. Adicionalmente, conozco las normas jurídicas que facultan a la autoridad superior de la entidad afectada para aplicar las sanciones administrativas que pudieren corresponderme, incluyendo la inhabilitación en el sistema GUATECOMPRAS. **DÉCIMA SÉPTIMA: DEL ANALISIS DE GESTION DE RIESGO PARA PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA –AGRIP-,** De conformidad con lo establecido en el artículo tres (3) del punto Resolutivo número cero cuatro guion dos mil dieciséis (04-2016) emitido el trece de mayo de dos mil dieciséis, por el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural, **EL CONTRATISTA** tiene la obligación de incluir en la ejecución de la obra las medidas de mitigación o reducción de riesgo a desastre, que se consignaron en la herramienta "Análisis de Gestión de Riesgo para Proyectos de Inversión Pública" –

CONSTRUCTORA LA UNION
TEL. 3091-9731
KM. 72.5 RUTA AL ATLANTICO
ALDEA CASAS VIEJAS
GUASTATOYA, EL PROGRESO

AGRIP-. **DÉCIMA OCTAVA: IMPUESTOS Y RETENCIONES**: Queda entendido que cada pago que se le haga a **EL CONTRATISTA** estará afecto al pago de las obligaciones fiscales y tributarias que regulen las leyes vigentes del país. Asimismo, está obligado al pago del timbre profesional correspondiente por el monto total de este contrato, lo cual hará adhiriendo los timbres en las facturas correspondientes. Lo aquí estipulado, no excluye a **EL CONTRATISTA** de cualquier otro pago de carácter tributario que surja en el futuro de conformidad con las leyes de la República de Guatemala. **DÉCIMA NOVENA: INTERESES MORATORIOS**: Las partes expresamente convenimos en que en el presente contrato no se cobrarán ni pagarán intereses por atraso en el pago de las estimaciones a que se refiere el artículo sesenta y tres (63) del Decreto número cincuenta y siete guión noventa y dos (57-92) del Congreso de la República que contiene la Ley de Contrataciones del Estado. **VIGÉSIMA: APROBACIÓN DEL CONTRATO**: Para que el presente contrato surta efectos legales y obligue a las partes, deberá ser aprobado de conformidad con lo que determina el artículo cuarenta y ocho (48) de la Ley de Contrataciones del Estado (Decreto Número 57-92) y Artículo cuarenta y dos (42) de su Reglamento (Acuerdo Gubernativo Número 122-2016). **VIGÉSIMA PRIMERA: LECTURA Y ACEPTACIÓN**: Los otorgantes en forma expresa hacemos constar que hemos leído lo escrito y enterados de su contenido, objeto, validez y demás efectos legales, lo ratificamos, aceptamos, y firmamos en doce (12) hojas tamaño oficio de papel membretado de la Municipalidad de Guastatoya, El Progreso, impresas únicamente en su anverso.----------


ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA ¡Sirviendo!

JOSÉ ELÍAS HERRERA GUERRA
LA MUNICIPALIDAD

GERZON ALFONZO JUÁREZ CALDERÓN
EL CONTRATISTA

CONSTRUCTORA LA UNION
TEL. 3091-9731
KM. 72.5 RUTA AL ATLÁNTICO
ALDEA CASAS VIEJAS
GUASTATOYA, EL PROGRESO



En el municipio de Guastatoya, departamento de El Progreso, el veintisiete de noviembre de dos mil veinticuatro como **NOTARIO, DOY FE: a)** Que las firmas que **ANTECEDEN SON AUTÉNTICAS**, por haber sido puestas el día de hoy en mi presencia por los señores: **JOSÉ ELÍAS HERRERA GUERRA**, quien es persona de mi anterior conocimiento, y; por el señor **GERZON ALFONZO JUÁREZ CALDERÓN** de cuarenta y cuatro (44) años de edad, soltero, guatemalteco, Constructor, con dirección comercial en Kilometro 72.5 Ruta al Atlántico, Aldea Casas Viejas, Guastatoya, El Progreso, quien se identifica con Documento Personal de Identificación -DPI- con Código Único de Identificación dos mil quinientos cuarenta y cinco espacio cuarenta y cuatro mil setecientos cuarenta y seis espacio cero ciento uno (2545 44746 0101), extendido por el Registro Nacional de las personas de la República de Guatemala, Centroamérica, actúa en su calidad de Propietario y Representante Legal de la empresa denominada **"CONSTRUCTORA LA UNION",** que acredita con la Patente de Comercio de Empresa Mercantil, inscrita en el Registro Mercantil de la República de Guatemala, bajo el número de registro setecientos veinticuatro mil quinientos cuarenta y dos (724542), folio setecientos setenta y cuatro (774) del libro seiscientos ochenta y seis (686), de empresas mercantiles, con número de expediente cuarenta mil doscientos sesenta guion dos mil dieciséis (40260-2016), de Categoría Única; firmas que calzan el **"CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA"**, número veintidós guion dos mil veinticuatro de fecha veintisiete de noviembre de dos mil veinticuatro, contenido en doce hojas de papel bond, tamaño oficio con el respectivo membrete de la Municipalidad de Guastatoya, El Progreso, y que se refiere a la ejecución del proyecto **"MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL LOTIFICACION LO DE RODAS, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO"; b)** de haber tenido a la vista los documentos relacionados; **c)** de haber leído íntegramente a los comparecientes el contenido de la presente acta de legalización de firmas, quienes bien enterado de su contenido, valor, objeto y demás efectos legales, la ratifican, aceptan y vuelven a firmar juntamente con el Notario autorizante, que de todo lo relacionado DA FE, adhiriéndole los timbres de Ley.

Ante mí:

Lic. ROBERTO GALINDO CATALÁN
Abogado y Notario

Lic. ROBERTO GALINDO CATALÁN
Abogado y Notario

BP-0305780

Q 10.00 DIEZ QUETZALES
TIMBRE NOTARIAL

MUNICIPALIDAD DE
GUASTATOYA
¡Sirviendo!

5980-0535 | MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
BARRIO EL CALVARIO, **GUASTATOYA EL PROGRESO**

CDP No. 0312-2024

Señor:
Director Municipal de Planificación
Lic. Alexis Geovanny Marroquín Orellana

Distinguido Señor:

NOTA: Se emite la presente disponibilidad presupuestaria para su debido proceso.

CONSTANCIA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA CDP

MONTO RESERVADO VIGENTE (Q.)	**Q. 366,735.00**	**Ejercicio Fiscal: 2024**
MONTO EN LETRAS	Trescientos sesenta y seis mil setecientos treinta y cinco quetzales con 00/100.	

ENTIDAD:	Municipalidad de Guastatoya, El Progreso
UNIDAD EJECUTORA:	Director municipal de planificación
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA ADQUISICION DE:	**Ejecución del proyecto denominado MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL LOTIFICACION LO DE RODAS, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO.**
FECHA DE EMISION:	27 de noviembre de 2,024.
MODALIDAD DE COMPRA O CONTRATACION:	Licitación

PROGRAMACION **MONTO PROGRAMADOQ.**

STRUCTURA(S) PRESUPUESTARIA(S)						**FUENTE DE FINANCIAMIENTO**			**MONTO**
Prog	Sub.	Proy.	Act.	Obra	Reng.	Fuente	Org.	Esp.	
12	02	003	000	005	331	21	0101	0001	110,667.65
12	02	003	000	005	331	29	0101	0002	112,115.72
12	02	003	000	005	331	29	0101	0003	143,951.63
						TOTAL:			**366,735.00**

ENCARGADO DE PRESUPUESTO

Solicitado por:	**Lic. Alexis Geovanny Marroquín Orellana**	Aprobado por:	**Luis Felipe Gómez García**
Cargo:	**Director Municipal de Planificación**	Cargo:	**Encargado de Presupuesto**

MUNICIPALIDAD DE
GUASTATOYA
¡Sirviendo!

Información General de iniciativa de Inversión

0341742 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL LOTIFICACION LO DE RODAS, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO

SNIP - SEGEPLAN **Solicitud de Financiamiento, ejercicio 2,024**

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO:

1. Nombre del proyecto: Forma Capital Fijo

MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL LOTIFICACION LO DE RODAS, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO

2. Institución responsable: GOBIERNOS LOCALES

3. Unidad ejecutora responsable: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

Plan de desarrollo o agenda municipal

4. Modalidad de planificación : Plan de desarrollo o agenda municipal

4.1. Modalidad especifica:

Finalidad-Función-Division:

5. Función anterior:
AGUA Y SANEAMIENTO
Sub-función anterior :
AGUA Y SANEAMIENTO

6. [illegible]cación geográfica:

Departamento	Municipio
EL PROGRESO	GUASTATOYA

7. Área de influencia: Nacional

Responsable del proyecto:

Nombre: JOSE ELIAS HERRERA GUERRA
Cargo: ALCALDE MUNICIPAL
Teléfono: 59800535
Email: geovannymarroquin1@outlook.com

DIAGNÓSTICO:

I. Antecedentes:

En el Sector de la Colonia lo de Rodas, Barrio Minerva, Guastatoya, El Progreso, se requiere la ampliación del sistema de alcantarillado pluvial en la Colonia lo de Rodas, Barrio Minerva, Guastatoya, El Progreso. Actualmente, la comunidad cuenta con más de habitantes, de los cuales el 98¿s de origen ladino y el 2¢ndígenas.

[illegible]onsidera el crecimiento de la población, la urbanización de la zona, problemas actuales de inundaciones debido a la insuficiencia del sistema actual. Además, se consideran los aspectos legales y regulatorios, así como la disponibilidad de recursos financieros y técnicos para llevar a cabo la ampliación. Se toman en cuenta los esfuerzos de planificación y gestión comunitaria, así como la participación de los COCODES y otros actores locales en la identificación y priorización de esta necesidad de infraestructura.

. Problemática:

J. Justificación:

Es preocupante que los vecinos del Sector de la Colonia lo de Rodas, Barrio Minerva en Guastatoya tengan que habitar en sectores donde se acumule agua pluvial, que provoca serios problemas de contaminación. Esta situación representa un riesgo para la salud de la población y puede generar inconformidad en la comunidad. La implementación del proyecto de ampliación del sistema de alcantarillado pluvial en el Sector Colonia Hichos es crucial para mejorar la calidad de vida y garantizar un ambiente más saludable para todos los habitantes.

. Descripción:

EL PROYECTO CONSISTE BASICAMENTE EN 31 50 METROS LINEALES REPLANTEO TOPOGRAFICO 100 00 METROS CUBICOS EXCABACIONES 3 00 UNIDAD RETIRO DE ESTRUCTURAS EXISTENTES 31 50 METROS LINEALES

INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA DE 36 2 00 UNIDAD CONSTRUCCION CAJA RECEPTORA Y CAJA TIPO BUZON 90 00 METROS CUBICOS CONFORMACION DE RELLENO CONTROLADO CON MATERIAL CLASIFICADO maximo capas t 0 10 30 00 METROS CUADRADOS REPOSICION DE ADOQUIN 191 00 METROS CUADRADOS SUMINISTRO E INSTALACION DE ADOQUIN TIPO CRUZ incluye bordillo

12. Objetivos:

12.1 General:

Mejorar la infraestructura de drenaje pluvial del sector Colonia lo de Rodas, Barrio Minerva, Guastatoya, El Progreso para reducir o eliminar problemas de inundaciones, proteger la salud pública y el medio ambiente, y mejorar la calidad de vida de los habitantes afectados.

12.2 Específicos:


- Incrementar la capacidad de drenaje para gestionar de manera efectiva el aumento en el caudal de aguas pluviales debido al crecimiento urbano.
- Reducir el riesgo de inundaciones en el sector.
- Mejorar la calidad del agua al reducir la contaminación causada por aguas pluviales.
- Proteger la infraestructura existente y las propiedades privadas de daños causados por inundaciones.
- Mejorar la salud pública al reducir la presencia de aguas estancadas que pueden ser criaderos de mosquitos y otros vectores de enfermedades.
- Contribuir al desarrollo sostenible y mejorar la calidad de vida de los residentes.

13. Resultados esperados:

RESULTADOS DE LA FASE ACTUAL :

1. Fase actual: EJECUCION

2. Beneficiarios directos:

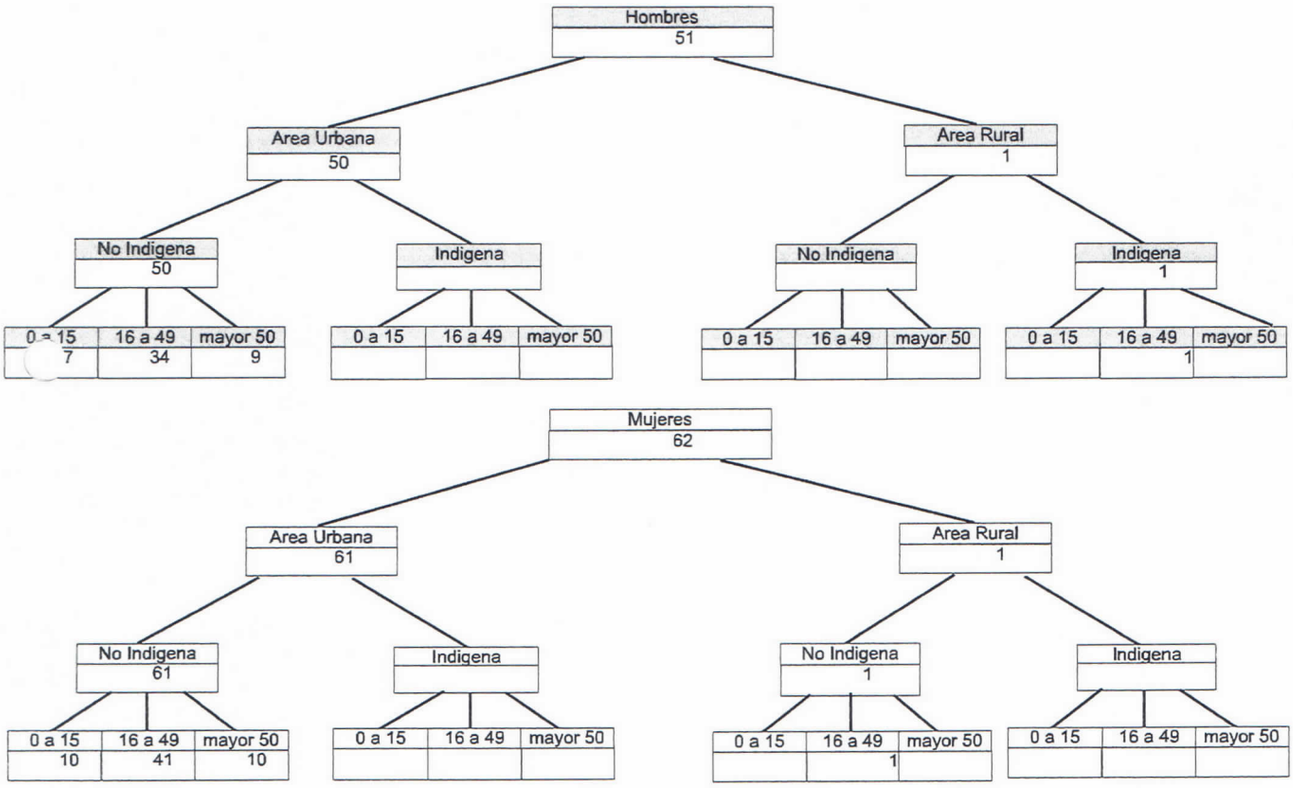

3. Costo/eficiencia:

4. TIR: %

5. VAN:

6. Empleo a requerir:

	Durante la ejecución en hombre/mes	Durante la operación en hombre/mes
Calificada		
No calificada		

7. Situación del terreno: Ninguno

8. Diseños (especificaciones):

9. Vida útil del proyecto: 20 años

10. Fecha de inicio de la operación: 01-JAN-25

11. Institución responsable de operación: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

12. Costo anual de operación:

Información General de iniciativa de Inversión

0341742 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL LOTIFICACION LO DE RODAS, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO

SNIP - SEGEPLAN

Solicitud de Financiamiento, ejercicio 2,024

Meta GLOBAL del proyecto :

MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL 31.50 Metro

Meta ANUAL del proyecto :

MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL 31.50 Metro

PROGRAMACION FINANCIERA MULTIANUAL:

Fase: Ejecución

Fecha de inicio de la fase: 08/10/2024

Fecha de finalización: 31/12/2024

Decreto 2022:

Decreto 2023:

Decreto 2024:

Descripción de la fase a financiar:

DESCRIPCION

Situación presupuestaria: Nuevo

Estructura programática:---

Programa - Subprograma - Proyecto - Actividad

Fuente de Financiamiento	Solicitado 2024	Programado 2025	Programado 2026	Progamado 2027	Total
TOTAL :	366,735.00	0.00	0.00	0.00	366,735.00
Recursos internos :	366,735.00	0.00	0.00	0.00	366,735.00
Gobierno central :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comunidad :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aporte municipal :	366,735.00	0.00	0.00	0.00	366,735.00
Otros aportes :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras fuentes :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ROGRAMACION FINANCIERA ANUAL 2024

Fuente de Financiamiento	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
TAL										38,235	231,300	97,200
:ursos internos										38,235	231,300	97,200
Gobierno central :												
Comunidad :												
le municipal :										38,235	231,300	97,200
Otros aportes :												
s fuentes:												

ROGRAMACION FISICA MULTIANUAL

Rubro	Unidad de medida	Programado 2,024	Programado 2025	Programado 2026	Programado 2027
abajos preliminares	m²	31			
lectores / tuberia	Metro	31			
otección tuberia	m³	90			
posición pavimentos	m²	221			

OGRAMACION FISICA ANUAL 2,024

Rubro	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
jos preliminares										31		

olectores / tuberia											31	
rotección tuberia											90	
eposición pavimentos												221
